

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/ق



۱- کاور اسناد مناقصه

کاور اسناد مناقصه

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره مناقصه : ۱۱۵۵/۰۴/ق

تابستان ۱۴۰۴

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴



۲- فهرست عناوین اسناد

فهرست عناوین اسناد

صفحه

عنوان سند

۱	کاور اسناد مناقصه	- فصل ۱
۲	فهرست عناوین اسناد	- فصل ۲
۴	دعوت نامه شرکت در مناقصه	- فصل ۳
۴	موضوع مناقصه	- ۳-۱
۴	تحویل پروژه	- ۳-۲
۴	زمان اجرای پروژه	- ۳-۳
۴	دریافت اسناد مناقصه	- ۳-۴
۴	تضمين شرکت در مناقصه	- ۳-۵
۴	کسورات قانونی و مفاصی حساب تامین اجتماعی	- ۳-۶
۵	نحوه ارایه پیشنهاد	- ۳-۷
۵	اعتبار پیشنهاد	- ۳-۸
۵	مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد	- ۳-۹
۵	پاسخگویی به سوالات	- ۳-۱۰
۶	نکات مهم	- ۳-۱۱
۷	اطلاعات شرکت	- ۳-۱۲
۸	دستورالعمل شرکت در مناقصه	- فصل ۴
۹	مقدمه	- ۴-۱
۹	شرح کار	- ۴-۲
۹	اسناد مناقصه	- ۴-۳
۱۰	نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه‌گران	- ۴-۴
۱۱	نکات مهم در تکمیل پاکات	- ۴-۵
۲۸	ارزیابی پیشنهادها	- ۴-۶
۲۹	سؤالات مناقصه‌گران	- ۴-۷
۲۹	مشخصات فنی	- ۴-۸
۲۹	بازرسی تجهیزات	- ۴-۹
۳۱	پیشنویس قرارداد	- فصل ۵

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۲-فهرست عناوین اسناد

۵۳.....	پیوست یک، دستورالعمل HSE	فصل ۶-
۱۳۹.....	پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی	فصل ۷-
۱۶۲.....	پیوست سه، نقشه ها و مدارک فنی	فصل ۸-
۱۶۳.....	پیوست چهار، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه	فصل ۹-
۱۶۷.....	پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها	فصل ۱۰-
۱۸۰.....	پیوست شش، FINAL BOOK	فصل ۱۱-
۱۸۱.....	پیوست هفت، چک لیست صورت وضعیت قطعی	فصل ۱۲-
۱۸۳.....	پیوست هشت، فرم ضمانت نامه	فصل ۱۳-
۱۸۴.....	پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت	فصل ۱۴-
۱۸۹.....	پیوست ده، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)	فصل ۱۵-
۱۹۵.....	صورت جلسه بازدید از سایت	فصل ۱۶-

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)		 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر			
صفحه ۴ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴	- دعوت نامه ۳

دعوت نامه شرکت در مناقصه

جناب آقای مهندس

مدیر عامل محترم شرکت

با سلام و احترام

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد مجدداً از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واحد شرایط " تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی " در محل کارخانه سیرجان اقدام نماید.

۱-۳ - موضوع مناقصه

" تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) " که شرح فعالیت ها در پیوست آمده است.

۲-۳ - تحويل پروژه

محل تحويل موضوع مناقصه " کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " می باشد.

۳-۳ - زمان اجرای پروژه

مدت زمان مطلوب برای اجرای این قرارداد یک سال از زمان ابلاغ می باشد.

۴-۳ - دریافت اسناد مناقصه

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب سری کامل اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به آدرس www.gisdco.com مراجعه نمایند.

۵-۳ - تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) است که باید به صورت ضمانت نامه بانکی (مطابق با فرمت داده شده) به نام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود. مدت اعتبار ضمانت نامه باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

۶-۳ - کسورات قانونی و مفاصی حساب تامین اجتماعی

پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۵ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱	۳- دعوت نامه

به منظور تضمین اجرای تعهدات طبق مفاد قرارداد، پیمانکار به هنگام امضاء قرارداد، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط، به میزان ۵٪ مبلغ قرارداد، به کارفرما تحويل می‌دهد. تضمین مذکور پس از تحويل قطعی موضوع قرارداد و تسویه حساب مالی و تائید دستگاه نظارت به پیمانکار عودت داده می‌شود.

از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار، معادل ۱۰٪ بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد. نیمی از مبلغ کسور حسن انجام کار پس از صدور گواهینامه تحويل موقع و نیم دیگر آن پس از پایان دوره تضمین و تائید دستگاه نظارت، به پیمانکار مسترد خواهد گردید.

بیمه: پیمانکار موظف است مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عمل نماید. پرداخت صورت وضعیت نهائی و تسویه حساب با پیمانکار منوط به ارائه مفاصیا حساب تأمین اجتماعی برای این قرارداد می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد پیمانکار دارای کارگاه ثابت تولیدی صنعتی با کد کارگاهی تأمین اجتماعی شعبه شهر می‌باشد. کلیه مراحل ساخت در محل کارگاه ثابت پیمانکار انجام می‌گیرد.

۷-۳- نحوه ارایه پیشنهاد

ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت یک مرحله‌ای می‌باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه پاکت (الف) و پیشنهاد فنی پاکت (ب) و پیشنهاد مالی پاکت (ج) توسط مناقصه گر، در سه پاکت جداگانه ممهور و دربسته به آدرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً مهر و امضای مدارک مناقصه الزامی است. همچنین امضاء تمامی صفحات اسناد بایستی بصورت امضاء اصلی (زنده) باشد و اسکن امضاء، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نیست. قیمت های ارسالی در پاکت ج بایستی به صورت ریالی و بر اساس مشخصات فنی ارائه شده در پاکت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ارسال در بخش "دستورالعمل شرکت در مناقصه" ارائه شده و اسناد ارسالی می‌باشد مطابق با فرمت مشخص شده ارسال گردد

۸-۳- اعتبار پیشنهاد

پیشنهاد باید تا ۹۰ روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.

۹-۳- مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد

پیشنهادها باید حداقل تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۲ / ۰۶ / ۱۴۰۴ به نشانی کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات و یا دفتر تهران به آدرس، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک ۲۲، کد پستی ۱۵۱۶۶۴۶۱۱۱ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۷۶۷۰-۴ نمبر: ۰۲۱-۸۸۱۹۹۴۰۳ تحويل گردد. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.

۱۰-۱- پاسخگویی به سوالات

در صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با برگزاری موضوع مناقصه، مناقصه گران می‌توانند از طریق اطلاعات ذیل با نماینده مناقصه گذار تماس حاصل فرمایند:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵

- دعوت نامه ۳

نماینده مناقصه‌گذار: آقای حیدری نسب

تلفن: ۰۳۴۳۱۲۹۴۰۷۶

تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۸۷۰۴۷

ایمیل: a.heidari@gisdco.ir

توجه: بازدید از سایت محل بروزه الزامی بوده و جهت هماهنگی بازدید با آقای حیدری نسب با شماره فوق تماس حاصل فرمایید. همچنین پاسخ سوالات فنی مناقصه گران که از طریق فرم TCL موجود در استناد فنی منضم به ادرس ایمیل a.heidari@gisdco.ir ارسال شده، در سایت بارگذاری خواهد شد.

۱۱-۱- نکات مهم

در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

- ۱- شرکت توسعه آهن و فولاد گهر در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و آن شرکت به این وسیله، حق اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.
- ۲- چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع کل پیشنهادی پیمانکاران مشخص می شود و پیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل می گردد:
 - الف- در صورتیکه پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه ، مشخص شود که جمع کل از عدد پیشنهادی بیشتر است قیمتها واحد به همان نسبت کاهش می یابد.
 - ب- در صورتیکه پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود که جمع از عدد پیشنهادی کمتر است قیمت کمتر ملاک عمل می باشد.
 - پ- در صورتیکه قیمت کل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک محاسبه عدد کمتر می باشد.
- ۳- تمام استناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز تعهد آور مناقصه‌گر برسد و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. همچنین امضاء تمامی صفحات استناد با مستند بصورت امضاء اصلی (زنده) باشد و اسکن امضاء ، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نیست.
- ۴- مواردی که در مدارک و پیوستهای این استناد ارائه شده است با مستند توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات کامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به استناد مناقصه پیش رو می باشد به صورت مکتوب توسط مناقصه‌گر و براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه اعلام گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد که در پیشنهاد فنی و مالی مناقصه‌گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده باشد و در غیر اینصورت استناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.
- ۵- در صورت صلاحیت مناقصه‌گذار ممکن است مهلت اعلام شده برای یک دوره تمدید شود که در این صورت حداقل ۴۸ ساعت قبل از مهلت مقرر به پیمانکار اعلام خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۷ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴۰۴	۳- دعوت نامه

۶- جدول (یا فهرست) مقادیر درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه گران موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن اقدام کرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند.

۷- کلیه اسناد و مدارکی که به تایید مناقصه گر میرسد، تعهد مناقصه گر محسوب می شود.

۱۲-۳ اطلاعات شرکت

امضاء

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر			 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
صفحه ۸ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

دستورالعمل شرکت در مناقصه

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی

(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره مناقصه : ۰۴/۱۱۵۵

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۹ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

۴-۱- مقدمه

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد " تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی " را با شرایطی که در ادامه ذکر شده است مجدداً از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واحد شرایط و اگذار نماید.

۴-۲- شرح کار

هدف از برگزاری این مناقصه "تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی" و کلیه عملیاتی که در شرح خدمات منضم به اسناد به آنها اشاره شده است، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پیوست می باشد.

۴-۳- اسناد مناقصه

أ. اسناد این مناقصه شامل اجزای زیر است

- آگهی منتشر شده، کاور اسناد و دعوتنامه شرکت در مناقصه
- دستورالعمل شرکت در مناقصه (متن حاضر)
- متن پیشنویس قرارداد و پیوست ها (دستورالعمل HSE، شرح خدمات، فاینال بوک (FINAL BOOK)،
- چک لیست صورت وضعیت قطعی، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه، دستورالعمل رسیدگی به تأخیرات قراردادها، فرم ضمانت نامه، فرم پیشنهاد قیمت و پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)
- ب. مناقصه گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.
- ج. مناقصه گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم، قوانین و مقررات نافذ و جاری را به دست آورد. مناقصه گر پس از تسلیم پیشنهاد نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند. اطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه گذار، تعهدی برای مناقصه گذار ایجاد نمی کند، مگر آن که طی الحقیه ای به اسناد مناقصه افزوده شود.
- د. مناقصه گر باستی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد مناقصه مطابقت و کنترل نماید و در صورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه اعلام نماید. در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجام قابل پذیرش نمی باشد.
- ۵. شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر با تجربه می تواند به دست آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.
- و. هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به صورت کتبی (فیزیکی یا الکترونیکی)، مناقصه گذار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۱۰ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

بنماید. نشانی مناقصه‌گذار در استناد مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر مناقصه‌گر قسمتی از مفاد استناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه‌گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه نماید. پاسخ مناقصه‌گذار و شرح پرسش یا اشکالها، برای تمام مناقصه‌گرانی که استناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده‌اند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه‌گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن استناد مناقصه از نظر وی تلقی خواهد شد.

مناقصه‌گذار می‌تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در استناد مناقصه در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه‌گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحیت خود، با صدور الحاقیه‌هایی در استناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشايش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.

هر گاه تجدید نظر در استناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، مراتب طی الحاقیه‌ای به مناقصه‌گران از طریق سایت اعلام می‌گردد. الحاقیه‌ها اجزای جدانشدنی استناد مناقصه محسوب می‌گردند.

۴-۴- نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه‌گران

ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت یک مرحله‌ای می‌باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه (پاکت (الف)) و پیشنهاد فنی (پاکت (ب)) و پیشنهاد مالی (پاکت (ج)) توسط مناقصه گر، در سه پاکت جداگانه ممهور و دربسته به آدرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً مهر و امضای مدارک مناقصه الزامی است. لازم به ذکر است که امضاء تمامی صفحات استناد بایستی بصورت امضاء اصلی (زنده) باشد و اسکن امضاء ، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نیست. قیمت‌های ارسالی در پاکت ج بایستی به صورت ریالی و بر اساس مشخصات فنی ارائه شده در پاکت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد.

توجه گردد که مهر شرکت پیش از چسب زدن به درب پاکات انجام گردد.

محتوی پاکت‌های الف، ب و ج مناقصه می‌باشد به شرح ذیل تنظیم گردد.

۱. مناقصه‌گران باید با توجه به دستورالعملهای مندرج در این سند، نسبت به تهیه ضمانت نامه و پیشنهاد فنی به زبان فارسی اقدام نموده و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ درج شده در دعوت نامه به دبیر خانه کمیسیون معاملات کارفرما به نشانی: کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تحویل داده رسید آن را اخذ نمایند. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد و به پیشنهادهایی که پس از تاریخ مقرر، ارائه گرددند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب. پیشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پیشنهادات فنی باید تا ۹۰ روز بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد.
ج. مدت انجام موضوع قرارداد از زمان ابلاغ قرارداد به میزان اعلام شده در دعوت نامه پیش بینی می‌گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۱۱ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴۰۴	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

۵. پیشنهاد فنی- مالی باید بصورت تایپ شده تهیه و تکمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در ادامه بیان می شود، در پاکتهای جداگانه بسته‌بندی و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در یک پاکت بسته‌بندی و به آدرس تعیین شده، تحويل نماید.

۶. کلیه پاکتهای الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شرکت باشند و در پاکات جداگانه به صورت لام و مهر شده قرار گیرند. همچنین امضاء تمامی صفحات اسناد باقیتی بصورت امضاء اصلی (زنده) باشد و اسکن امضاء، مهر امضاء و سایر حالات پذیرفته نیست. نام و نشانی مناقصه‌گر و موضوع مناقصه باید به شکل زیر بر روی کلیه پاکتها درج گردد:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

مناقصه شماره ۱۱۵۵/۴۰۴

پاکت حاوی -----

نام مناقصه‌گر: -----

نشانی مناقصه‌گر: -----

شماره تماس ثابت، همراه و ایمیل شخص مسئول بر روی تمام پاکات: -----

۷- نکات مهم در تکمیل پاکات

خواهشمند است جهت تکمیل پاکات به نکات زیر توجه گردد.

پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه

۱- ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصه جمعاً به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) میباشد. این ضمانتنامه مطابق با مشخصات اعلام شده در اسناد، توسط بانک ایرانی صادر شده و باید تا ۹۰ روز پس از تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.

۲- ضمانتنامه شرکت های اول تا سوم در مناقصه تا امضا قرارداد و ارائه تضمین قراردادی نزد کارفرما باقی میماند و در صورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید می شود. عدم انجام چنین امری از طرف مناقصه‌گر و یا تأخیر غیر قابل قبول در امضا قرارداد طی ۱۰ روز (ده روز) پس از اعلام برنده مناقصه و عدم تحويل تضمین قراردادی، این حق را برای کارفرما ایجاد می کند که ضمانتنامه شرکت برنده در مناقصه را ضبط نماید.

۳- چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشایی نشده عیناً مسترد خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)			 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر			۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه
صفحه ۱۲ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴	

پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

- کلیه اطلاعات موجود در پاکت "ب" می باشد در **دو نسخه هاردکپی و الکترونیکی (CD)** ارائه گردد.

پاکت مشخص شده با حرف «ب» حاوی مدارک زیر می باشد که جهت تسريع در ارزیابی مدارک، بر اساس فرمت و ترتیب مندرج در این دستورالعمل، بدون هیچ گونه تغییری، در زوئنکنها تقسیم بندی و ارائه میگردد:

بخش اول:

تصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی، گواهی امضا صاحبان امضاء مجاز تعهدآور

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار

گواهی صلاحیت پیمانکاری

ارائه سوابق کاری در کارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام کار و تقدیر نامه‌ها (رضایت کارفرمایان قبلی) ۵ سال منتهی به تاریخ برگزاری مناقصه

تمکیل مدارک طبق آیتم های فرم ارزیابی تأمین و اجرا (پیمانکاران)

اطلاعات کارفرمایان قبلی (حداقل سه عدد از آخرین کارفرمایان قبلی) همراه با موضوع کار و مبلغ قرارداد

بخش دوم:

پیشنهاد فنی پیمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هرگونه نظر و تغییر پیشنهادی برای بهبود (در صورت وجود) به

همراه لیست انحراف پیشنهاد فنی مناقصه گر از مشخصات فنی مندرج در اسناد (در صورت وجود)

برنامه زمانبندی (مطابق با مدت زمان پروژه)

بخش سوم:

هرگونه نظر و تغییر پیشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازرگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه گر در مورد شرایط قراردادی (نحوه پرداخت، ضمانتنامه‌ها، مدت قرارداد، و ...) پیشنهادی دارد باید نظر خود را در این بخش اعلام نماید تا حین ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت برآورده شدن آن شرکت، اسناد قراردادی عیناً بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد.

توجه: کلیه صفحات اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز، بصورت امضاء اصلی (زنده) امضاء شوند و اسکن امضاء، مهر امضاء و سایر حالات مورد پذیرش نیست. امضا اسناد مناقصه به منزله پذیرش کلیه محتویات و مندرجات آن می باشد، حتی اگر بخشی از آن توسط مناقصه گران امضا نشده و یا حذف شده باشد.

- به منظور احراز سمت دارندگان حق امضا تهدید آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی توسط مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

- آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت می پذیرد. لذا با استی مدarak مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در استناد ارسالی پاکت "ب" وجود داشته باشد.
- مناقصه گذار حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده و یا از آن کم نماید.
- تمامی مدارک تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد.

معیار فنی تخصصی
سیستم کنترل پروژه و نظارت فنی
گزارشات و آمارهای تحلیلی
دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام منطبق با آن
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
تجهیزات و امکانات کارگاهی (دفاتر، انبار، ابزارها، ماشین آلات و مکانیزم ها)
رتیبه بندی سازمان مدیریت
معیار عملکردی
اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت و محیط زیست
توانایی سرپرستی و اجرا
نحوه مدیریت فعالیت های برون سپاری
برنامه ریزی فعالیتها و کنترل آن با اجرا
توانایی مدیریت اقتصادی فعالیت ها و کاهش هزینه ها
حسن سابقه
استفاده بهینه از ماشین آلات، ابزارها و مکانیزم ها
معیار مالی
آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
آخرین اظهار نامه عملکرد شرکت
لیست دارایی ها و بدھی ها و حقوق صاحبان سهام و موجودی نقد و درآمد شرکت
معیار نیروی انسانی
ساختار سازمانی
رعایت بکارگیری تخصص های مندرج در قرارداد مطابق چارت سازمانی
مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر اجرایی
میزان شناخت و نحوه تامین نیروی انسانی
رضایت کارکنان
آموزش و ارتقاء کیفی نیروی انسانی

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۷

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خواناً الزامی می باشد.

نکات مهم

اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاکت (ب) مناقصه وجود داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی مشخص و همچنین عدم ارائه اسناد تایید کننده آیتم های جداول زیر منجر به عدم اخذ نمره فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.

ارزیابی فنی تنها بر اساس جداول زیر، اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نیاز و به تشخیص مناقصه گذار استعلامات مورد نیاز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.

در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۷

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

گواهینامه های صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح

ردیف	عنوان گواهی نامه	عنوان رشته	مرجع صدور	پایه	تعداد کار مجاز	تعداد کار جاری	تاریخ اعتبار	شماره صفحه سند پیوست
۱	گواهی صلاحیت ایمنی							
۲	گواهی صلاحیت پیمانکاری							
۳								
۴								
۵								
۶								

- ارائه رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، الزامی می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۷

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

گواهی نامه های سیستم های مدیریتی

ردیف	عنوان گواهی نامه	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار	مرجع صادر کننده	شماره صفحه سند پیوست
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

ارائه رونوشت گواهی نامه های مرتبط مانند گواهی نامه های ایزو، ایمنی، بهداشت و زیست محیطی، استفاده از مدل های مدیریتی مانند EFQM، استقرار سیستم های جامع اینفورماتیک در مورد مدیریت یکپارچه سازمان و ...

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

لیست مشخصات اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته و مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک التحصیلی	سابقه کار (کل)	سابقه کار (در این شرکت)	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۴۰۷

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

لیست مشخصات سهامداران

ردیف	نام سهامدار	سمت در شرکت	حقیقی / حقوقی	درصد سهام	شماره تلفن همراه
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۹ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

لیست مشخصات اعضاي کليدي مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه

ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	رشته و مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک التحصیلی	سابقه کار (کل)	سابقه کار (در این شرکت)	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

تذکر مهم: نمودار سازمانی مناقصه گر و سوابق و تجارب کلیه کارکنان اصلی و ثابت در سازمان مناقصه گر باید ضمیمه گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

صفحه ۲۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/ق

لیست مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه

ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	رشته و مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی	سابقه کار (کل)	سابقه کار (در این شرکت)	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۷

۴- دستور العمل شرکت در مناقصه

پروژه های در دست اجرا توسط شرک (پروژه هایی که تا تاریخ ارسال اسناد پایان نیافته اند)

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام کارفرما	تلفن همراه مدیر پروژه کارفرما	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	درصد پیشرفت	ظرفیت پایه در رشته	ظرفیت باقیمانده (تعداد)	ظرفیت باقیمانده (مبلغ)	شماره صفحه سند پیوست
۱										
۲										
۳										
۴										
۵										
۶										
۷										
	کل باقیمانده									
	مبلغ پروژه									

ارائه صفحه اول برای قرداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

پروژه های (مرتبط و منطبق با موضوع پروژه) خاتمه یافته مناقصه گر

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام کارفرما	تلفن همراه مدیر پروژه کارفرما	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد الحاقیه مالی	تعداد الحاقیه زمانی	ارتباط با موضوع پروژه	انجام کار	گواهی حسن	شماره صفحه سند	پیوست	
۱															
۲															
۳															
۴															
۵															
۶															
۷															

ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام کار، علل درخواست الحاقیه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست
سوابق پروژه های اجرا شده در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و منطقه گل‌گهر دارای اهمیت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصیه می گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

پروژه های غیر مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام کارفرما	تلفن همراه مدیر پروژه کارفرما	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد مالی	تعداد زمانی	تعداد الحاقیه	تعداد سند پیوست	گواهی حسن انجام کار	
												صفحه سند	گواهی حسن انجام کار
												ندارد	دارد
۱													
۲													
۳													
۴													
۵													
۶													
۷													

ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام کار، علل درخواست الحاقیه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵ ق

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

گواهی نامه ها دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه

ردیف	عنوان گواهی نامه	شخص آموزش دیده	جایگاه نفر آموزش دیده در پروژه	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار	مرجع صادر کننده	شماره صفحه سند پیوست
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵/۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

لیست تجهیزات، اقلام و امکانات شرکت مرتبط با موضوع مناقصه

ردیف	عنوان تجهیز	ارزش ریالی روز تجهیز	اهمیت تجهیز در پروژه	مالکیت - (ملکی استیجاری)	عمر تجهیز	توضیحات	شماره صفحه سند پیوست
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)
شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۷

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

ردیف	آیتم ارزیابی	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
۱	درآمد سالانه					
۲	مجموع دارایی ها					
۳	حقوق صحبان سهام					

توجه: آخرین صورتهای مالی و اظهارنامه عملکرد مناقصه گر بایستی در پاکت ب ارائه گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۲۷ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

• **توضیح:** در صورتی که مناقصه‌گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضا باید در زونکن‌های جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعمل و سند "مدارک ارزیابی فنی"، همراه با نسخه‌ای از موافقت نامه مشارکت بین اعضا در پاکت (ب) ارایه نمایند.

- موافقت نامه مشارکت، باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به آنها باشد:
- تعهدنامه با قید این امر که اعضای مشارکت، متعهد به اجرای پیمان بوده و در قبال دستگاه اجرایی، منفردا و مشترکا (متضامنا) مسئول می‌باشند.
 - درصد سهم هر یک از اعضا در مشارکت.
 - حیطه وظایف و مسئولیتهای هر یک از اعضا.

کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قبل از انتخاب مناقصه‌گر و امضای قرارداد صحت و سقم اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید.

پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

- ۱- پاکتی که با حرف «ج» مشخص شده است می‌باشد حاوی قیمت‌های پیشنهادی بر اساس فرم پیشنهاد قیمت و جدول مشخص شده باشد.
- ۲- پیشنهاد قیمت باید واضح، بدون خط خوردگی و با یک خط تکمیل شده باشد.
- ۳- پیشنهاد قیمت بایستی تا زمان انعقاد قرار داد به مدت حداقل ۹۰ روز معتبر باشد.
- ۴- مبلغ مشخص شده در پیشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق استناد مناقصه ارائه شود. در صورت وجود هرگونه تناقض میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادی در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تناقضی میان قیمت واحد و قیمت کل باشد، بند دوم از بخش ۱۱-۳ (مندرج در دعوت نامه) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
- ۵- قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقلام جدول مقادیر و قیمت‌ها، منظور گردیده است.
- ۶- قیمت‌های پیشنهاد، شامل قیمت‌های کامل کارهای مشروطه در استناد، از جمله هزینه‌های اجرایی، سود مناقصه‌گر، هزینه‌های بالاسری، مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تمام خطر و سایر بیمه‌های مورد نیاز، مزایای قانونی کارکنان، هزینه‌های بازرگانی براساس الزامات مناقصه‌گذار که در ضمائم فنی پیش نویس قرارداد آمده است و سایر هزینه‌های مشابه (مریوط به داخل یا خارج کشور) است، مگر این که در استناد

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۲۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

مناقصه، به روشنی مستثنی شده باشند. همچنین، این قیمتها، شامل تمام هزینه‌هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره‌ها، مسؤولیتها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه، به صراحت یا به صورت ضمنی، بیان شده و شرکت در مناقصه، بر مبنای آنها صورت می‌گیرد.

۷- مبلغ پیشنهادی مناقصه گر می‌بایست به صورت ریالی اعلام گردد. مبلغ قرارداد ثابت و تعدیل ناپذیر بوده و مناقصه گر کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های خرید اقلام خارجی (با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه‌های انتقال و) و سایر هزینه‌ها را در آن منظور نموده و هیچ نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایی صورت گیرد. کلیه پرداخت‌های قرارداد به صورت ریالی و در ازای ارائه صورتحساب از سوی مناقصه گر و تایید مناقصه‌گزار می‌باشد.

۸- مبالغ پیشنهادی بایستی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت مجزا و در ازای ارائه فاکتور (طبق نمونه سازمان امور مالیاتی) و گواهی مالیات بر ارزش افزوده معتبر، توسط مناقصه گر به مناقصه‌گزار پرداخت خواهد شد.

۹- جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌های درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه‌گران موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن، اقدام کرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند.

۱۰- در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر قلم با قیمت کل آن قلم، قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود. همچنین در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمت‌های کل اقلام با مبلغ پیشنهاد، بند دوم از بخش ۱۱-۳ (مندرج در دعوت نامه) ملاک عمل خواهد بود.

۱۱- در صورت نیاز و به تشخیص مناقصه‌گزار بخشنامه شماره ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۴ / ۶۵۶۶۳ مورخ ۱۰۰/۶۵۶۶۳ دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در فرایند بررسی پیشنهادات لاحظ می‌گردد.

۴-۶- ارزیابی پیشنهادها

هنگام ارزیابی پیشنهادها، مناقصه‌گزار ممکن است به تشخیص خود، از مناقصه‌گران درخواست ارایه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارایه توضیحات و پاسخ آن، به صورت مکتوب بوده و نباید هیچگونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد، خواسته و یا داده شود. توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب، جزء جدنشدنی پیشنهاد محسوب می‌شود.

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر سیرجان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. چنانچه مناقصه‌گزار به هر علت از اجرای کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسارت خواهد داشت.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی‌کند.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۲۹ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

درصورتی که برنده مناقصه در مدت ۱۰ روز پس از تعیین برنده حاضر به انعقاد پیمان نباشد، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و مناقصه‌گذار در خصوص مناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد نمود.

برنده مناقصه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با موضوع عملیات مورد مناقصه می باشد.

هرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندهاند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و از شرکت در پروژه های بعدی محروم می شوند.

۴-۷- سوالات مناقصه‌گران

۱- در صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه‌گران می‌توانند سوالات خود را طی نامه رسمی و به صورت کتبی به ادرس ایمیل a.heidari@gisdc.co.ir ارسال نمایند.

۲- آدرس: کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات، آقای حیدری نسب : ۰۳۴۳۱۲۹۴۰۷۶ ، تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۸۷۰۴۷

۳- هرگونه تغییر یا اصلاحی که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت کتبی در سایت اینترنتی شرکت به اطلاع مناقصه‌گران دعوت شده خواهد رسید.

۴-۸- مشخصات فنی

۱- مشخصه های فنی منضم به اسناد مناقصه، ملاک و معیار درستی و صحت انجام پروژه است. مناقصه‌گر باید هرگونه مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورده قیمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و کسب تکلیف کند. بدیهی است امضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام کارهای مشخص شده در مشخصات فنی با قیمت‌های پیشنهادی است و هیچ یک از کارهای مندرج در مشخصات فنی، کار جدید تلقی نخواهد شد.

۲- در صورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورد با یکدیگر مناقصه گر می‌بایست سختگیرانه ترین حالت از لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پیشنهاد قیمت خود قرار دهد.

۳- چنین اطلاعاتی به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناقصه‌گر در بررسی صحت و درستی اطلاعات نمی‌شود و مناقصه‌گر باید از تکمیل بودن اسناد برای انجام کار موضوع قرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطلاعات کافی درخصوص انجام پروژه موضوع قرارداد را داشته باشد.

۴-۹- بازرسی تجهیزات

۱- مناقصه گر موظف است پیش از شروع فرآیند تامین نسبت به تهیه مدارک مهندسی و بازرسی و اخذ تاییدیه این مدارک از دستگاه نظارت مناقصه‌گذار اقدام نماید.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۳۰ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶	۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

۲- حداقل الزامات مناقصه‌گذار در بخش بازرگانی تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فنی ضمیمه فرم پیش نویس قرارداد آمده است که می‌بایست مبنای پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. لازم به ذکر است کلیه هماهنگی های مربوط به بازرگانی و هزینه‌های مرتبط به آن به عهده مناقصه گر می‌باشد.

۳- انجام کلیه عملیات مربوط به این مناقصه اعم از بررسی اولیه پروژه، اجرا، بازرگانی و تست نهایی مطابق فایل‌های ضمیمه انجام گردد.

۴- مناقصه گر در صورتی مجاز به تامین تجهیزات از وندورهای خارج از لیست پروژه می‌باشد که پیش از اقدام تاییدیه کارفرما را کتبی اخذ نموده باشد.

بدینوسیله تایید و گواهی می‌شود:

- به کلیه سوالات و مطالبات مورد درخواست پاسخ صحیح داده شده است و کلیه مدارک مورد نیاز ضمیمه آن، مدارک صحیح و واقعی هستند.
- هیچ یک از اشخاصی که به نحوی از انجاء در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی محکومیت یافته‌اند در این شرکت سهامدار نمی‌باشند.

چنانچه خلاف هر یک از بندهای فوق به اثبات بررسد علاوه بر قبول مجازات‌های قانونی ناشی از ارائه مدارک و اطلاعات غیرواقعی، هیچ نوع اعتراضی به تصمیم مناقصه‌گذار مبنی بر ضبط ضمانات‌نامه شرکت در مناقصه یا محرومیت از هرنوع ارجاع کار نخواهم داشت.

تاریخ: / /

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز
و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)			 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر			۵- پیش‌نویس قرارداد
صفحه ۳۱ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴	

بنام خدا

پیش‌نویس قرارداد

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار

مرتبه اول)

فی مابین

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (کارفرما)

و

شرکت(پیمانکار)

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

تاریخ قرارداد: .../.../۱۴۰۴

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۳۲ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴	۵- پیش‌نویس قرارداد

نظر به این که شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عملیات تامین، نصب تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی و تست آن را به شرح این قرارداد از طریق مناقصه به انجام رساند و نظر به این که شرکت با اطلاع کامل از شرایط، محیط، نیازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام کرده است و با رعایت کامل آیین نامه معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از کلمات پر کاربرد این قرارداد که همواره در تفسیر متن و سایر استناد این پیمان به کار رفته و مناطق اعتبار است، طرفین به شرح آتی اقدام به انعقاد قرارداد نمودند:

قرارداد: منظور این قرارداد است که در ۳۶ ماده تنظیم شده و همواره بر سایر استناد پیمان ارجحیت دارد.

پیمان: موضوع این قرارداد مبنی بر عملیات تامین، نصب تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی و تست آن.

استناد پیمان: شامل کلیه استنادی است که در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه جزء استناد توافقی باشد یا جزء استناد قانونی.

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

پیمانکار: شرکت که مطابق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحیه ۱۳۹۷ شناسایی ثانویه گردید.

محل پیمان: استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی گل گهر، سایت شرکت کارفرما.

قانون: کلیه قوانین آمره و تکمیلی جمهوری اسلامی ایران که در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب قوانین آمره در حین اجرای پیمان قانون برای پیمانکار حق مکتسب ایجاد نخواهد کرد و قانون عطف به ماسیق می شود.

پیوست: هر گونه متن مستقلی که در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد منضم شده و اعتبار قرارداد را دارد.

اضافه کار: هر گونه عملیاتی از جنس پیمان که داخل در ۲۵ درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناطق افزایش مبلغ قرارداد است نه حجم کار. اضافه کار به موجب دستور کتبی دستگاه نظارت کارفرما و در طی دوره پیمان تا قبل از تحويل موقت ابلاغ خواهد شد.

کاهش کار: هر گونه عملیاتی از جنس پیمان که داخل در ۲۵ درصد کاهش مبلغ قرارداد باشد. مناطق کاهش مبلغ قرارداد است نه حجم کار. کاهش کار به موجب دستور کتبی دستگاه نظارت کارفرما و در طی دوره پیمان تا قبل از تحويل دائم ابلاغ خواهد شد.

الحاقيه: هر گونه عملیاتی که از جنس پیمان نبوده یا بیشتر یا کمتر از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد و از جنس پیمان باشد. الحاقيه نیازمند متن جداگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء استناد پیمان محسوب می شود.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۳۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

تحویل موقت: صورتجلسه تحویل موضوع پیمان به کارفرما به نحوی که بنا به نظر دستگاه نظارت کارفرما قابلیت بهره برداری را داشته باشد.

تحویل دائم (قطعی): صورتجلسه تحویل موضوع پیمان به کارفرما که حاوی صورتجلسه رفع لیست نواقص و رفع ایرادات دوره تضمین و دفترچه راهنمای نقشه‌های اجرا شده و پایان دوره تضمین است به نحوی که رابطه حقوقی ناشی از پیمان را پایان دهد.

دوره تضمین: دوره ای است که مدت آن به موجب این قرارداد تعیین شده و موضوع پیمان جهت بهره برداری و کشف ایرادات احتمالی و رفع لیست نواقص توسط پیمانکار؛ در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. این دوره از تحویل موقت آغاز می‌شود.

سپرده بیمه: سپرده ای است که نزد کارفرما به عنوان تضمین خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون تأمین اجتماعی و قانون کار از صورت وضعیت‌های پیمانکار مطابق این قرارداد اخذ می‌شود و کارفرما وکیل در استفاده آن است.

سپرده حسن انجام کار: سپرده ای است که نزد کارفرما به عنوان تضمین خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصیر پیمانکار در انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر می‌شود و کارفرما وکیل در استفاده آن است.

لیست نواقص(پانچ): صورت جلسه ای که حین و پس از تحویل موقت توسط دستگاه نظارت کارفرما تهیه می‌شود و شامل لیست کاستی‌ها و ایرادات موضوع پیمان است.

وکالت: وکالت بلاعزال و تام الاختیار و بدون حدود و عام و مطلق کارفرما از پیمانکار در خصوص کلیه موضوعات مربوط به پیمان.

ادعا: هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی پیمانکار که منجر به افزایش حوزه انجام کار یا مبلغ قرارداد به صورت مستقیم گردد.

برچیدن کارگاه: عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می‌باشد.

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فولاد گهر ثبت شده به شماره ۳۱۳۶ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان سیرجان با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵ و شماره اقتصادی ۴۱۱۳۹۵۴۱۵۶۵۵، به نمایندگی آقایان حجت نجمی نیا به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر رفیعیان به عنوان رئیس هیئت مدیره، که از این پس در این قرارداد "کارفرما" نامیده می‌شود از یک طرف، و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی به نمایندگی آقای به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره که در این قرارداد، "پیمانکار" نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد گردید.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از: "عملیات تامین، نصب تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی و تست آن" بر اساس شرح خدمات مندرج در پیوست و سایر شرایط مندرج در قرارداد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر			
صفحه ۳۴ از ۱۹۵	تاپستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/ق	۵- پیش‌نویس قرارداد

ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است. در صورت مغایرت میان اسناد به ترتیب ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱-۳- متن قرارداد حاضر؛

۲-۳- پیوست‌های قرارداد:

پیوست شماره ۱: شرح خدمات و جدول تفکیک مبلغ قرارداد:

پیوست شماره ۲: نقشه‌ها؛

پیوست شماره ۳: پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)؛

پیوست شماره ۴: دستورالعمل HSE؛

۳-۳- صورت جلسه‌ها، الحقیقه‌ها، ابلاغیه‌ها، دستورکارها، گزارش‌ها و مکاتبات؛

۴-۳- صورت جلسه‌ها، الحقیقه‌ها، ابلاغیه‌ها، دستورکارها، گزارش‌ها و مکاتبات؛

۵-۳- کلیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارفرما که جزء لاینفک قرارداد می‌باشند؛

۶-۳- اسناد تکمیلی و اصلاحی که حین انجام قرارداد، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به پیمانکار ابلاغ یا بین دو طرف قرارداد توافق می‌شود؛

۷-۳- مدارک و گزارش‌های مصوب؛

۸-۳- شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه ۱۰۲/۱۱۵۵-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می‌باشند و جزء لاینفک قرارداد می‌باشد.

ماده ۴- مدت قرارداد

۱-۴- مدت انجام تعهدات قرارداد ۱۲ ماه می‌باشد.

۲-۴- شروع قرارداد با ابلاغ کتبی قرارداد توسط مدیریت قراردادهای کارفرما است و برای مدت قبل از آن هیچ گونه حقی برای پیمانکار ایجاد نمی‌کند.

۳-۴- تأخیرات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می‌شود.

ماده ۵ - مبلغ قرارداد و پیش‌پرداخت

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۳۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

۱-۵- مبلغ این قرارداد بليت انجام کامل موضوع قرارداد به ميزان ریال (.....ريال) تعیین و توافق گردیده است.

۲- مبلغ اين قرارداد قطعی است.

۳- کلیه مبالغ به پیمانکار به ریال پرداخت می گردد.

۴- مبلغ به صورت ناخالص می باشد و هرگونه بیمه و مالیات متعلق به موضوع قرارداد (جز مالیات بر ارزش افزوده به شرحی که در بندهای بعدی خواهد آمد) به عهده پیمانکار بوده و مبلغ شامل همه می این عنوانین است.

۵- کارفرما و کالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

۶- در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما حداکثر تا سقف ۴۰ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و عندالمطالبه، قابل تمدید و مورد تأیید واحد مالی کارفرما به ميزان ۱۴ برابر مبلغ پیش پرداخت، در وجه پیمانکار پرداخت و به تناسب از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می گردد و تضمین مزبور پس از مستهلک شدن مبلغ پیش پرداخت و درخواست کتبی پیمانکار، تأیید دستگاه نظارت و واحد مالی کارفرما به پیمانکار مسترد می گردد.

۷- در صورت عدم درخواست و ارائه تضمین پیش پرداخت طرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ قرارداد مراتب به منزله انصراف پیمانکار از دریافت پیش پرداخت تلقی می گردد.

۸- دریافت و یا عدم دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار به هر دلیل، مانع اجرای تعهدات از تاریخ شروع قرارداد (ابلاغ قرارداد) توسط پیمانکار نمی باشد.

ماده ۶- نحوه پرداخت

۱- پرداخت مبلغ قرارداد براساس صورت وضعیت های ماهانه ارسالی از جانب پیمانکار که به دستگاه نظارت کارفرما تحويل و به تأیید ایشان رسیده باشد، پس از کسر کلیه کسور قانونی و قراردادی مربوطه در وجه پیمانکار صورت می گیرد.

۲- مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی و با رعایت ضوابط مربوطه (صدر صورت حساب فروش کالا و خدمات و ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده) در صورت ارائه فاکتور رسمی توسط پیمانکار، بر عهده کارفرما خواهد بود.

ماده ۷- کسور قانونی و قراردادی

پرداخت کلیه کسور قانونی و قراردادی بر عهده پیمانکار می باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۳۶ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۷	۵- پیش‌نویس قرارداد

۷-۱- سپرده بیمه: پیمانکار موظف است مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عمل نماید که پرداخت صورت وضعیت نهائی و تسویه حساب با پیمانکار منوط به ارائه مفاصی حساب تأمین اجتماعی برای این قرارداد می‌باشد و از هر صورت وضعیت به پیمانکار معادل ۵٪ به عنوان سپرده بیمه تأمین اجتماعی کسر می‌گردد که پس از انجام موضوع قرارداد و تایید دستگاه نظارت کارفرما و ارائه مفاصی حساب رسمی توسط پیمانکار به ایشان مسترد خواهد شد. در صورت عدم دریافت مفاصی حساب از سوی پیمانکار، کارفرما می‌تواند از محل سپرده مذکور و در صورت لزوم از محل مطالبات پیمانکار نسبت به پرداخت حق بیمه و دریافت مفاصی حساب اقدام و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

۷-۲- سپرده حسن انجام کار مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قرارداد حاضر.

۷-۳- استهلاک مبلغ پیش پرداخت در صورت دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار.

ماده ۸- افزایش یا کاهش مقادیر کار

کارفرما می‌تواند در طول مدت قرارداد مقادیر و شرح کار قرارداد را با رعایت آیین نامه معاملات خود تا ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) مبلغ اولیه قرارداد مطابق با نرخ‌های واحد مندرج در جدول تفکیک مبلغ منضم به قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۹- تضامین

۹-۱- به منظور تضمین اجرای تعهدات طبق مفاد قرارداد، پیمانکار به هنگام امضاء قرارداد ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تایید واحد مالی کارفرما، به میزان ۵٪ مبلغ قرارداد، به کارفرما تحويل می‌دهد. تضمین مزبور پس از تحويل قطعی موضوع قرارداد و تسویه حساب مالی و تأیید دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار عودت می‌گردد.

۹-۲- تضمین پیش پرداخت در صورت دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار. تضمین مزبور پس از مستهلك شدن مبلغ پیش پرداخت و تایید دستگاه نظارت کارفرما و واحد مالی کارفرما به پیمانکار مسترد می‌گردد.

ماده ۱۰- سپرده‌ها

۱۰-۱- سپرده حسن انجام کار: از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار، معادل ۱۰٪ به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد. نیمی از مبلغ کسور حسن انجام کار در مرحله اول، پس از درخواست کتبی پیمانکار و صدور گواهینامه تحويل وقت و ارسال صورت وضعیت قطعی و نیم دیگر آن در مرحله دوم، پس از درخواست کتبی پیمانکار و پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و تأیید دستگاه نظارت کارفرما و تسويه حساب مالی، به پیمانکار مسترد خواهد گردید.

۱۰-۲- سپرده بیمه مطابق بند ۱ ماده ۷ قرارداد حاضر.

ماده ۱۱- کارکنان پیمانکار

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۳۷ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴	۵- پیش‌نویس قرارداد

۱۱-۱- از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد به صورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفته می‌شوند کارکنان پیمانکار شناخته می‌شوند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.

۱۱-۲- پیمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر ستادی خود به تعداد کافی کارکنان صلاحیت دار و مناسب داشته باشد و این کارکنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما مطرح می‌شود را داشته باشند و در جلسات مربوط شرکت نمایند.

۱۱-۳- پیمانکار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود.

۱۱-۴- هرگاه به تشخیص کارفرما یک یا عده‌ای از کارکنان پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند، کارفرم حق خواهد داشت تعویض آنها را با اعلام کتبی یک ماهه و با ذکر دلایل منطقی از پیمانکار بخواهد و پیمانکار ملزم به اجرای آن خواهد بود.

۱۱-۵- به کار گماردن کارکنان کارفرما توسط پیمانکار ممنوع است.

ماده ۱۲- نظارت بر موضوع قرارداد

۱۲-۱- نظارت بر انجام تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد قبل نموده به عهده معاونت بهره برداری کارفرما و یا نماینده ایشان می‌باشد و پیمانکار موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت انجام نماید. بدیهی است؛ نظارت دستگاه نظارت کارفرما رافع مسئولیت‌های پیمانکار خواهد بود.

۱۲-۲- موضوع قرارداد قبل از تحويل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرگانی لازم جهت مطابقت با مواد مندرج در قرارداد، قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳- شرط انطباق

دستگاه نظارت کارفرما تنها مرجع تشخیص انطباق کار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است. بنابراین مطابقت مفاد و تحويل عملیات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت کارفرما تشخیص و تعیین می‌شود.

ماده ۱۴- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است به:

۱۴-۱- پرداخت مبلغ قرارداد به پیمانکار مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از کسر کسور قانونی و قراردادی و تأیید دستگاه نظارت خود.

۱۴-۲- در صورت اعلام نیاز کتبی به اطلاعات تکمیلی از سوی پیمانکار جهت تحقق مفاد قرارداد، با تشخیص کارفرما اطلاعات به پیمانکار ارائه خواهد گردید. لازم به ذکر است؛ حفظ حق محترمانگی اسناد ارائه شده به عهده پیمانکار می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۳۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

۳- کارفرما متعهد است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار برای طول مدت قرارداد به پیمانکار معرفی نماید. نماینده کارفرما باید دارای اختیار تام در خصوص اجرای تعهدات موضوع این قرارداد باشد.

۴- معرفی به دوائر دولتی و عمومی در صورت نیاز و به تشخیص کارفرما.

ماده ۱۵- تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است به:

۱- کلیه مسئولیت‌های مربوط به بارگیری، حمل، ارسال و تخلیه متریال مورد نیاز موضوع قرارداد، بیمه حمل، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه‌های مورد نیاز و همچنین هزینه‌های مربوطه به عهده پیمانکار می‌باشد.

۲- تمامی متریال مورد نیاز پروژه می‌بایست با نظارت و تأیید دستگاه نظارت کارفرما از متریال درجه یک انتخاب و تأمین شود.

۳- پیمانکار متعهد است هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کالاهای موضوع قرارداد را همزمان با تحويل موضوع قرارداد، به کارفرما تحويل دهد. ضمناً پیمانکار متعهد است.

۴- پیمانکار قبل از تحويل به سایت، می‌بایست تمامی ترتیبات لازم برای انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می‌گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعلام می‌گردد ظرف مدت ۱۰ روز برطرف سازد.

۵- پیمانکار بدینوسیله اعلام و تأیید می‌نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران از قبیل قانون کار، تأمین اجتماعی، مبارزه با پولشویی و ... و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وی در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد از مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده‌اند پیمانکار مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می‌شود جبران نماید.

۶- تأمین غذا، اسکان، ایاب و ذهب و وسائل ایمنی و رفاهی کارکنان پیمانکار بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۷- تأمین کلیه ابزارها و ماشین آلات و مواد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای کامل و صحیح موضوع قرارداد، بعهده پیمانکار می‌باشد.

۸- ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار توسط پیمانکار لازم می‌باشد.

۹- پیمانکار متعهد است حقوق و دستمزد کارکنان خود را مطابق با قوانین جاری کشور به موقع پرداخت نموده و لیست بیمه ارائه شده به اداره تأمین اجتماعی را به صورت ماهانه به دستگاه نظارت کارفرما ارائه نماید. در صورت تأخیر بیش از یک ماه

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۳۹ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

پیمانکار در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود، کارفرما می‌تواند بنا به صلاحیت خود مطالبات کارکنان ایشان را از محل تضامین و سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار نزد کارفرما پرداخت نماید و پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

۱۰- ۱۵- نگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد در دوره تأمین از شروع قرارداد تا تحويل موقعت، بعده‌هه پیمانکار می‌باشد.

۱۱- ۱۵- رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعده‌هه پیمانکار می‌باشد.

۱۲- ۱۵- پیمانکار متعهد است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات اجرایی پروژه، با تجهیزات لازم و شرایط پیش‌بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با کیفیت و کمیت لازم و بکار بردن بهترین روش‌ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه‌ای و با حداکثر مهارت و جدیت خود انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل کار، صرفه و صلاح کارفرما و امانت داری لازم را حفظ نماید. بدیهی است؛ تأیید گزارش‌ها و اقدامات پیمانکار بوسیله کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نبوده و پیمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده می‌گردد.

۱۳- ۱۵- پیمانکار نسبت به امکان تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد اطمینان حاصل نموده و نیز میزان دستمزدها و کلیه هزینه‌های اجرای تأمین تجهیزات، بارگیری، حمل و بیمه را از هرجهت منظور نموده است و از این بابت بعداً حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۴- ۱۵- پیمانکار متعهد به رفع کلیه نواقص، اشکالات و معایب موضوع قرارداد در دوره تضمین می‌باشد.

۱۵- ۱۵- رعایت کلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و سایر موارد بر عده‌هه پیمانکار است.

۱۷- ۱۵- مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عده‌هه پیمانکار می‌باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نخواهد بود.

۱۶- ۱۵- پیمانکار متعهد است کلیه حقوق، مزايا، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نماید. سایر کسور قانونی و موارد مرتبط با قانون کار بر عده‌هه پیمانکار می‌باشد، پرداخت کلیه هزینه‌های پرسنلی و مزايا قانونی حین کار و پایان کار و سایر مزايا قانونی برابر ضوابط قانون کار به عده‌هه پیمانکار بوده و پیمانکار و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.

۱۷- ۱۵- پیمانکار متعهد است گواهی کیفیت و تست تجهیزات موضوع قرارداد را به تائید دستگاه نظارت کارفرما رسانده و همزمان با تحويل کالا، به کارفرما تحويل دهد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۱۴۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

۱۸-۱۵- پیمانکار متعهد است کارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع قرارداد (حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد تعیین نشده باشد)، اعم از ملی و بین‌المللی مصنون نگه دارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع قرارداد بر عهده وی است.

۱۹-۱۵- پیمانکار متعهد است دستورالعمل HSE کارفرما را مطابق با پیوست این قرارداد که در این قرارداد موضوعیت دارد رعایت نماید.

۲۰-۱۵- پیمانکار متعهد است همکاری لازم را با نمایندگان دستگاه نظارت کارفرما به عمل آورده و در صورتی که در موقع بازرسی مشخص گردد هر یک از اجزای موضوع قرارداد از لحاظ اصالت و فنی بودن معیوب باشد و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد، دستگاه نظارت مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننموده و اصلاح و یا تعویض آنها را بخواهد و پیمانکار متعهد به اصلاح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود.

۲۱-۱۵- مسئولیت مدنی کلیه عوامل پیمانکار مانند هرگونه حادثه یا صدمه‌ای که ممکن است قبل یا هنگام اجرای موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وی، کارفرما و کارکنان وی یا اشخاص ثالث گردد یا خسارتی به تأسیسات و اموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزیی و کلی به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما و نمایندگان وی مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربطرخواهد داشت.

۲۲-۱۵- پیمانکار متعهد است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل‌ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت کارفرما در حدود مشخصات و استناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهای حرفه‌ای و تخصصی اعلام می‌نماید انجام دهد.

۲۳-۱۵- پیمانکار ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت بهداشت حرفه‌ای و اجرای ایمن عملیات می‌باشد.

۲۴-۱۵- پیمانکار متعهد است حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی و با تأیید دستگاه نظارت کارفرما فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار برای طول مدت قرارداد به کارفرما معرفی نمایند. نماینده پیمانکار باید دارای اختیار تام در خصوص اجرای این قرارداد و قابل عزل از طرف کارفرما بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد. در صورتی که پیمانکار بخواهد نماینده خود را تغییر دهد موظف است حداقل ۵ روز کاری قبل از تاریخ تغییر، موضوع را به اطلاع و تأیید دستگاه نظارت کارفرما برساند.

۲۵-۱۵- پیمانکار موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل های تحویلی کارفرما را با تنظیم صورت جلسه و اخذ تأیید دستگاه نظارت و واحد حراست کارفرما، از محل های یاد شده خارج نماید و ظرف مهلت مذکور ساختمان ها و تأسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل های تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز نماید. در غیر این

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۴۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

صورت، کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری به حساب بدھکاری پیمانکار منظور و از محل تضمین، سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار کسر نماید. در این صورت پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی‌های خود را ندارد.

۱۵-۲۶- در صورت بروز تأخیر، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعیت قطعی، لایحه تأخیرات را به صورت کتبی به دستگاه ناظارت کارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه تأخیرات ظرف مدت مذکور، کلیه تأخیرات صورت گرفته از نوع غیر مجاز شناخته شده و قابل بررسی توسط کارفرما نبوده و این موضوع نیز از سوی پیمانکار قابل اعتراض نمی‌باشد.

۱۵-۲۷- حسب رعایت مفاد قانون تأمین اجتماعی، پیمانکار متعهد است؛ حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرارداد حاضر، الحاقیه‌های احتمالی و همچنین سایر مکاتباتی که مطابق قانون تأمین اجتماعی، ارائه آن به اداره تأمین اجتماعی ضروری می‌باشد، را به اداره مزبور ارائه نماید. خاطر نشان می‌سازد؛ کلیه مسئویت‌های ناشی از این موضوع به عهده پیمانکار بوده (مسئولیت مطلق) و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۶-۲۷- تجهیز و برچیدن کارگاه.

۱۶-۲۹- با توجه به اینکه بعضی از متریال و دستگاه‌ها مطابق شرح خدمات طی صورت جلسه توسط کارفرما به پیمانکار تحويل می‌گردد، لذا پیمانکار از تاریخ تحويل، در حفظ و نگهداری از متریال مذکور مسئولیت مطلق دارد و مسئولیت جبران هر گونه خسارت واردہ به متریال مزبور به هر دلیل به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد. در صورت عدم جبران خسارات واردہ توسط پیمانکار، جبران خسارات مذکور بدون مراجعه به دادگاه و انجام هر گونه تشریفات توسط کارفرما، از محل تضمین، سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار توسط کارفرما وصول می‌شود و پیمانکار حق هر گونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۶- کتابچه راهنمای دستورالعمل

پیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، مدارک خرید تجهیزات و گواهینامه‌های اصالت تجهیزات و کلیه مدارک منضم به این قرارداد را براساس دستورالعمل تولید فاینال بوک (WI0002) مصوب کارفرما تهیه و به تعداد ۳ نسخه الکترونیکی و پس از تأیید نسخه الکترونیکی، یک نسخه هارڈکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تأیید شده را قبل از تحويل موقت برای کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه‌های چون ساخت (As built) حداکثر تا یک ماه پس از تحويل موقت می‌باشد.

ماده ۱۷- محل اجرای موضوع قرارداد

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۴۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

محل تحويل تجهیزات و اجرای موضوع قرارداد، استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، می باشد؛ خاطرنشان می سازد؛ مسئولیت تحويل سالم کلیه اقلام به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۸- سالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی تحويل

۱۸-۱- کلیه اقلام مورد نیاز پروژه باید نو و سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، برای کارفرما ارسال گردد.

۱۸-۲- اقلامی که آماده بسته بندی می باشند توسط کارفرما مورد بازرگانی کمی و کیفی قرار خواهد گرفت و در صورتیکه اقلام ظاهراً سالم بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فرم لیست بسته بندی مربوطه تنظیم و پس از تحويل به انبار کارفرما به تأیید انبار کارفرما خواهد رسید.

۱۸-۳- در صورتی که تجهیزات موضوع قرارداد ناسالم بوده و یا منطبق با مشخصات فنی مورد درخواست نباشد، پیمانکار معهده است به دستور کارفرما، این نوع اقلام را عوض نموده و در مدت زمانی که کارفرما معین می کند در انبار کارفرما تحويل نماید. کلیه هزینه های ایجاد شده و خسارات ناشی از تأخیر در این رابطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در صورت امتناع پیمانکار از تعویض به تشخیص کارفرما و طی مدت مورد نظر، کارفرما مجاز است به هر طریق که صلاح می داند این اقلام را تعویض نموده و برای جبران هزینه خسارت واردہ بر اساس ماده ۲۰ این قرارداد عمل نماید و یا قرارداد را طبق بند ۱-۲۹ و به دلیل تخلف پیمانکار فسخ نماید.

ماده ۱۹- بازرگانی و آزمایش

۱۹-۱- تحويل تمام یا بخش هایی از اقلام مورد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعلام می نماید و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز است که بازرس گواهی تحويل آن را صادر کرده باشد. بدینه؛ است سایت از ورود اقلام بدون گواهی بازرس جلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار اعلام خواهد نمود.

۱۹-۲- کلیه اقلامی که از طرف پیمانکار ساخته و تهییه می شود در دوره ساخت و یا قبل از تحويل مورد بازرسی دستگاه نظارت کارفرما قرار خواهد گرفت. کنترل و بازرسی دستگاه نظارت کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد خواهد بود و همچنین کلیه هزینه های بازرسی عهده پیمانکار می باشد.

۱۹-۳- پیمانکار موظف است قبل از بازرسی اقلام، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را برای کارفرما ارسال نماید و در صورتیکه برای آزمایش های اقلام پروژه دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای بین‌المللی مورد تأیید کارفرما انجام خواهد شد.

۱۹-۴- پیمانکار حداقل ۳ روز کاری قبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت، تاریخ بازرسی را اعلام داشته و باستی تسهیلات لازم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسی که از طرف کارفرما کتاباً به پیمانکار معرفی می

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۴۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

شوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمک‌های لازم را (به هزینه پیمانکار) برای انجام وظایف محوله در اختیار آنان قرار دهد.
همچنین پیمانکار متعهد است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل‌ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت کارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهای حرفه‌ای و تخصصی اعلام می‌نماید، انجام دهد.

۱۹-۵- در صورتی که در موقع بازرسی، اقلامی که از طرف پیمانکار تهیه شده است طبق مشخصات مشروطه در قرارداد نباشند، بازرس مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید (با ذکر عیب) و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتی که پیمانکار از تعویض یا رفع عیوب اقلامی که کارفرما تقاضای تعویض یا اصلاح آنها را نموده است امتناع نماید کارفرما می‌تواند به هر طریق که صلاح میداند این اقلام را جایگزین نموده و امتناع پیمانکار در مورد تعویض یا اصلاح این نوع اقلام را به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات پیمانکار تلقی نموده و برای جبران این نوع خسارات بر طبق ماده ۲۰ این قرارداد عمل نماید، یا طبق مفاد بند ۱-۲۹، قرارداد را بدلیل تخلف پیمانکار در انجام کارها، فسخ نماید.

۱۹-۶- کدها و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی‌ها و غیره باید مطابق استاندارد مورد تأیید کارفرما باشد.

۱۹-۷- گواهی آزمایش‌ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس کارفرما قرار گیرد.

۱۹-۸- هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن اقلامی که از طرف پیمانکار تحويل شده اند، پیمانکار را از مسئولیت او در مقابل عیوب و یا قصوری که در اجرای مفاد قرارداد نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردند معاف نمی‌نماید.

۱۹-۹- پیمانکار می‌بایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیلات لازم را برای بازرس کارفرما فراهم آورد.

ماده ۲۰- جرائم تأخیر

۲۰-۱- چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد بموقع انجام دهد. کارفرما می‌تواند بازاء هر هفته تأخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل به عنوان جریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا اداری از پرداخت‌های وی کسر نماید و یا از محل تضمین‌ها و یا هر نوع سپرده دیگری که نزد کارفرما می‌باشد برداشت نماید.

۲۰-۲- به ازای هر هفته تأخیر غیر مجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما در اجرای موضوع قرارداد، جریمه ای معادل نیم درصد و حداکثر تا پنج درصد مبلغ کل قرارداد از سوی کارفرما به حساب پیمانکار منظور می‌گردد. در صورت تأخیر بیش از یک ماه در انجام موضوع قرارداد، کارفرما می‌تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأساً و بدون مراجعة به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و کلیه تضمین‌پیمانکار و سایر مطالبات پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۴۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

عدم تکافوی خسارات واردہ از محل ضبط سپرده مذکور کارفرما می‌تواند به منظور جبران خسارات واردہ از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

۲۰-۳- رسیدگی به تاخیرات بر اساس دستور العمل نحوه بررسی تاخیرات قرارداد‌های شرکت توسعه آهن و فولاد گهر صورت پذیرفته و گزارش کمیته بررسی تاخیرات مطابق با دستور العمل مذکور می‌باشد به پیوست صورت جلسه تحويل موقت ارائه گردد.

ماده ۲۱- گواهی تحويل موقت

۲۱-۱- پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید، پیمانکار حداقل ۱۰ روز قبل، کتاب مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را به اطلاع دستگاه نظارت کارفرما خواهد رساند و از دستگاه نظارت تقاضای تحويل موقت می‌کند و نماینده خود را برای عضویت در هیأت تحويل موقت معرفی می‌نماید. دستگاه نظارت، به درخواست پیمانکار رسیدگی می‌کند و در صورت تأیید، تاریخ تشکیل هیأت تحويل موقت را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. اگر به نظر دستگاه نظارت عملیات موضوع قرارداد آماده بهره برداری نباشد، طرف مدت ۷ روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نوافع و کارهایی را که باید پیش از تحويل موقت تکمیل شود به اطلاع پیمانکار می‌رساند.

پیمانکار موظف است تا تشکیل هیأت، برنامه زمان بندی اقداماتی را که برای تحويل کار لازم است تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید و آن قسمت از وسائل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک قرارداد به عهده اوست، در محل کار آماده می‌کند.

۲۱-۲- چک لیست‌ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد باید توسط پیمانکار حداقل یک ماه قبل از تاریخ تحويل موقت ارائه گردد و بین طرفین مورد توافق قرار گیرد.

۲۱-۳- هرگاه هیأت تحويل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکنند، صورت جلسه تحويل موقت را تنظیم می‌کنند و گواهی تحويل موقت را به همراه مستندات مربوطه، برای کارفرما ارسال می‌کنند تا به پیمانکار ابلاغ گردد.

۲۱-۴- هرگاه هیأت تحويل عیب و نقصی در کارها مشاهده نمایند، اقدام به تشکیل صورت جلسه تحويل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می‌کنند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحويل موقت می‌نمایند و نسخه ای از آنها را به پیمانکار ارائه می‌دهند. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، دستگاه نظارت، دوباره عملیات را بازدید می‌کند و اگر بر اساس فهرست نقایص، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد، گواهی تحويل موقت و گواهی رفع نقایص به امضای نماینده دستگاه نظارت و پیمانکار رسیده و مراتب به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

۲۱-۵- تاریخ تحويل موقت و شروع دوره تضمین، تاریخ گواهی تحويل موقت توسط کارفرما می‌باشد و از این تاریخ موضوع قرارداد تحويل داده شده تلقی می‌گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۴۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

۶-۲۱- در صورت وجود نقصی در هر بخش از کار، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نواقص هر بخش از کار است که به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد.

۷-۲۱- در صورتی که تکمیل و تحويل موقت قسمت های مستقلی از کار، در زمان های متفاوتی امکان پذیر باشد، یا به نظر کارفرما، بهره برداری از قسمت های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، کارفرما با رعایت این ماده، قسمت های پیش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام های پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحويل قطعی، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحويل موقت گردیده است، طبق استناد و مدارک قرارداد، به صورت مستقل انجام می دهد.

۸-۲۱- معايب و یا کمبود های جزیی که در بهره برداری تأثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موقت نخواهد شد. در این صورت پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می‌رسد، معايب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که در این صورت پس از بازبینی معايب اصلاح شده و یا کمبودهای تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت ۱۰ روز توسط کارفرما صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحويل موقت خواهد بود.

۹-۲۱- ارائه گزارش کمیته بررسی تاخیرات مطابق با دستور العمل نحوه بررسی تاخیرات قرارداد های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به پیوست صورت جلسه تحويل موقت الزامی می باشد.

ماده ۲۲- دوره تضمین و رفع نواقص

پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را برای مدت ۱۲ ماه شمسی پس از تحويل موقت تضمین می‌نماید (دوره تضمین). اگر در دوره تضمین، معايب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معايب و نواقص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معايب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار حداقل ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معايب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعلام می گردد، رفع مینماید.

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معايب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۲۳- گواهی تحويل قطعی

۱- در پایان دوره ۱۲ ماهه تضمین تعیین شده، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت کارفرما، اعضاء و تاریخ هیأت تحويل قطعی را معین و به پیمانکار معرفی و اعلام می کند. هیأت تحويل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۴۶ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴	۵- پیش‌نویس قرارداد

که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحويل قطعی شده و کارفرما صورت جلسه تحويل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۱: هرگاه هیأت تحويل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند، پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آنها می‌باشد.

تبصره ۲: اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده، تقاضای تحويل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحويل قطعی بروز کرده است می‌باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحويل قطعی است.

تبصره ۳: اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیأت تحويل نکند و این تأخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع قرارداد تحويل قطعی شده تلقی می‌گردد و باید اقدامات پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود.

۲-۲۳- صورت وضعیت قطعی

پیمانکار باید حداقل تا یک ماه از تاریخ تحويل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک قرارداد، تهیه کند و برای رسیدگی و بررسی به دستگاه نظارت تسلیم نماید.

دستگاه نظارت کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول رسیدگی و در صورت تأیید نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود. در صورت عدم تأیید، نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از صورت وضعیت به پیمانکار، اعلام خواهد کرد. چنانچه پیمانکار اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد اعتراض خود را حداقل طی مدت ۱۰ روز، با ارائه دلیل و مدرک، به اطلاع کارفرما می‌رساند.

کارفرما حداقل ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی می‌کند و قبول یا رد آنها را اعلام می‌نماید.

پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی‌شود، موضوع را به حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۲۴- زبان قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد و کلیه مکاتبات فیما بین به زبان فارسی می‌باشد و اسناد و مکاتبات فنی بین طرفین به زبان فارسی یا انگلیسی خواهد بود.

ماده ۲۵- حق واگذاری به ثالث

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۴۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) ندارد. بدیهی است در صورت موافقت کارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غیر، پیمانکار اصلی موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هیچ مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

ماده ۲۶- شرط محترمانگی

شرط محترمانگی مطابق شرط استاندارد محترمانگی (2006) ISO ۱۴۰۰۱ بوده و این شرط به منزله ذکر تمام شرط مورد اشاره در این قرارداد می باشد.

ماده ۲۷- حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

- ۲۷-۱- موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود.
۲۷-۲- تحریم کشورهای ثالث و بیماری های همه گیر و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد.

ماده ۲۸- تعلیق

۲۸-۱- کارفرما می تواند در مدت قرارداد، اجرای کار را برای یک بار و حداقل سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد.

۲۸-۲- در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداقل ۳ ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه، مطابق بند ۲۹-۳-۱ به قرارداد خاتمه داده می شود.

۲۸-۳- هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کار، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.

ماده ۲۹- انحلال قرارداد

قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد:
۲۹-۱- فسخ

در صورت بروز هر یک از موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی و صرفاً با ارسال نامه کتبی از سوی کارفرما، قرارداد فسخ می گردد. در صورت فسخ، کلیه تضامین پیمانکار در حق کارفرما ضبط شده و هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجناس پای کار به کارفرما تعلق خواهد داشت و پیمانکار حق هرگونه اعتراض یا اقدامی اعم از اداری یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است.

- ۲۹-۱-۱- در صورت تخلف پیمانکار از برنامه زمانبندی.
۲۹-۱-۲- در صورت تخلف پیمانکار از مقررات ابلاغی HSE.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۴۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

۲۹-۱-۳- در صورت تخلف پیمانکار از دستورات کتبی ابلاغی دستگاه نظارت.

۲۹-۱-۴- در صورت کشف هرگونه فساد در کسب قرارداد.

۲۹-۱-۵- در صورت کشف هرگونه معاملات یا عملیات مشکوک و احراز بزه مرتبط با قانون مبارزه با پوششی اصلاحی ۱۳۹۷ یا قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.

۲۹-۱-۶- در صورت شمول مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بر این قرارداد و عدم اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط پیمانکار.

۲۹-۱-۷- در صورت شمول ماده ۲۷۰ از لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شرکت پیمانکار.

۲۹-۱-۸- در صورت شمول مواد ۵، ۳۳ یا ۱۴۱ از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به شرکت پیمانکار.

۲۹-۱-۹- در صورت کشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت.

۲۹-۱-۱۰- در صورت شمولیت مقررات توقيف، انحلال (اعم از اداری، قهری و قضایی) و ورشکستگی به پیمانکار.

۲۹-۱-۱۱- در صورت عجز پیمانکار از ارائه اسناد تضمین قرارداد.

۲۹-۱-۱۲- در صورت کشف نداشتن صلاحیت‌های لازم برای کسب قرارداد نسبت به شرکت پیمانکار.

۲۹-۱-۱۳- در صورت کشف شمولیت لیست سیاه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شرکت پیمانکار.

۲۹-۱-۱۴- در صورت عدم پرداخت بیش از ۳ ماه حقوق و دستمزد کارکنان و حق بیمه آنان.

۲۹-۱-۱۵- در صورت عدم وجود زیرساخت‌ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و سایر مقررات مالیاتی در شرکت پیمانکار.

۲۹-۱-۱۶- در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات پیمانکار.

۲۹-۱-۱۷- در صورت انسداد حساب‌های بانکی شرکت پیمانکار به هر علت.

۲۹-۱-۱۸- در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط پیمانکار برای بیش از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۲۹-۱-۱۹- در صورت عدم امکان تأمین ارز از مجاری قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط پیمانکار.

۲۹-۱-۲۰- در صورت کشف عدم توانایی فنی یا مالی پیمانکار به تشخیص کارفرما.

۲۹-۱-۲۱- در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط پیمانکار بدون اخذ مجوز کتبی کارفرما.

۲۹-۲- تفاسخ

در هر مرحله از قرارداد طرفین قرارداد اختیار دارند که قرارداد فی مابین را اقاله نمایند.

آثار تفاسخ نسبت به طرفین به موجب اقاله نامه مورد تراضی طرفین تعیین خواهد شد.

۲۹-۳- خاتمه قرارداد

در صورت بروز هر یک از موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۴۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

در صورت تقاضای خاتمه قرارداد کمیسیونی مرکب از نماینده کارفرما، نماینده پیمانکار و کارشناس رسمی دادگستری رشتہ مربوطه به انتخاب مدیرعامل شرکت کارفرما تشکیل و عملیات انجام شده را محاسبه و خاتمه پیمان را اعلام می‌دارند. در صورت عدم معرفی نماینده از سوی پیمانکار کمیسیون مربوطه با دو عضو رسمیت داشته و در صورت اختلاف نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر کمیسیون تلقی می‌شود. پس از اعلام کمیسیون اقدامات مربوط به مفاصاحساب پیمانکار انجام و در صورت وجود طلب، کلیه طلب تشخیص شده پیمانکار پرداخت و استناد مالی و سپرده‌ها آزاد خواهد شد و در صورت بدھکاری پیمانکار به ترتیب از محل سپرده‌ها و سپس استناد تعهد آور تودیع شده، طلب کارفرما وصول خواهد شد.

۱-۲۹-۳-۱- در صورت تعلیق برای بیش از ۳ ماه.

۱-۲۹-۳-۲- در صورت پیش‌بینی نقض قراردادی توسط پیمانکار به تشخیص کارفرما.

۱-۲۹-۳-۳- در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد.

۱-۲۹-۳-۴- در صورت تقاضای کارفرما.

۱-۲۹-۳-۵- در صورت عدم امکان تحصیل مجوزهای دولتی و اداری که در اختیار کارفرما نمی‌باشد و منجر به تأخیر در اجرای قرارداد برای بیش از ۶ ماه شده است.

۱-۲۹-۳-۶- در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی که کارفرما بیش از ۳ ماه از تاریخ بروز معارضه نتواند آن را رفع نماید. مبدأ احتساب بر مبنای گزارش تأیید شده روزانه است.

۱-۲۹-۳-۷- در صورت غبن حادث (ضررو زیان) برای کارفرما.

۱-۲۹-۳-۸- در صورت کاهش یا افزایش کار بیش از ۲۵ درصد برآورد اولیه قرارداد.

۱-۲۹-۳-۹- در صورت تغییر اساسی در احجام برآورده اولیه قرارداد که منجر به زیان خارج از عرف پیمانکار گردد.

ماده ۳۰- آگاهی‌ها و اعلان‌ها

۱-۳۰-۱- پیمانکار اعلام می‌نماید که قرارداد و استناد و مدارک مربوطه را کاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف شده در آن را کاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوا را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۱-۳۰-۲- پیمانکار اعلام می‌نماید تمام خطرات و ریسک‌های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی کرده و به آن واقف است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوا را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۱-۳۰-۳- پیمانکار اعلام می‌نماید که دانش فنی، صلاحیت لازم و سایر نیازمندی‌های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار دارد و یا می‌تواند آنها را تامین نماید.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۵۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

۴-۳۰- پیمانکار اعلام می‌نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه وی خواهد بود.

۵-۳۰- پیمانکار اعلام می‌نماید وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و اشتغال وی در سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه‌ای به وظایف پیمانکار در چهارچوب این قرارداد وارد نمی‌سازد.

۶-۳۰- پیمانکار از میزان هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه‌های مربوط به مالیات‌ها و عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای کامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش قیمت نمی‌باشد.

۷-۳۰- پیمانکار بدینوسیله تأیید می‌نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت می‌کند. مسئولیت کلیه خسارات واردہ به کارفرما یا اشخاص ثالث که ناشی از عملکرد پیمانکار یا کارکنان او باشد به عهده و هزینه پیمانکار است و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.

۸-۳۰- پیمانکار به درستی قیمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه ایفا کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می‌دهد (اصل تقویم درست مبلغ).

۹-۳۰- پیمانکار به کفایت مبلغ قرارداد واقف است و هزینه‌ی ایفا کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می‌دهد (اصل کفایت مبلغ).

۱۰-۳۰- پیمانکار تأیید نمود که در خصوص اسناد قراردادی مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهومی باقی نمانده است و این مبلغ، جهت انجام کامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه‌ای در اجرای کارها ایجاد نمی‌کند و تأیید می‌نماید در صورتی که مقادیری را کم لحاظ نموده باشد، با هزینه‌خود آن را جبران نماید (اصل عدم قابلیت استناد به جهل).

۱۱-۳۰- پیمانکار تأیید نمود که هیچ گونه اشتباہی در خصوص ماهیت کار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی اسناد، محل پیمان و هر موضوع دیگری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ پیمان مؤثر است، نداشته است (اصل عدم قابلیت استناد به اشتباہ).

ماده ۳۱- منع قانونی

پیمانکار اعلام می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد. پیمانکار تعهد می‌نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش‌بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا آنان را بشرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار خواهد نمود.

ماده ۳۲- قانون حاکم بر قرارداد

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۵۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

قانون حاکم بر قرارداد منحصرأ قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و هر نوع تفسیر و تعبیری از مواد قرارداد طبق قوانین مذکور بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۳- حل اختلاف

۱- حل هر گونه اختلاف نظر در تفسیر مواد این قرارداد به عهده مدیریت حقوقی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می‌باشد.

۲- در صورت بروز هر گونه ادعا، دعوای قضایی و اختلاف در مفاد تعهدات و یا اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، طرفین ضمن اسقاط حق رجوع به مراجع قضایی و اداری، توافق بر ارجاع موضوع به داوری نمودند. داور توسط مدیر عامل محترم کارفرما انتخاب خواهد شد. مقر داوری در شهرستان سیرجان و مدت داوری ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ رسماً اختلاف خواهد بود که مدت داوری برای یک دوره بنا به تشخیص داور قبل تمدید می‌باشد. داوری بر اساس اصول (نه تشریفات) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد. شروع داوری با درخواست داوری به موجب اظهار نامه رسمي جهت تعیین داور به مدیرعامل کارفرما می‌باشد که مدیرعامل کارفرما می‌بایست ظرف مدت ۷ روز از تاریخ دریافت اظهارنامه داور را تعیین نماید و به داور و طرفین اختلاف ابلاغ نماید. سایر موضوعات تابع مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد. این شرط در هر حال مستقل از این قرارداد می‌باشد.

۳- پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت کارفرما، طبق قرارداد، به تشخیص خود از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

ماده ۳۴- نشانی طرفین

۱- نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است :

دفتر تهران کارفرما: تهران، میدان آزادی، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک ۲۲، کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۶۱۱۱، تلفن:

۰۲۱-۸۸۱۹۹۴۰۲

دفتر سیرجان و سایت کارخانه کارفرما: استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر. (اقامتگاه قراردادی)
پیمانکار:

۲- هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتاباً ظرف مدت ده روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی مشروح در بالا با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)			 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر			۵- پیش‌نویس قرارداد
صفحه ۵۲ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶	

۳۴-۳- پیمانکار اعلام و اقرار می نماید آدرس الکترونیکی فوق در ید و اختیار ایشان می باشد. ارسال مکاتبات از طریق ایمیل توسط کارفرما به پیمانکار به آدرس ایمیل مندرج در فوق، به منزله ای ابلاغ می باشد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی پیمانکار مسموع نخواهد بود.

ماده ۳۵- شرط استقلال

موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غیر قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای هر ماده منوط به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد.

ماده ۳۶- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۳۶ ماده و ۲ نسخه تنظیم گردیده است که یک نسخه آن پس از امضاء تحویل پیمانکار می گردد. کلیه نسخ قرارداد از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

پیمانکار

کارفرما

.....
شرکت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

.....
(.....)

حجت نجمی نیا (مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره)

جعفر رفیعیان (رئیس هیات مدیره)

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر			 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
صفحه ۵۳ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/ق	۶- پیوست یک دستور العمل HSE

HSE، دستورالعمل پیوست یک

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار
مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره قرارداد : ۱۱۵۵/۰۴/ق

تاریخ قرارداد : .../.../۱۴۰۴

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۵۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

دستورالعمل توسعه آهن و فولاد گل گهر
G.I.S.D.Co.

عنوان مستند: روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران
سطح محترمانگی (عادی)

تاریخ بازنگری	تاریخ تنظیم اولیه	کد مستند
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	PR۱۹۶۱

امضا	تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی
		رئیس ایمنی فنی و فرایند	محمدحسین لهراسب

امضا

		کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها	محمود کورکی
		مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست	بهرام کلانتری
		مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی	مصطفی رosta
		معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	احمد علی عتیقی

تائید کنندگان

		مدیر عامل	حجت نجمی نیا
--	--	-----------	--------------

تصویب کننده

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۵۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

عنوان مستند: روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تغییر در بند شماره ۷-۲-۱ در زیربندهای ۱-۱ و ۷-۲-۱-۲ و ۷-۲-۱-۸ و ۷-۲-۱-۱۲ و ۷-۲-۱-۱۲ / تغییر در بند ۱۰ پیوست ها

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	رئیس سیستم ها و فرآیندها مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیر سیستم ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۵۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترم‌انگی؛ عادی)	
۱	شماره ویرایش		

فهرست مطالب

۱	هدف
۲	دامنه کاربرد
۳	تعاریف:
۴	مراجع و مأخذ
۵	مسئولیت و اختیار
۶	منابع موردنیاز:
۷	نحوه اجرا
۷-۱	وظایف و مسئولیت ها
۷-۲	الزامات HSE پیمانکاران
۷-۲-۱	بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی
۷-۲-۲	بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت
۷-۲-۳	بخش چهارم: الزامات محیط زیستی
۷-۲-۴	بخش پنجم: الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
۷-۳	قطع همکاری و پایان پیمان
۷-۴	جرائم و تخلفات پیمانکاران
۸	تغییرات
۹	مستندات مربوطه
۱۰	پیوست ها

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۵۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:

- ۱-۱- تعریف حداقل الزامات HSE که باید توسط پیمانکار برای کار در محیط های قراردادی رعایت گردد.
- ۱-۲- تعیین و توسعه یک استراتژی برای مدیریت HSE پیمانکاران
- ۱-۳- توجه هم زمان به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیت های پیمانکاری
- ۱-۴- تشریح مدیریت HSE در فعالیت های پیمانکاری، پروژه های اجرایی به منظور بهبود مستمر عملکرد HSE در تمام فعالیت های محلول.
- ۱-۵- برقراری نظم و صیانت از نیروی انسانی

۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروژه های در دست اجرا می باشد.

تذکر ۱: این دستورالعمل مکمل آینین نامه های حفاظت و بهداشت کار، دستورالعمل ها و مستنداتی است که در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط زیست توسط مراجع ذی صلاح در کشور تدوین گردیده و پیمانکار موظف است، علاوه بر این دستورالعمل، تمامی آنها را به مورد اجرا بگذارد.

۳- تعاریف:

- ۳-۱- کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه زیر مجموعه های شرکت که تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را جهت انجام به غیر واگذار نماید.
- ۳-۲- پیمانکار: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف شرکت و یا هریک از زیر مجموعه ها به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند. در این دستورالعمل منظور از پیمانکار، پیمانکار مادر است مگر آن که به پیمانکار فرعی اشاره شده باشد.
- ۳-۳- پیمانکار فرعی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف پیمانکار اصلی به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند.
- ۳-۴- نماینده کارفرما/مشاور: شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن اجرای عملیات/خدمات موضوع پیمان از طرف کارفرما تعیین و معرفی می گردد و مسئولیت نظارت مسایل مربوط به HSE پیمانکار را بر عهده دارد.

۴- مراجع و مأخذ

آینین نامه های ایمنی، سلامت و زیست محیطی وزارت کار الزامات، آینین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی الزامات، آینین نامه ها و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست کشور

۵- مسئولیت و اختیار

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده امور حقوقی قراردادها و کلیه شرکت های پیمانکاری می باشد.
مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۵۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۱- منابع مورد نیاز:

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

۲- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

۳- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

۴- سنجش ها

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

۵- نحوه اجرا

۵-۱- وظایف و مسئولیت ها

❖ مدیران ارشد

مدیران ارشد مسئولیت های ذیل را بر عهده دارند:

- حصول اطمینان از تدوین و حسن اجرای دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران مطابق الزامات تعریف شده
- حمایت و پشتیبانی در راستای پیاده سازی الزامات HSE پیمانکاران.

❖ مسئولیت های پیمانکار

- پیمانکار موظف است متناسب با حجم فعالیت ها / عملیات موضوع قرارداد نسبت به انجام مسئولیت های ذیل اقدام نماید (شایان ذکر است در ذیل اهم موارد آورده شده لیکن محدود به آن نمی شود)
 - تأمین تجهیزات مانشین آلات، وسائل مکانیکی، ابزارهای سالم و ایمن برای انجام فعالیت ها / اجرای عملیات
 - تأمین کلیه الزامات و نیازهای HSE متناسب با محدوده قرارداد.
 - تأمین نیروی انسانی و اجد صلاحیت
 - گزارش دهی، ثبت و تحقیق و بررسی کلیه حوادث و اطلاع رسانی به مراجع ذیربیط طبق راهنمای ثبت اطلاع تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث
 - تهیه شناسنامه ایمنی مواد شیمیائی مصرفی
 - تأمین تجهیزات ایمن سازی محدوده قرارداد و محیط های مرتبط بافعالیت / عملیات
 - اخذ گواهینامه های لازم
 - اخذ مجوز برای انجام کار
 - فراهم نمودن شرایط لازم برای انجام بازدیدها ، بررسی ها و بازرسی های کارفرما
 - تأمین تغذیه مناسب برای کارکنان (اعم از کارگران، کارمندان و مدیران)

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

۶- پیوست یک دستور العمل HSE شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴/۰۷ ق تابستان ۱۴۰۴ صفحه ۱۹۵ از ۱۵۹

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آن و نوآوری‌گران کشور
۰۱	شماره ویرایش		

- تامین محل اسکان (بر اساس دامنه کار قرارداد) مناسب و حفظ کرامت انسانی کارکنان (اعم از: کارگران ، کارمندان و مدیران)
 - مسئولیت هر گونه تحلف از قوانین زیست محیطی کشور و پرداخت جرائم قانونی احتمالی در این خصوص، بر عهده پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی کارفرما مسئولیتی در این خصوص تعویض نداشت.
 - سایر مواردی که مطابق با محدوده قرارداد توسط مدیریت HSE کارفرما در قرارداد وی لاحظ شده است.

۷-۲- الزامات HSE پیمانکاران

٧-٢-١-١ الزامات عمومي:

تذکر: تمامی پیمانکاران ملزم به رعایت قوانین و مقررات ملی و سازمانی از مراجع بالادستی شامل: اداره کار، رفاه و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان محظوظ زیست... و می باشند، همچنین تمامی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، مکاتبات ابلاغیات و صور تجلیسات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر لازم الاجرا می باشد.

- ۱- گواهینامه تایید صلاحیت اینمی پیمانکاران را به مدیریت HSE کارفرما رانه نماید.
 - ۲- آشنایی و شناخت لازم نسبت به محل اجرای پروژه و فعالیت های مرتبط با تعهدات خود را داشته باشد.
 - ۳- از عملیات مربوط به خود، کارفرما و سایر پیمانکارانی که در محدوده عملیاتی مجاور و همچنین خطراتی که ممکن است در حین انجام کار یا خدمتی که با آنها روبرو می شود آگاه گردید.
 - ۴- پیمانکار می باشد در خصوص رفع نواقص حوزه HSE تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاری کامل چنانچه در محل خطراتی مشاهده گردد پاید مناسبآسیا شیوه عملیات خود را تغییر دهد.
 - ۵- اطلاعات لازم در مورد دستگاه ها و مواد مورد نیاز و خطوات مربوط به عملیات موضوع قرارداد را از قبل کسب نماید.
 - ۶- نقطه نظرات پیشنهادات و دستورات بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارفرما را در طول اجرای پیمان مدنظر قرار داده و رعایت کامل آنها را عیناً به پیمانکاران فرعی خود (در صورت وجود) منتقل نموده و بر رعایت کامل آنها توسط این پیمانکاران نظارت نمایند.
 - ۷- بازرسی ها و میزی های انجام شده در مورد عملکرد HSE پیمانکاران (توسط نماینده کارفرما) و مطابق بیوست شماره (دو)۳(چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران) مورد ارزیابی قرار گرفته تا در همکاریهای بعدی مورد توجه گیرد.
 - ۸- پیمانکاران علاوه بر رعایت الزامات کارفرما گرفته تا در همکاریهای بعدی دستورالعمل ها، رویه ها، اینین نامه ها و مقررات HSE ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح ملی این از وزارت کار، مرکز بهداشت و محیط زیست نیز می باشد.
 - ۹- در صورت تخطی پیمانکار از موازین HSE مشروحة، پیمانکار بر اساس دستورالعمل جرائم جرمیه می گردد.
 - ۱۰- پیمانکار موظف است در صورتیکه دستورالعمل یا رونوشت اجرایی خاص در حوزه HSE علاوه بر دستورالعمل های ابلاغی از سوی

نحوه این است: «الله ربنا، رب العالمين، ربنا رب العالمين، ربنا رب العالمين»، و مذکون به بیان HSE برقراری پرسند.

نتیجه: استسلام پس از میان و میان سفر روز داشت.

۱۱- پیمانکار باید در طول اجرای پروژه و در صورت لزوم قبل از شروع به کار موارد ذیل را پیش بینی، تهیه و رعایت نموده و نسبت به آموزش آن ها به پرسنل خود و پیمانکاران فرعی و ارتقاء آگاهی آنان اقدام نماید:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- تدارک تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، وسایل حفاظت فردی و سایر ملزمومات HSE مطابق فهرست منظم به قرارداد و مورد تایید نماینده کارفرما
 - شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 - شناسایی و فراهم سازی مقدمات لازم برای مشارکت همه جانبیه نیروی کار در فعالیت های HSE
 - تامین سیستم های ایمن کار و تدارکات سیستم مجوز های کاری
 - گزارش حوادث و شبه حوادث
 - دستورالعمل های HSE
 - اجرای طرح های مدیریت بهداشتی
 - اجرای طرح های مدیریت ایمنی
 - اجرای طرح های مدیریت زیست محیطی
 - همکاری کامل با بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
 - همکاری کامل با بازرسین دولتی مرتبط با HSE منجمله بازرسین وزارت کار و وزارت بهداشت
 - رعایت کامل مقادیر گزارش ارزیابی زیست محیطی و گزارشات بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه گزارشات عملکرد HSE مستمر دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و....) و یا سایر تواتر هایی که نماینده کارفرما اعلام نماید.
 - سایر مواردی که در این دستورالعمل ذکر شده است.
- ۱۲- محدودیت های زمینی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE و نتیجتاً موجب اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد.
- ۱۳- با تغییر شرایط پیمان که شرایط HSE تحت تأثیر قرار می گیرد می بایست تدبیر جدید HSE متناسب با تغییرات و پس از تایید نماینده کارفرما توسط پیمانکار اعمال شود.
- ۱۴- هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار (منجمله نیروی انسان، تجهیزات، فرایندها و رویه ها) باید به اطلاع و تایید نماینده کارفرما برسد.
- ۱۵- مدیریت پیمانکار باید منابع لازم را در چارچوب پیمان برای مواجهه با هر نوع تغییر به موقع فراهم نماید.
- ۱۶- پیمانکار باید برای شناسایی خطرات ارزیابی ریسک ها و پیش بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه روش های شناخته شده و استاندارد داشته باشد.
- ۱۷- پیمانکار باید برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و آموزش های مرتبط را برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی نماید.
- ۱۸- پیمانکار باید برنامه های مدیریت ریسک خود را بصورت دوره ای (حسب نوع کار، محدوده کار، تغییرات و همچنین حسب درخواست نماینده کارفرما) مورد بازنگری قرار دهد و آخرین ویرایش آن را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد.
- ۱۹- پیمانکار باید با انجام برنامه های مختلف برای ارتقاء فرهنگ HSE در محیط کار تلاش کند. این برنامه می تواند تاکید بر انجام کار بدون خادنه، توسعه شعارهای HSE، حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و جلوگیری از آسودگی و تخریب محیط زیست، شناسایی مخاطرات، برنامه های انگیزشی و برخورد های انضباطی باشد.
- ۲۰- پیمانکار باید به صورت مستمر عملکرد HSE خود را مورد بازبینی و ممیزی قرار دهد. این بازنگری باید به صورت دوره ای (در فواصل زمانی معین) و هم به صورت غیر دوره ای (در مواردی نظیر وقوع حوادث و ایجاد تغییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده کارفرما) انجام شود.
- ۲۱- پیمانکار باید نتایج بازنگری های دوره ای خود را به کارفرما گزارش دهد.
- ۲۲- کارفرما حق دارد به صورت دوره ای و یا اتفاقی، عملکرد پیمانکار را مورد بازرسی و ممیزی قرار دهد. البته بدون اینکه به تعهد پیمانکار در این زمینه خلی وارد شود. انجام یا عدم انجام به موقع بازرسی و ممیزی های مذکور توسط کارفرما رافع تعهدات پیمانکار در این خصوص نمی باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

-۲۳- کارفرما می تواند در هر زمان بر عملکرد پیمانکار که شامل موارد ذیل می باشد نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول، طبق مفاد پیمان منعقده اقدام لازم را به عمل آورد:

- نتایج ممیزی های HSE
- بازخورد های دریافتی از کارفرما
- عملکرد HSE
- وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
- پیگیری اقدامات مربوط به بازنگری های قبلی
- تغییرات موثر بر عملکرد
- پیشنهادات بهبود عملکرد
- خروجی های بازنگری
- خروجی بازنگری مدیریت باید شامل کلیه تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد ذیل باشد:
- بهبود عملکرد HSE پیمانکار در ارتباط با الزامات کارفرما و پیمانکار
- شناسایی منابع، امکانات، تسهیلات و برنامه های مورد نیاز برای بهبود.

-۲۴- چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE، ایجاد شرایط نا ایمن، نقص در دستگاه های مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالث، تاسیسات و یا محیط زیست گردد، پیمانکار مستولی پرداخت جرائم و جبران خسارت وارد می باشد. ضمناً صرف رعایت مقررات HSE کارفرما کافی نبوده و پیمانکار باستی از صدمات احتمالی به کارکنان خود، کارفرما مشخص ثالث و مخاطرات زیست محیطی جلوگیری نماید.

-۲۵- پیمانکار باید در زمان شرکت در مناقصه و نیز قبل از امضاء قرارداد این دستورالعمل را به دقت مطالعه نماید. بدینهی است در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در زمان اجرای پروژه، کارفرما می تواند تا پنج درصد صورت وضعیت را از مبلغ صورت وضعیت همان دوره کسر کند.

-۲۶- پیمانکار و کارکنان ایشان (اصلی و فرعی) در حیطه فعالیت خود لازم است علاوه بر آشنایی و رعایت کلیه مقررات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، به دیگر مقررات ملی و همچنین استاندارد های ملی و بین المللی (...، NIOSH ، OSHA ، EPA ، NFPA ، آشنایی داشته و نسبت به رعایت آنها اقدام نماید.

-۲۷- رعایت مقررات و مستنداتی (دستورالعمل ها، روش های اجرایی، راهنمایها و فرم ها و...) که پس از عنقد قرارداد تهیه شده و از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد توسط پیمانکار الزامي می باشد.

تذکر ۱: هزینه های احتمالی اقدامات HSE که پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تذکر ۲: مقررات و مستندات مصوب HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر حسب موضوع پیمان باید بعنوان حداقل الزامات مورد استفاده قرار گیرد.

تذکر ۳: کلیه فعالیت های در حال انجام در سایت به منظور اطمینان از تطابق با الزامات سیستم مدیریت HSE به صورت منظم ممیزی و بازرسی می شود.

-۲۸- پیمانکار موظف به ارائه روش های انجام کار (با لحاظ کردن الزامات HSE) به نحوی که خطoi، افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نکند، به کارفرما می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۱-۲ نیروی انسانی:

- پیمانکار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و شنان دهد که چگونه با برنامه کلی که به منظور تضمین بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی کارکنان در نظر گرفته شده است متناسب می‌باشد.

- پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت اجرایی پروژه حسب موضوع پیمان، تعداد نمایندگان HSE خود را (با توجه به پیوست جدول تعداد نفرات HSE و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر) تعیین و کتابه کار فرما معرفی نماید. نیروهای HSE پیمانکاران بایستی دارای تحصیلات تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و یا رشته های مرتبط و دارای تجربه کافی باشند و با تایید کننده کارفرما، شروع به کار نمایند.

شرط احراز پرسنل HSE پیمانکاران برای اخذ تاییدیه از کارفرما:

➢ سرپرست HSE پیمانکار: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی

➢ کارشناسان HSE: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۳ سال سابقه بیمه تلفیقی

➢ سوپرولایزر های تخصصی حوزه داربست، برق، پاربرداری و ...: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۳ سال سابقه بیمه تلفیقی

/ مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه تخصصی فعالیت و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی در حوزه مربوطه

تذکر: پیمانکار بایستی به وسیله مستندات و مدارک کافی (مورد تایید کارفرما) ثابت کند که افراد مستول و ناظر بر امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست کاملاً وارد شرایط هستند. بدینهی است تایید کارفرما ناقص انجام تعهدات پیمانکار در این زمینه نبوده و در صورت عدم احراز صلاحیت در مر زمان و با اعلام نماینده کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد وارد صلاحیت می‌باشد.

- تغییر در تعداد نیروهای HSE ذکر شده در پیوست یک با توجه به موضوع پیمان و رسیک پذیری پروژه ها به تشخیص رئیس کارفرما و تایید مدیریت HSE و بالا ترین مقام خواهد بود.

- مسئول بازرسی HSE بایستی صرفا در امور HSE موضوع پیمان به کار گرفته شود. پیمانکار نمی‌تواند از این افراد در سایر فعالیت های موضوع پیمان استفاده نماید.

الزامات HSE در جذب و به کار گیری افراد

- پیمانکار باید در بدو به کار گیری کارکنان و قبل از اجرای فعالیت های جدید، اطمینان حاصل کند که کارکنان جذب شده بر اساس موارد ذیل وارد صلاحیت بوده و به کار گرفته شوند:

۱- سلامت جسمی و روانی

۲- مهارت های تجربی

۳- دانش انجام کار

- پیمانکار موظف است قبل از به کار گیری نیرو های خود، با انجام معاینات پزشکی و مصاحبه های اختصاصی از تناسب آن ها با وظایف محله در برآوردن الزامات سیستم مدیریت HSE اطمینان حاصل کند.

- پیمانکار موظف است صلاحیت کارکنان خود را برای انجام وظایفشان به طور مرتبت مورد بازیگری و ارزیابی قرار دهد، این بررسی ها شامل شناسایی و بهینه نمودن عوامل و تجهیزات برای ارتقاء کیفی فعالیت های کارکنان و آموزش های مورد نیاز آنها (توسط مراجع ذی صلاح) جهت دستیابی به این منظور باشد.

- اقدامات لازم برای اطمینان از صلاحیت افراد، می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

۱- تجزیه و تحلیل نظام مند الزامات مرتبط با وظایف

۲- معاینات بدو استخدام و دوره ای و آموزش های HSE

۳- ارزیابی عملکرد افراد

۴- شواهد مستند شده از صلاحیت فردی

۵- برنامه هایی برای ارزیابی دوره ای

تجدید مناصله تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- نفرات معرفی شده برای مستولیت های HSE پیمانکاران می باشد دوره های آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE و یا در صورت درخواست کارفرما دوره HSE پیمانکاران را گذرانده و مدارک آن را برای شروع به کار ارائه نمایند.
- کارکنان پیمانکاربه ویژه مستولین HSE در صورت ضرورت، از طرف کارفرما مورد ممیزی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود افراد برای انجام این کار به اندازه کافی واجد شرایط، با تجربه و تحت کنترل می باشند.

۷-۲-۱-۳ گزارش های آماری:

- لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد و به صورت ماهیانه به واحد HSE کارفرما ارائه گردد.
- پیمانکار موظف است گزارش های آماری بخش های مختلف واحد HSE طرح شامل بهداشت صنعتی، ایمنی، محیط زیست و آموزش HSE را برابر با فرآهای اجرایی مصوب کارفرما به نحو صحیح تدوین و تنظیم و بررسی نموده و در مقاطع زمانی تعیین شده به واحد HSE کارفرما ارسال کند.
- گزارش های تدوین شده در زمینه های مختلف HSE می باید شامل تحلیل های فنی و کارشناسی و رسم نمودارهای مختلف آماری باشد.
- پیمانکار موظف است گزارش فوری و گزارش های تکمیلی حوادث رخ داده در کارگاه های زیرمجموعه را به مشاور و واحد HSE کارفرما مطابق با دستورالعمل های ابلاغی ارسال نماید.
- پیمانکار موظف است گزارش ماهیانه مربوط به بخش اینمی را از پیمانکاران زیرمجموعه دریافت و پس از تکمیل به واحد HSE ارسال نماید.
- لازم به ذکر است فایل گزارش ماهیانه ابلاغی از کارفرما که شامل تمامی شاخص های عملکردی فرآیندهای حوزه HSE می باشد می باشد به صورت دقیق و مورد تایید کارفرما تا روز پنجم ماه بعد ارسال گردد. همچنین پس از بررسی گزارشات می باشد جلسات آنالیز عملکرد پیمانکار به منظور بررسی علت عدم تحقق برخی شاخص ها برگزار و پیمانکار برنامه جبرانی را تحويل نماید.
- اهم گزارش های بخش بهداشت واحد HSE عبارتند از:
 - گزارش های فصلی (سه ماهه)
 - فرم مواجهات شغلی پرسنل با عوامل زیان آور محیط کار (سالیانه)
 - گزارش شاخص های بهداشت و سلامت کارکنان (سالیانه)

۷-۲-۱-۴ جلسات:

- پیمانکار موظف است قبل از شروع بکار و تجهیز کارگاه در جلسه "شروع به کار پیمانکار (Kick Of Meeting)" شرکت کرده و تمامی الزامات و قوانین ابلاغی کارفرما را رعایت نماید.
- پیمانکار موظف است به صورت منظم نسبت به تشکیل جلسات HSE و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های تحت پوشش اقدام نماید.

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

«دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهاشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر»

- موضوعات طرح شده در جلسات می باشد در قالب صورجلسات مصوب، ثبت و پیگیری گردند.

* جلسات دوره ای مستول / بازرگانی HSE پیمانکار و نماینده کارفرما (روزانه / هفتگی / ماهیانه) لازم است جلسات بازرگانی به طور دوره ای برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود. بدینهی است بازرگانی HSE پیمانکار بر اساس چک لیست های مدون که قبل از سوی HSE پیمانکار تهیه و به تایید نماینده کارفرما رسیده، انجام می شود. موارد حائز اهمیت که به صورت معمول در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

۱- گزارش حوادث

۲- فعالیت های در دست انجام در سایت

۳- آموزش های HSE انجام شده قبلی و برنامه ریزی شده جاری

۴- ممیزی های HSE و نتایج حاصله

۵- مباحث عمومی

۶- گزارش پیشرفت عملکرد

« جلسات گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث

- برای مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است بنا به تشخیص و صلاحیت نماینده کارفرما / HSE کارفرما، توسط پیمانکار جلسات مربوطه تشکیل می گردد.

حضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست HSE پیمانکار در کلیه جلسات و بازرگانی های اینمنی الزامی است.

۷-۲-۱-۵ آموزش های HSE

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد):

* آیین نامه آموزش اینمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار

* دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش اینمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار

* دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)

➤ آموزش های عمومی

• پیمانکاران موظفند، کلیه پرسنل تحت امر خود را در خصوص موضوعات HSE و همچنین مقررات و دستورالعمل های مربوطه آموزش دهند.

• پیمانکاران موظفند آموزش های بدو استخدام HSE را جهت کلیه کارکنان خود قبل از صدور کارت تردد برگزار نمایند.

• کارکنان پیمانکار باید در زمینه وظایف شغلی خود آموزش های لازم از (عمومی و تخصصی HSE) را فرا گرفته و داش و اطلاعات لازم را در این زمینه دارا باشند. اطلاعات مذکور شامل کلیه الزامات بهداشتی، اینمنی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل و مدیریت بحران می باشد که در حین کار ممکن است ایجاد شود.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرای الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار موظف به اجرای آموزش‌های کوتاه‌ایمنی قبل از شروع کار (Tool Box Meeting) مرتبط با وظایف محوله به نیروهای خود و ثبت سوابق می‌باشد.
- پیمانکاران موظفند، یک فضای مناسب آموزشی متناسب با تعداد افراد شاغل در کارگاه جهت اجرای برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی ایجاد نموده و همچنین، امکانات سمعی و بصری داخل فضای آموزشی را جهت کمک به فرایند برگزاری دوره‌های آموزشی تعیینه نماید.
- پیمانکاران موظف به انجام دوره‌های آموزشی اثر بخش برای پرسنل شاغل در طرح با توجه به نوع شغل و مخاطرات مربوطه و ارسال مستندات به واحد HSE کارفرما می‌باشند.
- پیمانکاران موظفند، به منظور آگاهی و اطلاع رسانی کارکنان در زمینه HSE اقدام به تشکیل کمیته‌های آموزشی، فرهنگی جهت تهییه برشور، پمقلت آموزشی و نصب تابلوها با شعارهای HSE نماید.
- پیمانکاران موظفند، قبل از برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره‌ها به نیاز سنجی آموزشی بر حسب مشاغل پیروزد و دانش و مهارت‌های ضروری جهت انجام وظایف محوله را ارزیابی و بر اساس آن دوره تعریف نمایند و پس از برنامه ریزی دوره‌ها را اجرا نمایند و بعد از اتمام دوره‌های ارزیابی اثر بخشی دوره‌ها صورت پذیرد.

➤ آموزش‌های تخصصی

- پیمانکار باید ترتیبی اتخاذ کند تا کارکنان تحت آموزش‌های بهداشت مشخص شده از طرف واحد HSE پیمانکار قرار گیرند. این آموزشها باید حداقل حاوی اطلاعات ارزیابی خطرات بهداشتی، عوامل زیان آور محیط کار، تغذیه، بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، مقررات و آیین نامه‌های بهداشتی و کمک‌های اولیه باشد.
- کارکنان پیمانکار باید آموزش‌های ایمنی تعیین شده از طرف HSE کارفرما و واحد HSE پیمانکار را بصورت کامل بگذرانند. این آموزش‌ها حداقل باید حاوی اطلاعات ارزیابی مخاطرات محیط کار، مقررات و آیین نامه‌های ایمنی و نحوه‌ی آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری و دوره‌های تخصصی ایمنی کار در ارتفاع، ایمنی داریست بندی، صدور مجوز کار، استفاده از لوازم حفاظت فردی، ایمنی جرثقیل ها و بالبرها ایمنی کار در فضای بسته، ایمنی برق، نظام و ترتیب کارگاهی، ایمنی عملیات های جوشکاری/برشکاری/حفاری و گود برداری، سند پلاست، رانندگی تندافعی، ایمنی رادیو گرافی و اطفاء حریق باشد.
- لازم است کارکنان پیمانکار آموزش‌های زیست محیطی تعیین شده از طرف HSE کارفرما را به صورت کامل بگذرانند. این آموزشها باید شامل تعهدات، قوانین و الزامات زیست محیطی مربوط به فعالیت‌ها، اثرات نامطلوب زیست محیطی پژوهه و اطلاعاتی در مورد مدیریت پسماندها و پساب و شناسایی الاینده‌های آب، خاک و هوا باشد.
- برگزاری دوره‌های عمومی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
- برگزاری دوره واکنش در شرایط اضطراری
- اثر بخشی دوره‌ها

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۱- بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی

۷-۲-۱-۱- تجهیزات حفاظت فردی

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه وسائل حفاظت فردی - وزارت کار.

* دستورالعمل وسائل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

* پیمانکار موظف است، تجهیزات حفاظت فردی مناسب و دستگاههای ایمنی مورد نیاز افراد را مطابق با قوانین و وندور لیست ابلاغی کارفرما

به شماره FO1221 با هزینه خود فراهم و طبق ماتریس تجهیزات حفاظت فردی تایید شده توزیع نماید.

- کلاه ایمنی با رنگ خاص مربوطه و دارای استحکام مناسب (تحویل قبل از شروع به کار)

- لباس متناسب با نام و آرم شرکت مربوطه (دو دست لباس کار در هنگام شروع به کار و در مراحل بعدی هر شش ماه یکبار یک دست

)

- کفشهای مناسب با نوع کار

* تجهیزات حفاظت فردی زیر برای کلیه نفرات پیمانکار بر حسب مورد الزامی است:

- عینک ایمنی.

- گوشی.

- ماسک و فیلتر ضد گاز.

- ماسک بارچه ای و یا ماسک جوشکاری بر حسب نوع کار.

- دستکش مناسب با نوع کار.

- کمربند ایمنی (Full Body Harness) دولنیارد برای کار در ارتفاع.

- بارای برای کار در محیط بارانی.

- چکمه مناسب با نوع کار.

- لباسکار مناسب با نوع کار (لباس زیر گرم و کاپشن برای فصل سرما).

* واکذاری وسائل فوق در هر زمان بر حسب نیاز و به تشخیص مدیریت HSE کارفرما مشاور، از سوی پیمانکار ضروری است.

* کلیه اقلام و تجهیزات مرتبط با HSE از جمله تجهیزات حفاظت فردی، وسائل برقی، وسائل و تجهیزات باربرداری، متریال داریست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد HSE کارفرما رسانیده در این خصوص فایل اقلام موثر تایید شده واحد HSE کارفرما به پیوست می باشد.

* کلیه پرستل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به تجهیزات حفاظت فردی گردند و استفاده از این وسائل در طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کلاه برای کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرهای ورق کاران نارنجی می باشد که باید الزاماً طبق لیست تایید شده واحد HSE کارفرما تهیه گردد. در صورت عدم تهیه تجهیزات حفاظت فردی استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما می تواند در صورت صلاح دید راساً اقسام و هزینه های آن با اختصار "با لاستر" در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ نماید.

رنگ بندی کلاه ایمنی:

کارفرما: طوسی / سفید

گروه مهندسی اجرایی: سفید

HSE: زرد

آتش نشان: قرمز

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

ریگر و برقرار: نارنجی

مهماز: سبز

گروه کارگری و اپراتوری: آبی

۷-۲-۱-۲- ایمنی ماشین الات، بالابرها، وسائل نقلیه، ابزار و تجهیزات

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

* دستورالعمل ایمنی ماشین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

- جهت ورود کلیه خودروها و ادوات سنگین به داخل کارگاه می بایست هماهنگی های لازم با واحدهای حراست و HSE کارفرما بعمل آمد و طبق مدل تولید خودروها می بایست سواری کمتر از ۵ سال، وانت بار، مینی بوس یا ون کمتر از ۱۰ سال و اتوبوس کمتر از ۱۵ سال اجازه ورود داده شود. (لازم به ذکر است در صورت صلاحیت واحد HSE کارفرما پس از بازرسی و تایید می توان مجوز خودروهای سواری به مدت یک سال و سایر خودروها به مدت ۲ سال دیگر مجوز را تمدید نمود)

- کلیه ماشین آلات پیمانکار باید دارای بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط (پایه ۱، پایه ۲، ویژه) مطابق با نظر واحد HSE کارفرما باشد.

- خودروها و ادوات سنگین باید دارای جعبه کمک های اولیه و کپسول اطفاء حریق باشند.

- کلیه ماشین آلات مورد استفاده پیمانکار (از قبیل: جرثقیل، بالابرها و ...) می بایست دارای شناسنامه فنی سلامت توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید واحد HSE کارفرما را دارا باشند. و قبل از ورود به سایت از سلامت و ایمنی آنها اطمینان حاصل گردد.

- کلیه وسائل نقلیه ورودی، بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده و از نظر ظاهری نیز دارای شرایط مناسب باشند.

- به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب ماشین آلات، پیمانکار موظف است یک برنامه مدون برای تعمیر و نگهداری تدوین و اجرا نماید.

- کلیه تجهیزات می بایست مطابق با وندور لیست ابلاغی کارفرما به شماره FO2150 تهیه گردد.

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسایل نقلیه - وزارت کار)

- تمامی تجهیزاتی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلامت از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند می بایست در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترم‌تری؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- اجرای مقررات ترد وسائل نقلیه مورد استفاده خود را به صورت منظم بازرسی نمایند و در صورت وجود نقص فنی نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.

استفاده از خودروها، وسایل و تجهیزاتی که آلودگی بهداشتی و زیست محیطی بالا دارند، مجاز نیست.

- ابزار مورد استفاده باید معیوب، شکسته، ترک خورده یا خمیده باشد. استفاده از این ابزار ممنوع است و پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر یا از رده خارج کردن آنها اقدام کند.

پیمانکاران باید ابزار مناسب به منظور انجام فعالیتهای کاری فراهم کنند.

- کلیه تجهیزات مورد استفاده باید از نظر ایمنی مورد تایید بوده و در صورت نیاز به کالیبراسیون در دوره های تعیین شده، کالیبره گردد.

- کلیه پیمانکاران موظفند "دستورالعمل ایمنی ابزار" را برای ابزار خاص مورد استفاده خود (شامل ابزار دستی، برقی، مکانیکی و پنوماتیک و ...) تهیه و اجرا نمایند.

- پیمانکار موظف است خودروها و تجهیزانی که فعالیت آنها در کارگاه از نظر HSE خطربناک تشخیص داده شده، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت کند.

- پیمانکار می بایست جهت اخذ مجوز ورود کلیه ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب مطابق با دستورالعمل مدون HSE کارفرما اقدام نماید:

- » ماشین آلات عمرانی و جرثقیل ها الاما باید دارای بیمه مستویت مدنی باشند
- » استعلام گواهی نامه برای تمامی رانندگان سایت الزامی می باشد.
- » خودرو های ایاب و ذهاب می بایست دارای بیمه بیابانی باشند
- » انجام و ارائه مستندات تست هیدرواستانیک و چشمی از مراکز صدور معاینه فنی کلیه خودروهای گاز سوز (CNG) الزامیست.
- » ورود خودرو های دوگانه سوز دستی و نیز LPG به سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

۷-۲-۱-۴- ایمنی عملیات باربرداری و نصب تجهیزات

- رعایت مقاد دستورالعمل ایمنی در عملیات باربرداری و کار با دستگاه های بالابر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیش از انجام کار بایستی رفع نواقص ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با آن و اخذ گواهینامه بازرسی فنی آنها اقدام گردد.

- هر دستگاه جرثقیل بایستی دارای ریگر بالیاس مشخص شده در کارگاه باشد.

- پیمانکار موظف است در حین کار با دستگاهها و ماشین آلات نسبت به رعایت اصول ایمنی اقدام نماید

- رعایت حداقل ظرفیت دستگاه، سرعت وزش باد، ایمن سازی محوطه انجام کار لازم و ضروری است.

- پس از پایان روز و ترک کارگاه، اپراتور بایستی اطمینان حاصل نماید که اقدامات لازم را ایمن سازی دستگاه به انجام رسانیده است.

- تمامی تجهیزانی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلامت از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند می بایست در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۹ از ۱۶۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۴-۱-۲-۲-۱-۴- رعایت اصول ایمنی خاکبرداری و گودبرد اری

- هرگونه حفاری و خاکبرداری داخل کارگاه می بایست مطابق با دستورالعمل های "ایمنی خاکبرداری و گودبرداری" و "صدر مجوزهای کار" و روش اجرایی مدون HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر صورت پذیرد.

- قبل از انجام عملیات های خاکبرداری و حفاری، بررسی محل به لحاظ عبور کابل برق و تلفن، خطوط انتقال نفت و فرآورده های آن، لوله های انتقال گاز و آب و سیستم فاضلاب به منظور پیشگیری از بروز رخداد و حادثه ضروری بوده و پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت اینگونه فعالیت ها تدوین نماید.

- کنترل مخاطرات (شیب دار کردن دیواره ها، پل بندی، حفاظ گذاری، شمع زنی، در نظر گرفتن مسیر ورود و خروج ایمن، نصب گذرگاه Gany Way بر روی کانال ها و ...) و رعایت اختیارات ویژه (رعایت فاصله ایمن ماشین الات و ادوات سنگین و نخله ها از محل گودبرداری، توجه به تجمع گازها در گودال ها و کانال ها، تامین روشنایی کافی و ...) ضروری است

علائم هشدار دهنده، چراغ های احتیاط، تابلوهای شبرنگ، نوار خطر و Hardbarrier در اطراف محل حفاری باید نصب گردد.

۴-۱-۲-۲-۱-۵- رعایت اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری

(رعایت تمامی مقاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار

* دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- رعایت اصول ایمنی در نگهداری، انبارش و حمل سیلندرهای گاز فشرده (محل مناسب جهت نگهداری، تفکیک سیلندرها، مهار مناسب سیلندرها ، نصب Cap، استفاده از گازی نصب سیلندرها و ...) ضروری است.

- رعایت اصول ایمنی در حین انجام کار (استقرار سیلندرها در محل مناسب، تهویه مناسب جهت کار در فضای بسته، استفاده از پوشش های نسوز در عملیات جوشکاری جهت جلوگیری از اتش سوزی ناشی از پرتاب گذازه ها، عدم وجود مواد قابل اشتعال در محل جوشکاری، اتصال به زمین دستگاه های جوش و ...) ضروری است.

- تجهیزات و وسایل کار (گیره الکترود، عایق بودن کابل های برق، دستگاه جوش و ترانسفورماتورها، سالم بودن گیج سیلندرهای گاز، سالم بودن شلنگها، پستهای برقی و ...) باید سالم و بدون عیب و نقص باشند.

- ورود و استفاده از کیسول ها و مخازن تحت فشار فاقد گواهی تست هیدرواستاتیک(سال ساخت بالای پنج سال) ممنوع می باشد.

در حین انجام کار باید اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری رعایت گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۷۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۱-۷- رعایت اصول ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار

* دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داربست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)

* رعایت اصول ایمنی در محل استقرار داربست (وضعیت مقاومت زمین محل استقرار، شبی محل، فاصله ایمن از خطوط برق و موانع، عدم قرارگیری در محل عبور و مرور، وضعیت شرایط آب و هوایی و ...لازم و ضروری است.

* رعایت اصول ایمنی در نصب داربست (base plate، sole board ، coupler,toe board ،planks,bracing ،ladder ،full bode harness ،life line ،shock absorber) لوله ها و ...لازم و ضروری است.

* وجود سیستم بازرسی و نظارت و علامت هشدار و مسیر های دسترسی (scaff tag ،ladder) تردد های محافظه و ...)

* نصب داربست در اطراف دیواره مخازن باید دارای حفاظ از جنس صلب full board، مجهز به نردبان مناسب بوده و به تاییدیه واحد HSE کارگاه برسد.

کلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید HSE کارفرما رسیده باشد. پیمانکار برای برپایی داربست، مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست را اخذ نماید. داربستهای دارای تگ سبز مجاز، تگ زرد برای داربست های در حال ساخت و داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمی باشند و مطابق با مفad دستورالعمل مربوطه باید اصلاح گردد. در صورت عدم اصلاح از فعالیت مربوطه جلوگیری گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود.

۷-۲-۱-۷- مجوزهای کار (PTW)

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)

* انجام هر نوع کاری اعم از کار گرم، سرد، حفاری و ... باستی پس از دریافت اجازه کار و هماهنگی با واحدهای مربوطه و واحد HSE دستگاه نظارت صورت پذیرد.

* پیمانکار باید جهت انجام این فعالیتهای اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوی مراجع ذیریط نموده و جهت حصول اطمینان از این بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات لازم را مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم نماید. همچنین تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند می باشند بصورت رسمی به واحد HSE معرفی گردد.

* نحوه اخذ پرمتیت در داخل مناطق عملیانی و در حال بهره برداری می باشد مطابق رویه صدور پرمتیت این مناطق صورت پذیرد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۷۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه تجهیزات حفاظت فردی مناسب با نوع کار استفاده نمایند.

- کلیه نفرات امضاء کننده پرمتیت می باشد دوره آموزشی صدور پرمتیت را گذرانده و دارای مجوز لازم جهت امضاء پرمتیت باشند.

- رعایت کلیه موارد اینمی مطرح شده در دستورالعمل "سیستم های مجوز کار واحد HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر" جهت صدور مجوزهای کاری ضروری می باشد.

- پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید.

۷-۲-۱-۸- تجهیزات اینمی و آتشنشانی

- پیمانکار موظف است در زمینه طراحی، تامین، نصب و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با آتش نشانی و مهندسی حریق شامل سیستم های اعلان و اطفاء حریق، رینگ های آبی ... ملاک عمل خود را وندورلیست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO2149 قرارداده و در تمامی مراحل تاییدیه های لازم را از مدیریت HSE کارفرما اخذ نماید.

- پیمانکار موظف است نسبت به نیاز سنگی و تهیه تجهیزات اینمی و آتش نشانی از قبیل کپسول های اطفاء حریق و ... به تعداد کافی و با تایید HSE دستگاه نظارت، جهت مقابله با شرایط اضطراری اقدام نمایند.

- پیمانکار موظف است نسبت به انجام تست هیدرولاستیک کپسول ها در زمان های مقرر اقدام نماید.

- تجهیزات آتش نشانی بایستی در کلیه کارگاهها بطور مناسب جانمایی و به تعداد کافی تهیه گردد.

- کلیه تجهیزات و کپسولهای اطفاء حریق بایستی بطور منظم بازدید گردد و نسبت به شارژ مجدد و آماده بکار بودن آنها اطمینان لازم حاصل گردد.

- پیمانکاران موظفند، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از این تجهیزات و کاربرد آنها را به کلیه پرسنل تحت پوشش ارائه دهد.

- استفاده از نفرات با تجربه و آموزش دیده جهت کنترل و بازدید دوره ای تجهیزات و همچنین جهت اطفاء حریق و امداد نجات ضروری بوده و همچنین پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری و تهیه سناریو داشته باشد.

۷-۲-۱-۹- رعایت اصول اینمی برق

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

*آیین نامه اینمی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین - وزارت کار

*آیین نامه اینمی تاسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاه - وزارت کار

*آیین نامه و مقررات اینمی کار بر روی خطوط و تجهیزات برق دار - وزارت کار

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۷۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

* دستورالعمل اینمی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

- رعایت موارد اینمی تابلو برق و انجام تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری از برق گرفتگی (نصب سیستم ارتینگ، نصب کلید محافظ جان و ...).

• سیستم ارتینگ می باشد دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح باشد.

- رعایت موارد اینمی در توزیع، هدایت و انتقال نیروی الکتریکی توسط خطوط و کابل‌های هدایت برق

• رعایت موارد اینمی در کار با تجهیزات و وسایل برقی.

• بازرسی، نگهداری و تعمیر به موقع خطوط، تجهیزات الکتریکی و تابلو برق.

پیمانکار موظف به رعایت کلیه الزامات اینمی برق و در نظر گیری کلیه تمهیدات روشنایی لازم جهت فعالیت در شیفت شب می باشد.

۱۰-۱-۷-۷- نظم و ترتیب کارگاهی

* رعایت مفاد دستورالعمل اینمی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیمانکار باید مناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط محیط کار (HOUSE KEEPING) ملیس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد HSE استفاده نماید

• نگهداری، چیدمان، مرتب کردن و نظافت کلیه تجهیزات و وسایل کار

• وجود انبار salvage و برنامه مناسب جهت جمع آوری، نگهداری، امحاء و بازیافت

۱۱-۱-۷- سیستمهای ارزیابی و مدیریت ریسک

* رعایت مفاد روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

• شناسایی، ارزیابی خطرات موجود و ارائه راهکارهای کنترلی و اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه

• انجام مطالعات PSSR قبل از راه اندازی واحدها

• ارزیابی مدیریت ریسکهای Construction بر مبنای روش FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) انجام شود.

• ارزیابی مدیریت ریسک های Commissioning-pre commissioning بر مبنای روش HAZID انجام شود.

• انجام اقدامات لازم جهت اجرای recommendations منتج از مطالعات ارزیابی ریسک و اطمینان از وجود safeguards مناسب

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۹۵ از ۷۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرومگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- ایجاد و استقرار سیستمهای مدیریت ریسک و IMS

Safety integrity level(SIL)study,hazardous area classification review

۱-۱-۷-۲-۷-۲- الزامات عمومی ایمنی

جهت اخذ تابیدیه و ورود کلیه اقلام و پرسنل به سایت مطابق با دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE به شماره ۲۱۴۸WI گردید.

نصب علائم، تابلوهای ترافیکی، تابلوهای هشدار دهنده و HSE در سطح کارگاه ها و در طول مسیر مناسب با شرایط محیط و به تعداد کافی

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه - وزارت کار

* دستورالعمل ایمنی علائم هشدار دهنده و تابلوهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)

* برگزاری جلسات Tool box meeting به صورت روزانه و Safety tour بصورت هفتگی

* وجود امکانات ارتباطی (تلفن، بیسیم...) و تسهیلات اداری واحد HSE پیمانکار

* رعایت اصول ایمنی انبارداری و ایمنی انبارهای رنگ

۷-۲-۲- بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت

۷-۲-۲-۱- الزامات عمومی بخش بهداشت

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار

* آیین نامه بهداشت محیط - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)

* شناسنامه کارگاهی از دیدگاه بهداشت صنعتی می باشد مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل های ابلاغی توسط واحد HSE پیمانکار تهیه گردیده و در مقطع زمانی ۶ ماهه به روز اوری گردد. همچنین نسخه ای از آنها می باید به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۷۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار باید در طرح مدیریت بهداشت خود دستورالعمل های جاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشگی و آبین نامه های حفاظت و بهداشت کار را ملاک عمل قرار دهد.
- ضروری است تعامل لازم با واحد HSE نظارت و مدیریت بهداشت صنعتی واحدهای HSE شرکتهای مجاور طرح جهت اطلاع از مخاطرات بهداشت کار و اندازه گیری ها، ارزیابی ها، و کنترل عوامل زیان آور محیط کار در محدوده اجرای پروژه بعمل آید.
- ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشت کار می باید بر مبنای روش تحلیل مخاطرات شغلی یا Job safety analysis (JSA) و ارزیابی ریسک به روش FMEA توسط پیمانکار انجام شود.
- ارزیابی فوق الذکر می بایست توسط تمامی پیمانکاران شاغل در طرح انجام شود.
- پیمانکار موظف است با بکارگیری روشهای پیشگیرانه و کنترلی از بروز بیماری های ناشی از کار در پرسنل شاغل در کارگاه ها جلوگیری نماید.
- پیمانکار موظف است گزارش اقدامات و فعالیت های بهداشتی طرح را بر مبنای فرم های مصوب کارفرما در مقاطع زمانی معین شده، تهیه نموده و پس از تایید دستگاه نظارت به واحد HSE کارفرما ارسال نماید.

۷-۲-۲-۲- الزامات بخش بهداشت صنعتی

- مطالعات شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می باید از طریق شرکت های صاحب صلاحیت و دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفة ای از وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی انجام شود.
- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل شاغل در طرح اعم از روزمزد، پاره وقت، بلند مدت و ... را مورد معاینه شغلی بدوساختدام و پس از یکسال استخدام مورد معاینه دوره ای قرارداده و جهت انجام این معاینات از مراکز و شرکت های مجاز به ارائه خدمات طب کار استفاده نماید نتایج حاصل از معاینات می بایست در پرونده های پزشکی کارکنان نگهداری گردد.
- خلاصه اطلاعات پرونده های پزشکی پرسنل می بایست به صورت منظم و در مقاطع زمانی حداقل یک ماهه در یک فایل الکترونیکی وارد گردیده و در اختیار بازرسین HSE کارفرما و نظارت قرار گیرد.
- پیمانکار موظف است نتایج معاینات بدوساختدام و دوره ای پرسنل خود را به واحد HSE کارفرما ارسال نموده و از بکارگیری افرادی که قادر صلاحیت پزشکی برای شغل مورد نظر هستند، اجتناب نماید.
- نوع انجام معاینات شغلی دوره ای بایستی با توجه به نوع عوامل زیان آور موجود در محیط کار و وظیفه محوله مطابق با نظر پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفة ای پیمانکار تعیین می شود.
- ارائه نوار مغز جهت مشاغل سخت از جمله رانندگان، نفرات مشغول در ارتفاع بیشتر از ۱۲۰ cm و مشاغل حساس الزامی می باشد.
- پیمانکار موظف است بر مبنای مقررات جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمامی رانندگان شاغل در طرح با انجام آزمایشات پزشکی لازم، کارت سلامت رانندگی اخذ نماید.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۷۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار در تمام مدت اجرای طرح و به صورت سالیانه نسبت به شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و ریسک و مخاطرات بهداشتی اقدام نماید. و شرح خدمات مطالعات مذکور می باشد پیش از شروع مطالعات می باشد جهت تایید به مدیریت HSE کارفرما ارسال گردد.
- نتایج حاصل از مطالعات فوق می باید به پژوهشگاه و مراکز طب کار انجام دهنده معاینات طب صنعتی کارکنان شاغل در کارگاه جهت نسبت میزان مواجهات با عوامل زیان آور محیط کار در پرونده های پژوهشگی پرسنل از ائمه گردد و در قالب فایل فشرده برای واحد HSE کارفرما از ائمه گردد.
- اقدامات اصلاحی صورت گرفته جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار و مخاطرات بهداشتی شناسایی شده در بازدهیهای دوره ای واحد HSE کارفرما مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
- نتایج حاصل از انجام این مطالعات و اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده می باید در فرم های گزارش سالیانه مصوب شرکت توسعه و آهن و فولاد گهر به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.
- با توجه به شرایط جغرافیای منطقه در فصول سرد و گرم سال ضروری است پیمانکار برنامه ریزی و تمهدیات لازم جهت پیشگیری از گرمای زدگی و سرما زدگی پرسنل شاغل در طرح را انجام دهد. از جمله توزیع شیر و آبلیمو، تنظیم ساعت کار و استراحت پرسنل، تهیه لباس مناسب هر فصل و ...
- پیمانکار موظف است غذای روزانه پرسنل خود را از آشپزخانه/ رستورانی که دارای شرایط بهداشتی مورد تایید بوده و پرسنل آن دارای کارت سلامت می باشند، تهیه نماید.
- پیمانکار موظف است از جهت توزیع غذا از ظروف غذا مورد تایید و خودروی مناسب و دارای سریوش استفاده نماید.
- با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه ضروری است رزیم ها و برنامه های غذایی مناسب تدوین و اجرا گردد.
- آشپزخانه/ رستوران مذکور باید در فواصل زمانی مختلف توسط کارشناس بهداشت پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان رستوران، نسبت به تغییر محل تهیه غذا اقدام گردد.
- کلیه پرسنل شاغل در آبدارخانه ها، کمپ های مسکونی و سایر اماکن بهداشتی باید دارای کارت سلامت معتبر از مراکز بهداشت باشند.
- آب آشامیدنی و آب بهداشتی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد.
- مخازن آب آشامیدنی و بهداشتی مورد استفاده در کارگاه های طرح باید از جنس پلی اتیلن بوده، در ارتفاع مناسب نصب شده و کدگذاری گردد.
- تمامی مخازن آب آشامیدنی باید دارای سایبان و عایق مناسب باشند.
- یخ های مورد استفاده می باشد از مراکز مجاز و بهداشتی تهیه شده و در ICE BOX های مناسب نگهداری ، به وسیله ماشین های بخچال دار با رعایت اصول و موارد بهداشتی توزیع گردد.
- آزمایشات میکروبی به صورت سه ماه یکبار و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی به صورت شش ماهه می باشد از طریق مراکز و شرکتهای مجاز انجام شود.

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۷۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- حمل و نقل آب آشامیدنی و بهداشتی به کارگاه ها می بایست مطابق با اصول بهداشتی و با استفاده از خودورهای مخصوص انجام شده و رانندگان این خودورها بایستی دارای کارت بهداشت معتبر باشند.

- کلر سنجی و PH سنجی آب آشامیدنی می بایست به صورت روزانه و توسط واحد HSE پیمانکاران انجام شده و نتایج آن به نحو صحیح ثبت و نگهداری گردد. در صورت عدم تایید آب از نظر میزان کلر باقیمانده و PH، مصرف آب جهت مصارف شرب منع است.

- اماكن بهداشتی تحت پوشش پیمانکار باید به صورت دوره ای و با استفاده از سموم مجاز و مورد تایید وزارت بهداشت و توسط شرکت های ذیصلاح مورد سم پاشی و طعمه گذاری قرار گرفته و سوابق مربوطه ثبت و بایگانی گردد.

*آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه - وزارت کار

*رعایت مفاد دستورالعمل سم پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گهر ضروری است.

- پیمانکار موظف است در کارگاه های طرح و مناسب با تعداد کارکنان و جنسیت آنها، سرویس بهداشتی مناسب و مطابق با استاندارد مصوب احداث و مستقر نماید.

- سرویس بهداشتی باید به صورت منظم نظافت شده و دارای روشنایی و تهویه مناسب باشد.

- اجام نظافت سرویس بهداشتی توسط آبدارچی و سایر نفرات طبخ و توزیع کننده غذا منع بوده و بدین منظور باید از نفرات نظافت جی مجزا استفاده گردد.

۳-۲-۲-۷- کمک های اولیه و معالجه جراحات صنعتی

- پیمانکار باید مناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات شناسایی شده در کارگاه، جعبه کمک های اولیه شامل تجهیزات (حداقل شامل چسب زخم، پنس، گاز استریل بسته بندی شده، ماده ضد عفونی کننده، باند پاسمنان، پماد سوختگی و ...) تهیه نموده و در نفاطی که دسترسی فوری به انها برای کارگران میسر باشد، نصب نماید.

- لازم است هر ۱۰ نفر از شاغلین کارگاه ها، حداقل ۱ نفر از کارکنان پیمانکار، آموزش کمک های اولیه و امداد نجات را برای عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه و واکنش در شرایط اضطراری گذرانده و گواهینامه های مربوطه را دارا باشد. همچنین دوره بازآموزی کمک های اولیه می بایست هر ۱ سال یکبار انجام شود.

- پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما نسبت به تهیه و تامین آمبولانس دارای تجهیزات لازم به همراه پرستار مربوطه و راننده مجروب و اشتبا به اصول کمک های اولیه و امداد و نجات استفاده نماید. تجهیزات آمبولانس و شرایط آماده به کار بودن آن می بایست در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

۶- پیوست یک دستور العمل HSE شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳ تا استان ۱۴۰۴ صفحه ۷۷ از ۱۹۵

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آن و نوآورانی کشور G.I.S.D.C.
۰۱	شماره ویرایش		

۶-۲-۲-۷- عملیات پرتونگاری صنعتی

- پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات پرتو نگاری صنعتی مقاد دستورالعمل های سازمان انرژی اتمی ایران و دستورالعمل اینمنی پرتو نگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین دستورالعمل اینمنی پرتو نگاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر را اجرا نماید.

- بکارگیری افراد با تجربه و دارای گواهینامه پرتونگاری جهت انجام عملیات مربوطه
 - هماهنگی کامل با تاسیسات مجاور طرح، قل، در حین و پس از پایان عملیات پرتونگاری
 - رعایت نکات HSE در نگهداری، حمل و نقل و استفاده از چشممه های پرتوزا
 - اخذ پرمیت های پرتونگاری صنعتی برای با ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجرای کامل موارد مندرج در آن
 - حضور مستول فیزیک بهداشت شرکت پرتونگار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
 - حضور ناظر HSE شرکت پیمانکار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
 - نصب علائم هشدار دهنده از جمله تابلو خطر، چراغ هشدار دهنده و نوار خطر در محدوده عملیات پرتونگاری
 - جهت نگهداری چشممه های رادیواکتیو در کارگاه ها می باشد از Source Room های اینمن و مطابق با سازمان انرژی اتمی استفاده گردد.
 - اعلام سریع فقدان چشممه پرتوزا به واحد حراست طرح، واحد HSE دستگاه نظارت و واحد HSE کارفرما و سازمان انرژی اتمی

-۵-۴-۲-۱- BLASTING زدایی (عملیات زنگ

- * رعایت مفاد دستورالعمل ایمنی سندبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات زنگ زدایی (سند بلاست) موارد ذیل را به دقت مورد توجه و اجرا قرار دهد:
 - استفاده از سیلیس در عملیات سندبلاست ممنوع بوده و می باشد از مواد کم خطرتر همچون منس باره استفاده شود.
 - محل انجام عملیات زنگ زدایی می باشد تا حد امکان از سایت قابله داشته و به صورت مناسب محصور گردد.
 - به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی می باید تجهیزات حفاظت فردی مناسب و مخصوص عملیات سند بلاست از جمله لباس کار، ماسک های هوا رسان، دستکش ضد ارتعاش تحويل داده شود و استفاده از این تجهیزات توسط پرسنل سند بلاست کار در حین اجرای کار الزامی است.
 - تجهیزات سندبلاست می باشد اینمن و سالم بوده و برحسب مورد دارای گواهینامه سلامت فنی باشند.
 - به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی به صورت روزانه و منظم شیر پاستوریزه تحويل گردد.
 - انتاق استراحت، تعویض لباس و صرف غذای پرسنل سندبلاست کار می باشد دارای ابعاد کافی و مناسب با تعداد پرسنل بوده و تا حد ممکن از محل انجام عملیات سند بلاست فاصله داشته باشد.
 - جهت استحمام پرسنل سندبلاست کار پس از انجام عملیات روزانه می باشد حمام و رختکن مناسب در دسترس باشد.
 - در انجام معابینات طب صنعتی می باید نوع شغل و میزان مواجهه پرسنل با عوامل زیان آور موجود در آن از جمله سر و صدا و ارتعاش ، گرد و غبار ... به دقت مورد توجه قرار گیرد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۷۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۳- بخش چهارم: الزامات محیط زیستی

۷-۲-۴- مقررات زیست محیطی

الزام پیمانکاران به رعایت کلیه الزامات قانونی زیست محیطی که عمدۀ ترین آنها عبارتند از:

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد):

- قوانين و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران.

- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
- قانون شکار و صید با اصلاحیات
- قانون حفظ نباتات
- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (اصوبه هیات وزیران با اصلاحات بعدی)
- آیین نامه جلوگیری از الودگی آب هیات وزیران
- قانون نموده جلوگیری از الودگی هوا
- آیین نامه اجرایی قانون نموده جلوگیری از الودگی هوا

- قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی- سازمان حفاظت محیط زیست ایران

- دستورالعمل های محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- کلیه مصوبات و پخشمنه های هیئت وزیران در خصوص الزامات زیست محیطی

- کلیه مصوبات و دستورالعمل های جدید یا بازنگری و ابلاغ شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست

تعهد و مستولیت پیمانکار در آگاهی و استفاده از آخرین نسخه از کلیات الزامات و قوانین مورد اشاره)

۷-۲-۴-۲- نظارت و بازرگانی زیست محیطی

- اجام کلیه تعهدات، الزامات و راهکارهای کنترل و جلوگیری از الودگی محیط زیست ارائه شده در گزارش مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و مجوز EIA طرح، توسط پیمانکار

- اجام مطالعات نظارت، بازرگانی و پایش زیست محیطی بعد از شروع فعالیت های اجرای طرح و ارائه گزارش ۳ ماهه

- رعایت دستورالعمل نحوه نظارت و پایش زیست محیطی طرح ها و پروژه ها - سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۹۴

- دارا بودن طرح و برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) به منظور رعایت الزامات زیست محیطی شامل اطلاعات ذیل:

﴿ توصیف فعالیت های در دست اقدام و برنامه ریزی شده برای پیمانکار با تأکید بر کلیه انتشار مواد الاینده و تخلیه های مهم به محیط زیست ناشی از فعالیت.

﴾ جزئیات اقدامات و پیشنهادات پیمانکار در خصوص کاهش اثرات فعالیتها بازیابی بر محیط زیست (هوا، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی و زمین) محل پروژه.

﴾ جزئیات برنامه و دستورالعمل های پیمانکار در خصوص مدیریت مواد شیمیایی و الزامات هیدرولوژیکین ها.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۷۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

* آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار)

- » جزئیات برنامه و پیشنهادات پیمانکار برای مدیریت پسماندها و فاضلاب ها.
- » بازنگری طرح مدیریت زیست محیطی پیمانکار به صورت سالانه و انتباط با تغییرات کاری و محیطی در حادثه به هر طریق ممکن

۷-۲-۳-۱- حوادث/ گزارشات زیست محیطی

- جمع آوری ثبت اطلاعات و تهیه گزارشات آماری- تحلیلی زیست محیطی
- تهیه و ارسال به موقع و صحیح گزارشات فصلی (سه ماهه) و گزارشات یکساله از عملکرد زیست محیطی طرح به واحد HSE کارفرما
- گزارش به موقع و صحیح حوادث زیست محیطی بالفعل یا بالقوه مخرب محیط زیست صرف نظر از دخالت یا عدم دخالت پیمانکار در حادثه به هر طریق ممکن
- اطلاع رسانی حادثه به واحد محیط زیست در حداقل زمان ممکن (حداکثر ظرف ۲۴ ساعت) و ارسال گزارش حادثه برای موارد ناشی، به واحد HSE کارفرما
- دارا بودن طرح واکنش در شرایط اضطراری برای کنترل و پاکسازی ریزش مواد و مقابله با آلودگیها و حوادث زیست محیطی در شرایط اضطراری مطابق با شرایط تحت نظارت نماینده HSE کارفرما

۷-۲-۳-۲- پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

- پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اجرایی طرح بر اساس دستورالعمل خود اظهاری در پایش آلاینده ها- سازمان حفاظت محیط زیست.
- پیمانکار ملزم به انجام پایش آلاینده ها و ارائه راهکارهای کنترلی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست.
- پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری سالانه آلاینده های زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده فعالیت خود و ارائه گزارش تحلیلی آن به همراه نتایج اندازه گیری به مدیریت HSE کارفرما
- پیمانکار ملزم به رعایت استانداره های پاک سر و صدا، حد مجاز آلاینده های خروجی به محیط زیست و ...

۷-۲-۳-۳- آلودگیهای زیست محیطی (هوای خاک، صوت)

- کنترل و مدیریت هر گونه آلاینده (هوای خاک) و رعایت کلیه قوانین و استاندارهای ملی و محلی در محدوده فعالیت خود
- پاکسازی منطقه آلوده و متوقف نمودن نشی موارد آلاینده (اسید، باز، هیدروکربنها و مواد مشابه) به خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی
- جمع آوری پسماند حاصل از عملیات بلاستینگ پس از پایان عملیات جهت جلوگیری از آلودگی هوای خاک و دفع نهایی در اماكن مورد تایید

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۸۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- رعایت استانداردها و معیارهای سر و صدا سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی صوتی
- رعایت استانداردهای کیفیت منابع خاک و راهنمایان آن - سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک
- آب پاشی محوطه های فنی کشی شده و استفاده از ادوات و خودروهای دارای معاینه فنی و آلودگی کمتر از حد مجاز
- نصب فیلتر هوا بر روی کلیه تجهیزات و ادوات با آلایندگی بیشتر از حد مجاز ضروری بوده و پیمانکار بایدز بکارگیری تجهیزات دستگاهها و ادوات با میزان آلایندگی بالاتر از حد مجاز اجتناب نماید.
- کلیه خودرو های بکارگیری شده در سایت باید دارای برگه معاینه فنی از مراکز ذیصلاح باشند.
- پیمانکار می بایست تمهیدات کنترلی لازم جهت جلوگیری از گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کارگاه ها را پیشگیری و اجرا نماید. از جمله آب پاشی محوطه ها، کنترل تردد خودروها، استفاده از ادوات و تجهیزات سالم و دارای آلودگی در حد مجاز، جاده کشی و کوبش خاک و ...
- به منظور تامین ایمنی و رسیدن به محدوده مجاز انتشار صدا و مقابله با صدمات ناشی از ایجاد سر و صدا، تمامی منابع با اهمیت ایجاد کننده صدا شامل پیمایهای اصلی و دیگر تجهیزات، باید مورد بررسی و عمل قرار گیرند و پیمانکار باید در صورت نیاز به نصب خفه کن و یا سازه های عایق صدا، از اینگونه تجهیزات استفاده نماید.
- احداث جایگاههای بارگیری و تخلیه سوخت جهت مصرف سوخت ادوات و ماشین الات: مطابق با استانداردهای لازمه منظور جلوگیری از نشت آلودگی خاک

۶-۲-۳-۶- مدیریت پسماند

* رعایت مفاد دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گهر ضروری است.

- بازیافت از مرکز پسماندها و تفکیک و کد گذاری کلیه زائدات و مواد قابل بازیافت تولید شده توسط پیمانکار و دفع در محلهای مشخص شده (بر اساس انواع زائدات) پس از بازیافت و تعهد پیمانکار به فراهم نمودن امکان تفکیک و دفع در محدوده فعالیت خود در شرایط عدم دسترسی به محل های مشخص شده تفکیک و دفع زائدات و حتی امکان بازیافت مواد زائد.
- کاهش تولید زائدات ناشی از ساخت و ساز و فعالیت های بهره برداری، بازیافت روغن های مستعمل و مازاد و ...
- پرهیز از دفع زائدات خطرناک و ویژه تولید شده همراه سایر زائدات توسط پیمانکار و هماهنگی برای تعیین روش مناسب دفع این مواد با واحد HSE کارفرما (مسئلولیت پرداخت هزینه دفع زائدات خطرناک به عهده پیمانکار می باشد).
- جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و صنعتی طبق ضوابط بهداشتی و به صورت روزانه
- اخذ مجوزهای لازم برای دفن مواد زائد در محل های مورد تایید سازمان محیط زیست و شهرداریها توسط پیمانکار

۶-۲-۳-۷- مدیریت پساب (صنعتی و بهداشتی)

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۸۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

* آیینه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار)

- تعیین محل و روش دفع فاضلابها با نظارت کامل واحد HSE و اخذ تاییدیه کارفرما
- ممنوعیت تخلیه هر نوع ماده یا دفع زاندات در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری ، دریا، کانالها، نهرهای طبیعی و منابع پذیرنده غیر مجاز
- اقدام در خصوص تصفیه و پاکسازی پساب های بهداشتی و صنعتی تولیدی خود و رعایت استانداردهای خروجی فاضلاب
- الزام به استفاده مجدد از پساب های حاصل از عملیات تست هیدرواستاتیک و یا ایستایی مخازن و لوله ها و جلوگیری از دفع نهایی و رها سازی در محیط
- احداث سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی و سبیلک تانک جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی تولیدی در فاز ساختمانی جهت کلیه سرویس های بهداشتی ، رستوران ها، اماکن و کارگاه های سایت
- در صورت استفاده از روغن های روانساز، روغنها پس از مصرف بشکه جمع آوری و به محل مناسب انتقال و بازیافت گرددند
- جهت جلوگیری و ممانعت از نشر آلودگی محیطی به منابع ذخایر آب زیرزمینی با توجه به سطح آبهای زیرزمینی تمامی فاضلاب ها، جمع آوری گردیده و به مخزن سبیلک تانک فرستاده شود. محل احداث مخزن مذکور باید در خلاف جهت باد جاگذاری شده باشد.

۷-۲-۳-۸- مدیریت انرژی

- پیمانکار ملزم به انجام اقدامات لازم در خصوص افزایش بازدهی و کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی و گزارش نتایج آن به واحد HSE کارفرما می باشد.
- پیمانکار ملزم به اجرای سیستم و برنامه های مدیریت انرژی (EnMS) و کاهش مصرف سوخت می باشد.

۷-۲-۳-۹- مدیریت سبز

- رعایت آیین نامه های اجرایی و قوانین ابلاغی در خصوص مدیریت سبز
- بهینه سازی مصرف آب
- کاهش مصرف غذا
- مصرف بهینه مواد اولیه، مصرفی و تجهیزات
- استفاده از فناوری های پاک و امکان استفاده مجدد از ضایعات و پساب
- استفاده از مواد مصرفی سازگار با محیط و ...
- ایجاد و نگهداری فضای سبز مناسب در سایت ها، جاده ها و مسیرهای دسترسی و ...

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۸۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۳-۱۰- سیستم مدیریت محیط زیست

- ایجاد یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) و همچنین ارائه طرح و برنامه پایش محیط زیست (EMS) از سوی پیمانکار طرح ضروری می باشد
- شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی دامنه فعالیت های پیمانکار و ارائه آنها به واحد HSE کارفرما

۷-۲-۳-۱۱- مدیریت منابع طبیعی و اماکن عمومی

- ممنوعیت قطع هرگونه درخت، پاکترانشی و تسطیح محلهای بکر بدون مجوز واحد HSE کارفرما
- بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت خود و ضرورت اخذ تاییدیه واحد محیط زیست کارفرما در این خصوص
- ممنوعیت عبور وسائل نقلیه و تجهیزات سیار از مناطق بازسازی شده
- رعایت قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در ممنوعیت تعرض و آسیب به حیوانات و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع تصادفات جاده ای با حیوانات در محدوده فعالیت پیمانکار و ضرورت گزارش هرگونه اسیب و جرح به حیوانات یا کشته شدن آنها بر اثر تصادفات جاده ای به بخش محیط زیست کارفرما
- چنانچه فعالیت شرکت در مجاورت اماکن عمومی، مناطق مسکونی شهرها یا روستاهای انجام می شود پیمانکار موظف است با رعایت کامل ملاحظات HSE ضمن پیشگیری از بروز هرگونه حادثه، تمهیدات لازم را به منظور مواجهه با حادث احتمالی در طرح اضطراری خود مورد توجه قرار دهد. این طرح باید حاوی اعلامیه هایی برای تخلیه افراد غیر مستول و نیز امداد نجات عمومی باشد.
- بسته به نوع فعالیت های شرکت های تابعه، ممکن است چند روستایی کوچک در محدوده یا مجاورت سایت قرار گیرد. در اینگونه موارد در صورتی که پیمانکار نیاز به تردد به داخل یا اطراف مراکز روستایی محصور دارد باید ضمن مسیر سازی کلیه دروازه ها و مسیر ها به حالت قبل از ورود یا استفاده بازگرداند. تردد تمام وسائل نقلیه پیمانکار باید در مسیر های ایجاد شده یا مورد توافق صورت گیرد. همچنین ایجاد هرگونه آتش در اینگونه سایت ها ممنوع است.
- با توجه به گسترده‌گی شرکتهای تابعه در کشور و بزرگی این سایت ها، احتمال وجود آثار تاریخی در محدوده سایت صنعت وجود دارد. در اینگونه موارد، پیمانکار موظف است با همانگی واحد HSE کارفرما آثار تاریخی کشف شده را توسط فنس محصور نمایند. پیمانکاران تعرض به این آثار را ندارد و اگر ناخواسته یک آثار تاریخی، تخریب شد و یا پیمانکار حدس می زند اثر جدیدی را کشف کرده است، باید کار را بی درنگ رها کرده و موضوع را به واحد HSE کارفرما و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد.

۷-۲-۴- بخش پنجم: الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

- تدوین برنامه ای جهت مقابله با شرایط اضطراری و ایجاد تعامل با شرکت های پیمانکار فرعی ضروری می باشد.
- طرح مواجهه با شرایط اضطراری (ERP) پیمانکار باستی توسط HSE مشاور و کارفرما تایید گردد.
- برقراری تفاهم نامه با شرکت های مجاور جهت همکاری مقابله در شرایط اضطراری.
- مشخص کردن محل تجمع اینم برای کلیه پرسنل و تعیین مسیرهای خروج اضطراری و تهیه و تدوین دستورالعمل خروج اضطراری، نجات و فرار
- تدوین برنامه مانور جهت آمادگی پرسنل در شرایط اضطراری و برگزاری مانور در کارگاه ها با همانگی HSE مشاور و کارفرما

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۸۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکاران موظفند، در زمان وقوع حوادث جدی از قبیل آتش سوزی، نشت مواد خطرناک، صدمه به تجهیزات و... اقدامات مقتضی را برای کاهش اثرات ان انجام دهد.
- پیمانکاران موظفند، وسائل حفاظت فردی مناسب نظیر ماسک و فیلتر گازهای مختلف موجود در مسیر های در دست بهره بردار را تهیه نموده و برای موقع اضطراری در اختیار کارکنان خود قرار دهد.
- تشکیل گروه امداد و نجات مجهز به امکانات و تجهیزات مورد نیاز بر حسب نیاز پرسنل ساکن در ساختمان و پیمانکاری طرح به جهت امداد رسانی لازم در شرایط اضطراری.

۷-۳- قطع همکاری و پایان پیمان

- پیمانکار موظف است در تمام مدت انجام پروژه مقررات HSE را رعایت نماید. از این رو نحوه عملکرد HSE پیمانکار در طول انجام پروژه مورد ارزیابی HSE کارفرما قرار می گیرد.
- کارفرما عملکردهای پیمانکاران مشغول به کار را مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های HSE عملیات اجرایی را فوراً تاریخ تخلف متوقف خواهد نمود و هیچ گونه هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد، این توقفات بعنوان تأخیر غیر مجاز تلقی می گردد و در صورت عدم رفع نواقص طبق مفاد پیمان عمل خواهد شد.
- چنانچه قطع همکاری به علت لحاظ نشدن الزامات (HSE) مواردی نظیر الودگی های شدید زیست محیطی، آمار بالای حادث و...) صورت پذیرد با پیمانکار مطابق قوانین در مورد همکاری های بعدی عمل می گردد.
- کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده یا سایر مواد باقیمانده از فعالیت پیمانکار، پس از پایان عملیات اجرایی پیمان، باید از سایت جمع آوری و به نحو مطلوب ساماندهی یا دفع شود. کارفرما تحت هیچ شرایطی تعهدی در خصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت.
- پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه نسبت به پاکسازی محیط زیست، از بین بردن موانع ایجاد شده، پر کردن چاله ها، گودال ها و کanal های حفر شده و... اقدام نموده و شرایط محل کار را به حالت عادی باز گرداند.
- پیمانکار موظف است گزارش عملکرد HSE خود (از جمله آمار بیماری های شغلی، حادث، خسارت ها، آسیب های فردی و زیست محیطی) را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.

۷-۴- جرائم و تخلفات پیمانکاران

نماینده کارفرما در تمامی پیمان ها ناظر بر الزامات HSE قرارداد بوده و موارد تخلف از طریق نماینده کارفرما به مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال تا متناسب با نوع تخلفات جرائم لازم درخصوص هر پیمانکار اعمال گردد.
در صورت عدم رعایت هریک از بندهای الزامات HSE و یا HSE- Plan توسط پیمانکار، نماینده کارفرما مجاز خواهد بود برخوردهای انصباطی به ترتیب ذیل را انجام دهد:

- اخطار شفاهی به پیمانکار
- اخطار کتیبه به پیمانکار، درخواست اخراج فرد خاطی، اخذ تعهد و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد نایمن و انجام اقدامات اصلاحی
- دستور توقف فعالیت های مخاطره آمیز و جریمه دیرکرد
- اعلام گزارش تخلف به ناظر فنی پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار به صورت درصدی از صورت حساب های ماهیانه و یا در صدی از آیتم قراردادی مورد نظر

لازم به ذکر است جداول جرائم افراد و پیمانکار طبق دستورالعمل "دستورالعمل تشويق و تنبیه HSE" به شماره ۱۲۷۸-۱۰۰-۰ WI در پیوست اعمال خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۹۵ از ۸۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۸- تغییرات

مسئولیت انجام تغییرات و بروزرسانی در این سند بر عهده واحد HSE می باشد.

۹- مستندات مربوطه

- شناسنامه فرآیندهای مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره FO1018 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار
- دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه وسائل حفاظت فردی - وزارت کار .
- دستورالعمل وسائل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر ماد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
- دستورالعمل ایمنی ماشین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسائل نقلیه - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داربست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی در کارگاه - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر).
- دستورالعمل ایمنی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه علاطم ایمنی در کارگاه - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی علاطم هشدار دهنده و تابلوهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار
- دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آیین نامه حفاظتی کار با سیم دفع آفات در کارگاه - وزارت کار
- رعایت مقاد دستورالعمل سیم پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی سندبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار
- دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار
- دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار

۱۰- پیوست ها

- تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران FO1962
دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI1042
- چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به شماره FO1043
دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE به شماره WI1278
- دستورالعمل روبه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE به شماره WI2148
وندور لیست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO2149
- وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی به شماره FO1221
لیست اقلام موثر بر HSE به شماره FO2151

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه از ۸۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
G.I.S.D Co.

عنوان مستند: دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران
سطح محترمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
WI10.42	۹۹/۰۶/۲۹		۰۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
بهرام کلانتری	رئیس ایمنی فنی و فرآیندها		

رسول امیری مقدم	رئیس سیستم ها و فرایندها		
مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست		

اصغر حیدری	مدیر سیستم ها و برنامه ریزی		
محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی		

حجت نجمی نیا	مدیر عامل		

چشمکش
دانشگاه

دانشگاه
کنگره

تصویب
کنندگان

هر گونه بهره برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی) شماره ویرایش	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
--------	---------	--	--

عنوان مستند : دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران

ردیف	شماره تجدیدنظر	تاریخ تجدیدنظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	اصلاح شاخص ها و چک لیست ارزیابی عملکرد - اضافه شدن بند ۷.۱ فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار - اضافه شدن بند ۷.۳ اعمال تشویق و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار - اضافه شدن جدول جرائم

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهییه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گشایی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل، ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه سلامت، ایمنی و زیست محیطی به منظور افزایش سطح کیفی و کمی ایمنی و استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به تولید بدون حادنه و صیانت از پیمانکاران است که بصورت دوره‌ای مورد ممیزی قرار می‌گیرد. در این راستا نیاز است عملکرد نقاطه قوت و قابل بهبود مشخص گردد لذا در جهت ارزیابی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران، مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام به تدوین این دستورالعمل به منظور تحقق موارد زیر نموده است.

- تشریح نحوه تشویق و تنبیه، پیمانکاران (در نقش شرکاء تجاری) در خصوص موارد HSE بر اساس دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- کنترل مدام جریان امور و استقرار جرخه مدیریت HSE
- شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه سلامت ایمنی و محیط زیست و نلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها
- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی
- تدوین و تنظیم شاخصهای ارزیابی عملکرد
- ارتقای سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران
- همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی‌های شرکت در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست

۲- دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این دستورالعمل برای کلیه شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می‌باشد.

۳- تعاریف

- ندارد

۴- مراجع و مأخذ

۵- مسئولیت و اختیار

مسئولیت تهیه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می‌باشد.

۶- منابع مورد نیاز

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP12-10-12

۶.۱- شرح ورودی‌ها و خروجی‌های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP12-10-12

۶.۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل‌های مرتبط با فرایند

سنجه‌های مذکور در شناسنامه فرایند "HSE مدیریت پیمانکاران" به کد BP12-10-12 و بررسی‌های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۸۹ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محروم‌گی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷- نحوه اجرا

۷.۱- فرم ارزیابی عملکرد HSE

بر اساس فرم تهیه شده، عملکرد کلی پیمانکار به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آن طبق بند ۷.۲ اقدام خواهد شد:

۷.۱.۱- بخش‌های فرم ارزیابی عملکرد

۷.۱.۱.۱- شرح شاخص‌های ارزیابی

بر اساس شاخص‌های ثبت شده در فرآیند مدیریت HSE پیمانکاران تمامی مواردی که در ارزیابی عملکرد بررسی و ارزیابی خواهد شد در این سنتون آورده شد است.

۷.۱.۱.۲- وزن

با توجه به میزان اهمیت آن موضوع و اثرگذاری آن بر دستیابی به اهداف خود و کلان HSE برای هر آیتم یک وزن تعريف خواهد شد. که به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۱: وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد

ردیف	وزن	توضیحات
۱	۱	دارای اهمیت و اثرگذاری عادی در اجرای این فعالیت‌های پیمانکار
۲	۲	دارای اهمیت و اثرگذاری متوسط در اجرای این فعالیت‌های پیمانکار
۳	۳	جزء لیست شاخص‌های فرآیندهای ابلاغی در گزارش ماهیانه / دارای اهمیت و اثرگذاری بالا در اجرای این فعالیت‌های پیمانکار
۴	۴	جزء دستورالعمل‌ها و الزامات ابلاغی / دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری در دستیابی به اهداف خود
۵	۵	دارای الزامات قانونی / دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری در دستیابی به اهداف کلان

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۹۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷/۱/۱/۳ نمره کسب شده

برای مشخص نمودن نمره کسب شده در هر آیتم می بایست با توجه به ستون "راهنمای نمره دهی" و ستون "مبناي پیش" امتیاز کسب شده از ۱ تا ۱۰ را مشخص و ثبت نمود.

۷/۱/۱/۴ مبنای پایش

مواردی که بر اساس آن ها می بایست عملکرد پیمانکار در آن بخش را مورد ارزیابی قرار داد.

۷/۱/۱/۵ راهنمای نمره دهی

در این ستون مشخص شده است با بررسی موارد ذکر شده در بخش "مبناي پایش" پیمانکار چه مقدار از اقدامات لازم را انجام داده و چه امتیازی می تواند کسب کند.

۷/۱/۱/۶ نمره تجمعی

از حاصل ضرب وزن هر آیتم در نمره کسب شده آن آیتم به دست می آید

تصریه: آیتم هایی که برای آن ها گزینه "عدم کاربرد" انتخاب شود در محاسبه امتیاز نهایی دخیل نخواهد بود.

تصریه ۲: پس از مشخص شدن امتیاز نهایی با توجه به جدول امتیازات موجود در پند ۷.۲ این دستورالعمل درخصوص عملکرد پیمانکار تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

۷/۲- نتایج ارزیابی و اقدامات لازم

➢ نماینده یا نمایندگان واحد HSE کارفرما بر اساس فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در بازه زمانی ماهیانه نسبت به ارزیابی کلیه پیمانکاران شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطابق فرم شماره (FO1043) اقدام و گزارش آن را به مدیریت HSE ارسال می نمایند.

➢ مدیریت HSE نتایج ارزیابی را به همراه جک لیست مربوطه به نظارت پیمانکار جهت پیگیری و رفع مغایرت ارسال و یک نسخه از آن را در بایگانی واحد HSE بعنوان سند به مدت پنج سال پس از اتمام قرارداد نگهداری می نمایند.

➢ به منظور کاهش تخلفات و ملزم نمودن پیمانکاران به رعایت موارد HSE در شرکتها و پیمانکاران تحت نظارت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروریست اقدامات بازدارنده و مناسب با نوع عملکرد پیمانکار و براساس نمره کسب شده به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شود.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۹۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

جدول شماره ۲: امتیازات عملکرد

ردیف	امتیاز	نحوه واکنش
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحید مدیر عامل، پیمانکار میتواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جرمیه لحاظ می گردد.
۴	۲۰-۳۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جرمیه لحاظ می گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیر کارگاه جایگزین می باشد.
۵	۰ - ۱۹	اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جرمیه

تذکرہ ۱: تشویق و جرمیه از طریق دستگاه نظارت اعمال خواهد شد.

تذکرہ ۲: این دستورالعمل میباشد پیوست قرارداد قرار گیرد و به پیمانکار ابلاغ گردد و یا در غیر اینصورت مستقیماً و در جلسه شروع به کار به رویت و اطلاع نماینده صاحب اوضاع مجاز پیمانکار بررسد.

﴿ تصمیم اتخاذ شده و نحوه واکنش از طریق مدیریت HSE به مدیریت پیمانکار و دستگاه نظارت اطلاع داده و پیمانکار ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه ارزیابی فرصت دارد جهت رفع و ارائه مستندات تکمیلی و قطعی نمودن امتیاز ها اقدام نماید بدینه ای است عدم ارائه مستندات به منزله پذیرش تصمیم اتخاذ شده می باشد. ﴾

﴿ دستگاه نظارت تصمیم اتخاذ شده مدیریت HSE را در صورت وضعیت اعمال می نماید. ﴾

۷.۳- اعمال تشویق و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار

بر اساس ارزیابی مستمر پیمانکار به وسیله چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در صورت وجود هرگونه قصور، کوتاهی، عدم انطباق و تخلف از سوی پیمانکاران، مناسب با دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره W11278-۰۰ و جدول جرائم عملکردی آن در اقدام خواهد شد.

۸- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، اینمی و محیط زیست می باشد.

کلیه سوابق حاصل از اجرای این دستورالعمل به مدت پنج سال پس از اتمام پیمان نزد مدیریت HSE نگهداری خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۹۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI1042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۹- مستندات مربوطه

دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره WI1278-01

۱۰- پیوست ها

چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد "FO1043"

دستورالعمل تشویق و تنبیه به شماره WI1278

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی

(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۹۵ از ۹۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:		چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران			
تاریخ:	نام:	تعداد موقت	شرح صفاتی های ارزیابی	مرحله	
نحوه را وارد نمایند	برای ایتم ۳ مسمه در نظر گرفته شود	۵	شناسایی، ارزیابی، ضبط	۱	
نحوه را وارد نمایند	برای آتش های ۱ و ۲ هر کدام ۳ مسمه در نظر گرفته شود	۴	Anomaly	۲	
نحوه را وارد نمایند	برای آتش های ۱ و ۲ هر کدام ۳ مسمه در نظر گرفته شود	۴	دغدغه	۳	
نحوه را وارد نمایند	در صورت شنبه شدن، ۸۰ درصد کنترل شده باشد	۴	Anomaly	۴	
نحوه را وارد نمایند	ازای هر ۵ درصد کنترل شده باشد	۴	دغدغه	۴	
نحوه را وارد نمایند	برای همچنانه و دفعه هر آتش ۵ مسمه در نظر گرفته شود	۴	شناسایی، ضبط	۵	
نحوه را وارد نمایند	برای سوت رفع شدن ۸۰ درصد همه مدارک	۳	عدم اطمینان علی شناسایی شده به علی (کارزارش) مدارک	۵	
نحوه را وارد نمایند	تو بجهه به بجهه به کل (کارزارش) مدارک	۳	عدم اطمینان علی شناسایی شده به علی (کارزارش) مدارک	۶	
نحوه را وارد نمایند	در صورت محقق شدن ۱۰ درصد محدود استثنی کنکل و به ازای هر ۵ درصد کنترل شده باشد	۵	سیستم محدودات محقق شده به کل (کارزارش) مدارک	۷	
نحوه را وارد نمایند	در صورت محقق شدن ۱۰ درصد محدود استثنی کنکل و به ازای هر ۵ درصد کنترل شده باشد	۵	سیستم محدودات محقق شده به کل (کارزارش) مدارک	۸	
نحوه را وارد نمایند	برای آتش های ۱ و ۲ هر کدام ۳ مسمه در نظر گرفته شود	۵	کواییلیه، کالکسیون و نایدیه، علی الزینی و فلؤی	۹	
نحوه را وارد نمایند	برای آتش های ۱ و ۲ هر کدام ۳ مسمه در نظر گرفته شود	۵	وصیت تکمیل چارت HSE مطبق در مدل الیات HSE پیمانکاران	۱۰	
نحوه را وارد نمایند	در صورت محقق شدن ۱۰ درصد همه کارزارش مدارک	۵	وضیعت اخذ صلاحیت ایمی پیمانکاران زیر مجموعه از اذرا کار	۱۱	
نحوه را وارد نمایند	به ازای تحقق ۱۰ درصد همه کارزارش مدارک	۴	آزمون ایمی مخصوص ۸ ساعته (سازمان علی فلاحون گزار) کارکل قبل از شروع به کار	۱۲	
نحوه را وارد نمایند	در صورت تحقق ۱۰ درصد همه کارزارش مدارک	۴	آزمون ایمی مخصوص ۴ ساعته و ارزیابی بررسی	۱۳	
نحوه را وارد نمایند	در صورت تحقق ۱۰ درصد همه کارزارش مدارک	۳	برگزیری، توزیع مفتلت برداشتر و چرخات آزمونی مغلق با برایه مخصوص	۱۴	
نحوه را وارد نمایند	برای آتش های ۱ و ۲ هر کدام ۴ مسمه در نظر گرفته شود	۳	مجزان دوره حاوی آزمونی برگزیر شده سیستم برایه برگزیری شده	۱۵	
نحوه را وارد نمایند	برای آتش های ۱ و ۲ هر کدام ۴ مسمه در نظر گرفته شود	۳	و ضمیخت انجام معتبری، داخلی و رفع عدم اطمینان علی مساهده شده	۱۶	

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOI GOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۹۵ از ۱۹۶

۱۴۰۴ تاپستان

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴

٦- پیوست یک دستور العمل HSE

چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران						دمو گریرس دیجی و الایچ استندیکات	
تاریخ:						D دانشگاه صنعتی اسلامی کرج دانشگاه صنعتی اسلامی کرج دانشگاه صنعتی اسلامی کرج	
نمره را بازه نمایند		گزارشات	۳			دمو گریرس دیجی و الایچ استندیکات	
نمره را بازه نمایند		۱- اتفاقی شغلی با عرضی ملحوظ ۲- مسامعه و زوایای از این اتفاق ۳- درلا یون شرطی طنز ایجاد بررسی و تحلیل بروزه ۴- در جامعه ایجاد این اتفاق و طبقه بندی ۵- اتفاقی شغلی با پرورش پرتوکن	۳		صلاحیت افراد در مسائل مختلف	۱۷	
نمره را بازه نمایند		برای هر آیتم ۳ نمره در نظر گرفته شود				برگزیری و حضور در جلسات مطابق با برنامه صوب و لایحه شده	۱۸
نمره را بازه نمایند		برای عملکرد شرکت در آیتم های ۱، ۲، هرگذرا ۳ نمره و برای آیتم ۴ نمره در نظر گرفته شود	۳			دستیابی به شاخص اعیانی برای ریزی شده مقابله	۱۹
نمره را بازه نمایند		در صورت تحقق اعداء نهادی، ناشی از معرفه یا معرفه نکردن در نظر گرفته شود و برای عدم تحقق عرض ناشی از معرفه نکردن ۳ نمره کسر گرد	۵			طبقه و سوابی مفاظت فردی برای ریزی شده با دوری ایستادن، مارپیچ رملی	۲۰
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱، ۲ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۴			و خدمت برآورده و اخذ گواهی، نایابت مدیر برای ملحقین الات و محیطین برآورده هدایت PPE بوسیله شده، مارپیچ متعاقبان	۲۱
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۳ و ۴ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۵			و خدمت برآورده و اخذ گواهی، نایابت مدیر برای ملحقین الات و محیطین برآورده هدایت PPE بوسیله شده، مارپیچ متعاقبان	۲۲
نمره را بازه نمایند		۱- اخراج گواهی ملحقات معمولی زبان ۲- موجو شرطی طنز و تحویل ملحوظ ۳- تکمیل چک ملحوظ ۴- رفع ملحوظ ها				و خدمت برآورده و اخذ گواهی، نایابت مدیر برای ریزی شده ملحقات	۲۳
نمره را بازه نمایند		برای هر آیتم ۱ مقدار ۵ نمره در نظر گرفته شود				و خدمت برآورده و اخذ گواهی، نایابت مدیر برای ریزی شده ملحقات	۲۴
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۲ و ۳ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۴			اصول HSE بر اینباره.	۲۵
نمره را بازه نمایند		۱- انداره گیری، عوامل زبان اور میجنت کار ۲- تکمیل چک کار کشسانی ملحوظات [SA] ۳- رعایتات مارپیچ رملی ۴- اخراج گواهی ۵- انجام اتفاقات اصلیانه لازم				و خدمت برآورده و اخذ گواهی، نایابت مدیر برای ریزی شده ملحقات	۲۶
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱، ۲ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۳			اهمیت اثمار مکترونیکی، همکاری، شیوه ای و تکنیکی اب اندیشه	۲۷
نمره را بازه نمایند		۱- اخراج گواهی ملحقات ایجاد شده ۲- تکمیل چک ملحوظ ۳- انتقال انداره گیری و ازدحام های روزی و غیری	۴			و خدمت بهداشتی نهادی و غیری عنا	۲۸
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۳ و ۴ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود				و خدمت اقدامات انجام شده چهت پیشگیری از گیرمزدگی و مرما	۲۹
نمره را بازه نمایند		۱- انداره گیری ملحقات ایجاد شده ۲- تکمیل چک ملحوظ ۳- انتقال انداره گیری و ازدحام های روزی و غیری	۴			و خدمت اقدامات انجام شده چهت پیشگیری از گیرمزدگی و مرما	۳۰
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱، ۲ هرگذرا ۳ نمره و برای آیتم های ۳ و ۴ هرگذرا ۳ نمره یعنی برای آیتم های ۱، ۲ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۵			منظور بر صدور و اخراجی، صحنی محروم های کاری، (پریست، گارت فرم و ...)	۳۱
نمره را بازه نمایند		۱- انداره گیری ملحقات ایجاد شده ۲- تکمیل چک ملحوظ ۳- انتقال انداره گیری و ازدحام های روزی و غیری				و خدمت بهداشتی نهادی و غیری	۳۲
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱ مقدار ۴ نمره و برای آیتم های ۳ نمره در نظر گرفته شود	۵			و خدمت اقدامات انجام شده چهت پیشگیری از گیرمزدگی و مرما	۳۳
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱، ۲ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۵			انجام میقات شغلی کارکنان (ادوار، آی و بدو استخدام و مردمی)	۳۴
نمره را بازه نمایند		۱- انداره گیری ملحقات ایجاد شده ۲- تکمیل چک ملحوظ ۳- انتقال انداره گیری و ازدحام های روزی و غیری				اندازه گیری، عوامل زبان اور میجنت کار و رفع ملحوظ ها	۳۵
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱ مقدار ۴ نمره و برای آیتم های ۳ نمره در نظر گرفته شود	۵			درصد کارکنان که در میقات شغلی داروی محدودیت شغلی دارد و افتاده کشتر ایصال شده	۳۶
نمره را بازه نمایند		۱- انداره گیری ملحقات ایجاد شده ۲- تکمیل چک ملحوظ ۳- انتقال انداره گیری و ازدحام های روزی و غیری	۳			و خدمت بهداشتی و ملحقین ایصال مول مددغی، اب اندیشه و ملحقین بیمه‌داری ای اعا	۳۷
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱، ۲ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۳			و خدمت امنیت عمومی شامل مشکل، غذایی، رسویش بهداشتی، طهارتی، محیطی و علمی و گذاری	۳۸
نمره را بازه نمایند		برای آیتم های ۱، ۲ هرگذرا ۳ نمره در نظر گرفته شود	۳			جهوی دفعه زباله، پسماند و نایابی (نایابی، شیوه ای و ...)	۳۹

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۹۵ از ۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

نحوه راورد نمایند		چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران				
برای، آتش های ۱ و ۲ و ۳ مقدار ۳ متره، برای آتش ۴ مقدار ۴ متره		۱- گزارشات باری ۲- تکمیل یک است یافته بازرس ۳- آخذ آلاتی، تجزیه و تحلیل و لازمه تابع ۴- مدیریت سیاست مدل سازی	۳	وضیت بیان مایع صستی، شیلیانی و اسلائی	۲۵	
برای، آتش های ۱ و ۲ و ۳ مقدار ۳ متره، برای آتش ۴ مقدار ۴ متره		۱- گزارشات باری ۲- تکمیل یک است یافته بازرس ۳- آخذ آلاتی، تجزیه و تحلیل و لازمه تابع ۴- مدیریت آزادیه یافته هوارد مدل سازی	۳	الودگی، غواصی از امتحانی علیق و با انتشار سایر ایامنه ها (گرد و غبار و ...) به هوا	۲۶	
برای، آتش های شناسه ۱ و ۲ مقدار ۴ متره و برای، آتش ۳ متر ۴ متره در نظر گرفته شود		۱- ارسال است یافته بازرس ۲- درست و دقیق بازرس ۳- درصد تحقق اجزای مذکور از ایامنه مجموع	۳	چکوگنی دوون و اجرای برآمده مدون چهت همکر و مشهدی	۲۷	
برای، آتش ۳ متره در نظر گرفته شود		۱- اجرای صحت موردنی مذکول ۲- نهیه شستن از از ۳- پیغام رسانی مطابق ۴- گزارش دهن	۳	درصد تحقق اجزای مذکورها	۲۸	
سایر آتش ۱ مقدار ۴ متره و برای سایر آتش های ۳ متره در نظر گرفته شود		۱- پیغام رسانی و عدم اطمینان ای شناسایی شده ۲- اسلام اندیاد کشتری و اصلاح از	۳	درصد رفع عدم اطمینان و کشتر خطرات شناسایی شده در مذکورها	۲۹	
برای، آتش ۵ متره در نظر گرفته شود		۱- انجام اندیاد اسلامی و پیگیریه ۲- اندیادهای ای جوانات	۵	وضیت کشتری و مدیریت سوقت و شبه حادث	۳۰	
هر مورد اندیادهای بروز نهیه و تحلیل شناسی موردنی مذکول کامل و به ازای		گزارش ملیهای و گزارشات محلی های ازنه شده	۴	درصد تحلیل های انجام شده در رویدادها (طبق مذکور اندیاد)	۳۱	
گزارش ملیهای و گزارشات محلی های ازنه شده		گزارش ملیهای و گزارشات مذکو	۴	محوه دلت، اطلاع رسی و گزارش دهن در مخصوص رویدادها	۳۲	
به ازای حقیق - ۱- درصد شاهمندی موره ایله و به ازای هر ۵ درصد اعزام مقدار یک متره کسر گرد		۱- آغاز گزارش ملیهای ۲- گزارشات ماعله ۳- قرم بر پرمه های دانشی ها	۵	تحقیق شاهمندی ماعله ایله مذکوت (FR, SR)	۳۳	
جداول تکمیل گردند		جمع کل اشتراک گشته شده				
جداول تکمیل گردند		داده انتشار گلایف ایلیست ایلی دخول				
جداول تکمیل گردند		داده آتش های رایج شده				
جداول تکمیل گردند		داده آتش های جوین گلایف				
جداول تکمیل گردند		ارصد اشتراک گشته شده				
جداول تکمیل گردند		مشجعه				

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۹۶ از ۹۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
G.I.S.D CO.

عنوان مستند: دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE

سطح محترمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
WI۱۲۷۸	۹۹/۱۰/۲۳		۰۱

امضا	تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی	توضیح
		رئیس ایمنی فنی و فرآیندها	بهرام کلانتری	نیزه بکننده
		روس امیری مقدم	رسول امیری مقدم	نیزه بکننده
		مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست	نیزه بکننده
		اصغر حیدری	مدیر سیستم ها و برنامه ریزی	نیزه بکننده
		محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	نیزه بکننده
		حجت نجمی نیا	مدیر عامل	نیزه بکننده

هر گونه بهره برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۹۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۱۲۷۸	کد مدرک	دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محرومانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D Co.
..	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE

ردیف	شماره تجدیدنظر	تاریخ تجدیدنظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تغییر در جدول جرائم - اضافه شدن پیوست جدول درصد افزایش مبالغ برای سال های متولی - اضافه شدن بند ۷.۶ و ۷.۴

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	کلیه واحد ها

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۹۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W1 ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل انجام موارد ذیل می باشد:

- تشرییح نحوه تشویق و تنبیه کارکنان، پیمانکاران (در نقش شرکا تجاری) در خصوص موارد HSE
- کنترل مداوم جریان امور و استقرار چرخه مدیریت HSE
- شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه بهداشت ایمنی و محیط زیست و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها.
- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی.
- تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد.
- ارتقای سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران.
- همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی های شرکت در زمینه بهداشتی، ایمنی و محیط زیست.

۲- دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این دستورالعمل برای کلیه پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، پیمانکاران و شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می باشد.

۳- تعاریف

- انضباط (Discipline): انضباط به صورت قوانینی معنی می شود که بایستی اطاعت شوند و تخطی از آن مجازات، تنبیه و جریمه را به دنبال دارد. انضباط کاری یکی از اصول بنیادی ایمنی است.
- تخلف: هر گونه کوتاهی در انجام امور مرتبط با HSE، عدم رعایت دستورالعمل های HSE که احتمال ایجاد خطر با هر گونه حادثه را افزایش دهد تخلف نامیده می شود.

۴- مراجع و مأخذ

- ندارد

۵- مسئولیت و اختیار

- مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.
- مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.

۶- منابع موردنیاز:

مطلوب شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP12-20-23

۶,۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطلوب شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP12-20-23

۶,۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP12-20-23 و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۹۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11 ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبيه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷- نحوه اجرا

- مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست طی نامه ای به صورت ماهانه لیست اسامی پرسنل متخلوف با ذکر نوع تخلف و مبلغ جریمه را تهیه و به واحد مالی جهت اعمال ارسال می نماید.

نکته ۱: جریمه های متخلوف مربوط به پیمانکاران در صورت وضعیت ماه جاری اعمال میگردد.

۷/۱- انواع مصادیق بازدارنده مربوط به حوزه آتش نشانی

۷-۱-۱- تخلیه عمدى کپسول های اطفاء حریق

- تخلیه محتويات کپسول های اطفاء حریق در مواردی غیر از اطفاء حریق.
- چنانچه کپسول های اطفاء حریق های جزوی مصرف شود و تا ۳۰ دقیقه پس از اطفاء حریق به واحد آتش نشانی اعلام نگردد نیز جز تخلیه عمدى محسوب می شود.
- محاسبه جریمه نقدي تخلیه عمدى کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدى سیلندر اطفاء پودر و گاز (۳، ۲۵، ۶۰، ۵۰ کیلوگرمی)	۸ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر
تخلیه عمدى سیلندر اطفاء CO ₂ (۳۰، ۶۰ کیلوگرمی)	۶ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر

۷-۱-۲- تخریب، مفقودی و جا به جایی کپسول های اطفاء حریق

- تخریب: به معنای آسیب رساندن به جز یا اجزای کپسول های اطفاء حریق می باشد.
- تخریب ۵۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق آسیب ندیده باشد، تخریب ۵۰ درصدی کپسول محسوب می شود.
- تخریب ۱۰۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق دچار آسیب دیدگی یا سوائح شدگی شده باشد، تخریب ۱۰۰ درصدی محسوب می شود.
- جا به جایی: به معنای جا به جایی کپسول های اطفاء حریق از محل های که گذاری شده می باشد.
- مفقودی: به عدم قرارگیری و مفقود شدن کپسول های اطفاء حریق در جایگاه های تعیین شده در هنگام بازرسی می باشد.
- محاسبه جریمه نقدي آسیب به کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدى سیلندر اطفاء حریق دستی (عدم آسیب دیدگی بدنه سیلندر)	۵ برابر قیمت به روز سیلندر
تخلیه عمدى سیلندر اطفاء حریق دستی (تخریب و آسیب دیدگی بدنه سیلندر)	۶ برابر قیمت به روز سیلندر
جا به جایی سیلندر اطفاء حریق دستی	۳ برابر قیمت به روز سیلندر
مفکودی سیلندر اطفاء حریق دستی	۸ برابر قیمت به روز سیلندر

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۰۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
WII ۲۸۷	شماره ویرایش ۰۱	

۳-۱-۷- برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی آب از تجهیزات آتش نشانی

- هرگونه برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی و امداد از رینگ آب آتش نشانی که شامل هیدرات ها، هوزریل ها، فایر پاکس ها و علمک های آب آتش نشانی می باشد چنان برداشت غیر مجاز محسوب می شود.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
برداشت غیر مجاز آب از تاسیسات آب آتش نشانی	به ازای هر بار برداشت غیر مجاز مبلغ ۱۵ میلیون ریال

۴-۱-۷- تخریب و آسیب رساندن به سیستم های اعلام و اطفاء اتوماتیک و رینگ آب آتش نشانی:

- سیستم های اعلام حریق اتوماتیک: کلیه سیستم های اعلام حریق اتوماتیک با نام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- سیستم های اطفاء حریق: کلیه سیستم های گازی، CO₂ و IG^{۵۵} با تمام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- رینگ های آب آتش نشانی: کلیه هیدرات ها، هوزریل ها، فایر پاکس ها، علمک های آب، رینگ های آبی و پمپ خانه ها آب آتش نشانی جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخربیب اجزاء سیستم اعلام حریق اتوماتیک	۸ برابر قیمت تجهیز آسیب دیده
تخربیب اجزاء سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده
تخربیب و مفقودی تجهیزات مربوط به رینگ آب	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده یا مفقود شده

۵-۱-۷- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دستگاه های اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند.

- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دستگاه های اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم هماهنگی های و دریافت مجوز جهت عملیات جوشکاری، نظافت و ... در مجاورت تجهیزات اعلام حریق خودکار	به ازای هر بار عدم هماهنگی جهت عملیات مذکور مبلغ ۱۵ میلیون ریال

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۰۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WII ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۶-۱-۷- ورود بدون مجوز افراد به داخل اتاق های سیلندر CO₂ و IG^{۵۵}

- چنانچه افراد بدون مجوز و هماهنگی با واحد آتش نشانی وارد اتاق های سیلندر CO₂ و IG^{۵۵} شوند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
ورود بدون مجوز به داخل اتاق سیلندرهای اطفاء حریق	به ازای هر بار عدم هماهنگی جهت ورود به اتاق سیلندرها مبلغ ۱۵ میلیون ریال

۶-۱-۷- عدم نظافت اتاق های سیلندر CO₂ و IG^{۵۵}

- نظافت اتاق های سیلندر CO₂ و IG^{۵۵} باید به صورت ماهیانه توسط شرکت ببره بردار با مجوز و هماهنگی واحد آتش نشانی صورت پذیرد و عدم نظافت اتاق های سیلندر CO₂ و IG^{۵۵} جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم نظافت اتاق های سیلندر CO ₂ و IG ^{۵۵}	به ازای هر بار عدم نظافت اتاق های سیلندر مذکور مبلغ ۳۰ میلیون ریال

۶-۱-۷- تخلیه سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک (CO₂, IG^{۵۵})

- تخلیه سیستم های اطفاء گازی اتوماتیک (CO₂, IG^{۵۵}) به مفهوم اقدام به تخلیه سیستم مذکور به دلایل سهوی و عمدى غیر از زمان بروز حریق تلقی می شود که در صورت بروز جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدى سیلندر های سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۴ برابر قیمت به روز شارژ سیلندرهای تخلیه شده

۶-۱-۷- فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی

- فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی به مفهوم وارد و خارج مدار کردن بدون هماهنگی و مجوز واحد آتش نشانی می باشد.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی	به ازای هر بار فعال و یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی مبلغ ۱۵ میلیون ریال

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۰۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۱۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۱	شماره ویرایش		

- ۱۰-۱-۷- مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی

مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی شامل: فابریکس، هوزریل، هایدرانت، شستی های اعلان حریق، دتکتورها، پنل های اعلان و اطفاء حریق، پمپ ها و پکیج های آتش نشانی و ... جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی	به ازای هر مورد مبلغ ۴۵ میلیون ریال

- ۷-۲- انواع تخلفات رانندگی و جریمه تخلف

- مطابق دستورالعمل رانندگی تدافعی به کد WI۱۱۷۵

- ۷-۳- پیمانکاران

- ارزیابی پیمانکاران مطابق دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI۱۰۴۲ انجام می بذیرد.
- علاوه بر ارزیابی فصلی کلیه پیمانکاران مداوم تحت پایش می باشند و در صورت انجام تخلف مطابق با جدول ذیل با ایشان برخورد خواهد شد:

جدول ۱: جرائم HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنا پایش	میزان اهمیت موضوع	ضریب میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	توضیحات
۱	عدم رفع موارد مشاهده شده در بازرگانی HSE طی زمان مقرر به ازای هر مورد	۱- گزارشات بازرگانی ۲- نامه مغایرت ۳- فرم های آنومالی ۴- صورت جلسات ۵- چک لیست	۳	۵۰ میلیون		
۲	مشاهده رفتار نا ایمن (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- فرم های آنومالی ۳- گزارشات Safety Tour ۴- اختلالهای	۲	۵۰ میلیون		
۳	عدم پیگیری آیتم های کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (به ازای هر آیتم از تکرار دوم)	۱- صورت جلسات ۲- گزارشات بازرگانی ۳- حکم کار سیستم پارسه	۵	۱۰۰ میلیون		

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۰۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تحلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضع	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	کد مدرک شماره ویرایش	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	WII ۲۸۷
۱	عدم ارائه صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا ۳۰ آم گل گهر	۱- صورت جلسات	۵	۵۰ میلیون			
۲	عدم ارائه HSE Plan توسط پیمانکار قبل از شروع به کار به ازای هر ماه تأخیر	۱- ارائه HSE Plan ۲- رفع مغایرت های ابلاغی از طرف کارفرما	۵	۱۰۰ میلیون			
۳	عدم ارائه تاییدیه اداره کار برای نیروهای شاغل در بخش ایمنی پیمانکار	۱- گواهینامه صادره از اداره کار	۴	۵۰ میلیون			
۴	عدم جذب نفرات ایمنی طبق دستورالعمل الزامات HSE پیمانکار	۱- نامه معرفی نفرات از طرف پیمانکار ۲- ابلاغیه تایید از طرف کارفرما	۵	۱۰۰ میلیون			
۵	عقد قرار داد با زیر پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی از اداره کار (به ازای هر ماه تأخیر در ارائه تاییدیه)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- ارائه قراردادها ۳- ارائه گواهینامه های مربوطه	۵	۲۰۰ میلیون			
۶	عدم ارائه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار از اداره کار (به ازای هر ماه تأخیر)	۱- ارائه گواهینامه صادره از اداره کار	۵	۳۰۰ میلیون			
۷	عدم گزارش حوادث مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده مدیریت رویداد کارفرما (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بهداری ۲- شکایات پرسنل ۳- مشاهدات بازرگانی	۵	۱۰۰ میلیون			
۸	عدم برگزاری جلسات تحلیل رویداد و عدم حضور مستولین پیمانکار در جلسه تحلیل حادثه های منجر به روز از دست رفته	۱- ابلاغیه ها ۲- فرم تحلیل و صورتجلسات	۴	۱۰۰ میلیون			

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۰۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تحلف	مبنای پایش	موضوع	میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	WII ۲۸۷
۱۲	عدم انجام اقدامات اصلاحی خروجی از جلسه بررسی و تحلیل حادثه (به ازای هر مورد)	۱- فرم تحلیل و صورت جلسه ۲- گزارشات بازرگانی	۴	۱۰۰ میلیون	توضیحات سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	شماره ویرایش	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	کد مدرک
۱۳	عدم دستیابی به شاخص کمی برنامه ریزی شده ماهیانه (به ازای نفر ساعت)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- گزارشات ماهیانه ۳- فرم برنامه ها و شاخص ها	۵	۱۰۰ میلیون				
۱۴	عدم تعطیق وسائل حفاظت فردی توزیع شده با ماتریس زمانی تحویل PPE تصویب شده	۱- ماتریس زمانی ۲- فرمهای تحویل توسط اینبار ۳- مشاهدات سایت ۴- گزارشات و شکایات	۴	۸۰ میلیون				
۱۵	عدم نظارت بر حسن استفاده از لوله حفاظت فردی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ANO ۲- فرم های	۴	۸۰ میلیون				
۱۶	عدم آموزش ایمنی عمومی ساعته (سازمان های قانون گزار) کارکنان قبل از شروع به کار (به ازای هر مورد)	۱- لیست پرسنلی ۲- مجوزهای ورود ۳- فرم های آموزشی ۴- گزارشات بازرگانی	۴	۵۰ میلیون				
۱۷	عدم آموزش ایمنی عمومی ۴۰ ساعته و ارزیابی رسیک ۱۶ ساعته برای پرسنل HSE (به ازای هر مورد)	۱- گواهینامه های صادر شده	۴	۸۰ میلیون				
۱۸	عدم انجام آموزش های تخصصی ایمنی طبق تقویم آموزشی تصویب شده (به ازای هر مورد)	۱- تقویم آموزشی ۲- مستندات آموزشی	۴	۵۰ میلیون				
۱۹	عدم نظارت بر اجرای صحیح مجوزهای کاری (پرمیت، کارت قرمز و ...) (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- مجوزهای صادره ۳- تطابق مستندات و اجرا	۵	۱۰۰ میلیون				

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۰۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تحلف	مبنای پایش	موضوع	میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	توضیحات	کد مدرک	HSE دستور العمل تشویق و تنبیه (سطح محروم‌انگی؛ عادی)	WII ۲۸۷
۲۰	به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مشاغل مختلف (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی توسط کارفرما ۳- استانداردهای اینمنی مشاغل شرایط احراز صلاحیت کارکنان پیمانکار ۴- مندرجات پرونده پژوهشی	۳	۰.۸ میلیون					
۲۱	به کارگیری ماشین آلات فاقد صلاحیت اینمنی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی کارفرما ۳- استانداردهای اینمنی ماشین آلات ۴- چک لیست های بازرسی	۴	۰.۱ میلیون					
۲۲	عدم انجام معاینات شغلی کارکنان (دوره ای و بدو استخدام) (به ازای هر نفر)	۱- مجوزهای ورود ۲- فهرست پرسنلی ۳- پرونده پژوهشی	۵	۰.۰۵ میلیون					
۲۳	عدم انجام پیگیری و اعمال اقدامات کنترلی برای کارکنایی که در معاینات ادواری دارای محدودیت شغلی شده اند (هرمورد)	۱- مشخص نمودن لیست افراد مشروط ۲- ارجاع جهت انجام اقدامات لازم ۳- نتایج اقدامات انجام شده	۴	۰.۰۸ میلیون					
۲۴	به کارگیری افراد در شرایطی مغایر در مندرجات پرونده پژوهشی (به ازای هر مورد)	۱- فهرست پرسنلی ۲- لیست افراد مشروط ۳- مشاهدات سایتهای ۴- شکایات	۳	۰.۰۸ میلیون					
۲۵	استفاده از تجهیزات غیر مجاز جهت حمل مواد غذایی، آب آشامیدنی و همچنین نگهداری آن ها	۱- گزارشات بازرسی ۲- چک لیست های بهداشتی	۳	۰.۰۸ میلیون					
۲۶	عدم انطباق کلر باقی مانده آب آشامیدنی با استاندارد و عدم انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی	۱- گزارشات کلر سنگی ۲- استانداردهای صلح و بین المللی	۴	۰.۰۵ میلیون					

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۰۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تحلف	مبنای پایش	موضوع	میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	کد مدرک	HSE دستور العمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WII ۲۸۷
۲۷	نامناسب بودن و غیر بهداشتی بودن اماكن عمومي شامل رختكن، غذاخورى، سرويس بهداشتى، خوايجاه و ...	۱- چك ليست هاي بازرسى بهداشتى ۲- استانداردها و قوانين ملي و بين المللی ۳- ليست نفرات	ضريب	۴	۵میلیون	۰۱	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.	
۲۸	عدم رعایت نظافت و چیدمان کارگاهي House Keeping	۱- گزارشات بازرسى	میزان اهمیت	۲	۸میلیون			
۲۹	عدم جمع آوری ضایعات و محوطه کارگاهی پس از اتمام قرار داد	۱- گزارشات بازرسى ۲- مفاد قرار داد	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	۴	۲۰۰میلیون			
۳۰	دفع غير صحيح پسماند و ضایعات	۱- گزارشات بازرسى	میزان اهمیت	۳	۵میلیون			
۳۱	برآکندگی مواد نفتی، روغن و گریس در محیط	۱- گزارشات بازرسى	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	۳	۵میلیون			
۳۲	تخلیه غیر مجاز پساب های صنعتی و انسانی به محیط	۱- گزارشات بازرسى	میزان اهمیت	۳	۸میلیون			
۳۳	آلودگی هوا ناشی از احتراق ناقص و یا انتشار سایر آلاینده ها (گرد و غبار و ...) به هوا	۱- گزارشات بازرسى	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	۴	۵میلیون			
۳۴	تخلیه مواد شیمیایی و یا مواد غیر مجاز به شبکه ها و کانال های جمع آوری پساب	۱- گزارشات بازرسى	میزان اهمیت	۴	۱۰۰میلیون			
۳۵	عدم انجام به موقع و صحیح شناسایی و ارزیابی خطرات فعالیت ها / عدم پیگیری رفع اقدامات کنترلی تعریف شده و مغایرت ها (هرمورد)	۱- تکمیل فرم شناسایی و ارزیابی خططر ۲- بروز رسانی در موعد مقرر ۳- شناسایی تمامی ریسک ها ۴- اتخاذ اقدامات کنترلی مناسب ۵- انجام اقدامات کنترلی و کاهش ریسک	میزان اهمیت	۵	۱۰۰میلیون			

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۰۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تحلف	مبنای پایش	میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	WII ۲۸۷
۳۶	عدم برگزاری TBM ، توزیع پمپلت، بروشور جزوات اموزشی مطابق با برنامه مصوب	۱- گزارش ماهیانه ۲- بازدید ۳- گزارش	ضریب میزان اهمیت موضوع	۰.۵میلیون	۰۱	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)
۳۷	عدم انجام ممیزی داخلی و پیگیری جهت رفع عدم انطباق های مشاهده شده	۱- انجام ممیزی داخلی طبق برنامه ۲- تهیه گزارش کامل ممیزی ۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها	ضریب میزان اهمیت موضوع	۰.۵میلیون	۳	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)
۳۸	عدم برگزاری و حضور در جلسات مطابق با برنامه مصوب و ابلاغ شده	۱- برگزاری جلسات مورد نیاز ۲- حضور مستولین مربوطه در جلسات ۳- پیگیری مصوبات جلسات	ضریب میزان اهمیت موضوع	۰.۵میلیون	۳	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)
۳۹	عدم رعایت اصول در انتبار داری (هرمورد)	۱- نحوه تفکیک وسائل ۲- طبقه و قفسه بندی مناسب ۳- نصب برگه اطلاعات ۴- آمار و اطلاعات دقیق اینبارداری ۵- رعایت اصول اینبارداری ۶- گذراندن آموزش های لازم ۷- آشنایی با نحوه اطفاء حریق دستی	ضریب میزان اهمیت موضوع	۰.۵میلیون	۳	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)
۴۰	وضعیت نامناسب بهداشتی تهیه و توزیع غذا	۱- نتایج اندازه گیری و آزمایشات و بازدیدها ۲- آمار مسمومیت غذایی	ضریب میزان اهمیت موضوع	۰.۵میلیون	۴	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)
۴۱	عدم انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از گرمایشگی و سرما	۱- توزیع البسه مناسب فصل ۲- توزیع نوشیدنی های مناسب فصل ۳- تعویض شیفت های کاری به صورت چرخشی ۴- تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز	ضریب میزان اهمیت موضوع	۰.۵میلیون	۳	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)
۴۲	عدم اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و پیگیری جهت رفع مغایرت ها	۱- اندازه گیری توسط شرکت ذیصلاح ۲- ارائه گزارش	ضریب میزان اهمیت موضوع	۰.۵میلیون	۴	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۰۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	موضوع	مبنای پایش	شرح تحلف	G.I.S.D.Co.	HSE دستور العمل تشویق و تنبيه (سطح محترمانگی: عادي)	کد مدرک	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	WI ۲۸۷
۱	شماره ویرایش							
۳	۵میلیون	۳	۱- تهیه لیست پانچ ها ۲- ارسال لیست پانچ ها به واحد مربوطه ۳- درصد رفع پانچ ها	عدم تدوین و اجرایی برنامه مدون جهت تعییر و نگهداری	۴۳			
۴	۸میلیون	۴	۱- درصد تحقق اجرای مانورها بر اساس تقویم مصوب شده ۲- اجرای صحیح مانور بدون مشکل ۳- تهیه مستندات لازم ۴- پیگیری نقاط ضعف ۵- گزارش دهی	عدم تحقق اجرای مانورها طبق تقویم مصوب	۴۴			
۳	۵میلیون	۳	۱- انجام ارزیابی ریسک مانورها ۲- پیگیری جهت رفع عدم انطباق های شناسایی شده ۳- انجام اقدامات کنترلی و اصلاحی لازم	عدم پیگیری و رفع مغایرت ها و نقاط ضعف و خطرات شناسایی شده در مانورها	۴۵			

تذکرہ: میزان درصد مربوط به تحالف برای بار اول مطابق با جدول فوق می باشد.

تذکرہ: لازم به ذکر است در صورت تکرار برای بار دوم به میزان یک و نیم برابر بار اول و بار سوم به میزان دو برابر بار اول می باشد و در صورت تکرار پیمانکار در لیست سیاه قرار می گیرد.

۴- تشویق و تنبيه بر اساس عملکرد ماهانه پیمانکار

مطابق با جک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد FO ۱۰۴۳ و همچنین شاخص های فرآیندی حوزه HSE که به صورت مستمر تکمیل و آنالیز می گردد، با توجه به امتیاز اخذ شده توسط پیمانکار، مطابق جداول زیر اقدام می گردد:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۰۹ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WII ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

جدول ۲: عملکرد پیمانکار در ارزیابی عملکرد و نحوه واکنش

ردیف	امتیاز	نحوه واکنش
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمنی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار می‌تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می‌باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جریمه لحظه می‌گردد.
۴	۲۰-۳۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحظه می‌گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیرکل گاه جایگزین است.
۵	۰-۱۹	اعلام عدم صلاحیت اینمنی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جریمه

جدول ۳: عملکرد پیمانکار در شاخص های فرآیندی و نحوه واکنش

ردیف	امتیاز عملکرد	امتیاز کلی	امتیاز مربوط به هر شاخص	نحوه واکنش
۱	۱۰-۸	۱۰-۸	۱۰-۸	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمنی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار می‌تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۸-۷	۸-۷	۸-۷	عملکرد پیمانکار در حد متوسط می‌باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۷-۵	۷-۵	۷-۵	عملکرد پیمانکار ضعیف بوده و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد. (در صورتی که امتیاز کلی عملکرد شرکت در سه دوره متوالی در این بازه قرار گیرد بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحظه می‌گردد) در خصوص امتیاز مربوط به هر شاخص این بازه جریمه ای لحظه نخواهد شد.
۴	۵-۱	۵-۱	۵-۱	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحظه می‌گردد و برای امتیاز مربوط به هر شاخص در صورت تکرار دو دوره متوالی جریمه مناسب با آن شاخص لحظه خواهد شد.
۵	۱-۰	۱-۰	۱-۰	در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد اعلام عدم صلاحیت اینمنی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۱۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	HSE دستور العمل تشویق و تنبیه	شماره ویرایش	نحوه اعمال
WI1 ۲۸۷	(سطح محروم‌انگی؛ عادی)	۱	نظر گرفتن بالاترین ضریب جریمه. در صورتی که امتیاز هر شاخص در این بازه قرار گیرد جریمه مناسب با آن شاخص لحاظ خواهد شد.

۷-۵-۷- پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد و پیمانکاران

۱- مقررات تنبیه‌ی

۱،۱،۵،۷- موارد تنبیه‌ی:

هرگونه سریچی از قوانین و مقررات ایمنی و شامل مقررات تنبیه‌ی میگردد که انواع آن به شرح ذیل می‌باشد:

- کلیه خطاهای و اشتباهاتی که منجر به نقض دستورات اضباطی در محیط کار می‌شود اعم از مواردی که منجر به کاهش ضریب ایمنی، کاهش سطح بهداشت روانی و بهداشت شغلی افراد و صدمه به محیط زیست شود.
- رفتار غایر با شیوه‌های اخلاقی و انسانی در محیط کار با همکاران استعمال دخانیات در محل های ممنوع و یا مکان های عمومی که موجب آسیب به سایرین شود مانند خوابگاه های عمومی، اتاق محل کار و ...
- انجام سرخود و بدون هماهنگی اموری که نیاز به اخذ مجوز از واحد ایمنی دارد.
- ابزار ضرب و جرح، فحاشی ارتکاب اعمالی در محیط کار که منجر به اغتشاش، به هم خوردن نظم و ایجاد جو ناسالم گردد.
- عدم استفاده صحیح و منظم از وسائل حفاظت فردی و عمومی به خصوص مشاغل پر خطر
- قصور و کوتاهی در نظافت و یا حفظ لوازم کار و ابزار حفاظتی
- عدم شرکت در جلسات توجیهی و کلاس های ایمنی و بهداشت
- عدم مراجعه به موقع در معاینات پزشکی اداری
- عدم رعایت اصول ایمنی بهداشت و حفاظت کار
- تغییر و یا تخریب وسائل حفاظتی، تخریب وسائل و ابزار کار، آسیب زدن به تجهیزات و ماشین آلات و اموال شرکت
- تخریب و آودگی عدی و یا سهی محیط زیست
- عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی اعم از لباس کار، وضعی نظافت ظاهری و نظم در محیط کار
- عدم اجرای دستورات و الزامات ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت فردی
- سهی انگاری، بی دقیقی در انجام کارهایی که نیاز به دقت و حوصله و ایمنی کامل دارد
- کار در شرایط نا ایمن بدون استفاده از ملزمات ایمنی و بدون توجه به ایمنی پرسنل اطراف

۱،۱،۵،۷- اقدامات تنبیه‌ی

در خصوص این قبیل تخلفات مدیریت HSE اقدامات زیر را به انجام خواهد رسانید.

- تخلف برای بار اول تذکر شفاهی و ارشاد و راهنمایی در جلسات کوتاه ایمنی
- تخلف برای بار دوم اخطار کننی و اخذ تعهد عدم تکرار
- تخلف برای بار سوم جرایم نقدی و کسر از مزایای انگیزشی پرسنل خاطی
- تخلفاتی که می‌تواند منجر به فوت یک نفر و یا تعدادی از پرسنل گردد تعلیق و یا حتی در موارد جدی فسخ قرارداد و اخراج مطابق ماده ۲۷ قانون کار و یا اقداماتی که با صلاحیت و نظر مدیریت ارشد، رفتار خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۱۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11 ۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبيه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷.۱.۳ مقررات تشویقی:

به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و نیز تشویق پرسنل برتر، با نظر کارشناسان ایمنی نفراتی که در طول ماه کلیه قوانین ایمنی و سایتی را رعایت نموده باشند (اعم از پیمانکار و یا نیروهای شرکت) انتخاب و با نظر مدیریت واحد HSE تشویق می گردد.

۷.۱.۴ موارد تشویقی:

مواردی که در معرفی پرسنل جهت تشویق قابل طرح می باشد:

- انتخاب برترین های ایمنی بر اساس شاخص های عملکردی واحد ایمنی و در راستای محقق شدن اهداف آن
- همکاری فعال در گزارش موقعيت های نا ایمن به کارشناسان ایمنی
- ارائه راهکار جهت انجام ایمن کارها
- ارائه راهکار در خصوص رفع موقعيت های نا ایمن
- بر اساس شاخص هایی که بصورت دوره ای توسط واحد HSE ابلاغ می گردد

تبصره: مقررات تشویقی می تواند شامل مخصوصی های تشویقی بنا به صلاحیت مدیریت، پاداش های نقدی، غیر نقدی و اضافه کاری تشویقی و معرفی پرسنل به سایر همکاران و ارائه لوح تقدیر و امثال آنها و یا اعزام همکاران به سفرهای زیارتی و سیاحتی باشد.

۷.۱.۵ اقدامات تشویقی:

چنانچه هر یک از پرسنل شرکت در انجام امور محله آنچنان کوشاند که فضای ایمن برای خود و سایر ذینفعان سازمان را فراهم آورند، موجبات تعالی جسم و روح کلیه پرسنل، ایجاد نظم در امور، ایجاد حسن شهرت و رشد بهره وری شرکت شوند و یا با اقدام مناسب از وجود هرگونه الایندگی پیشگیری نمایند. پیشنهاد تشویق و تنبيه به شرح جدول زیر ارائه می شود و با تایید مدیر HSE پرسنل مورد تنبیه و یا تشویق قرار می گیرند.

گروه افراد	نمره ارزیابی	شرح تشویق	پیشنهاد دهنده	تایید کننده
پرسنل توزیع و آهن و فولاد گهر	۱۲۰-۶۰	تشویق درجه ۱	سربرست ایمنی	مدیریت HSE ایمنی و آتش نشانی
	۲۴۰-۱۲۱	تشویق درجه ۲	سربرست ایمنی	مدیریت HSE ایمنی و آتش نشانی
	۲۰۰ - ۲۴۱	تشویق درجه ۳	سربرست ایمنی	مدیریت HSE ایمنی و آتش نشانی
مدیریت ایمنی و آتش نشانی	بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE یا رئیس ایمنی و آتش نشانی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کنیتی با درج در پرونده و یا معرفی بعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر با تندیس، پاداش مناسب تقاضی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	HSE مدیریت
	بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE یا رئیس ایمنی و آتش نشانی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کنیتی با درج در پرونده و یا معرفی بعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر با تندیس، پاداش مناسب تقاضی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	HSE مدیریت

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)



گل گهر فولاد آهن توسعه شرکت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

۶- پیوست یک دستور العمل HSE شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴/۰۷-ق تابستان ۱۴۰۴ صفحه ۱۱۲ از ۱۹۵

کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محرومانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D Co		
WI۱۲۸۷				
تایید کننده	پیشنهاد دهنده	شرح تشویق	نمره ارزیابی	گروه افراد
مدیریت HSE اریس ایمنی و آتش نشانی	سروبرست ایمنی	بسنمه به نتایج ارزیابی و نوع اقدام در مهار حوادث و یا کاهش ضربی حوادث در شرکت ف تامه تشویق برای شرکت پیمانکار ارسال خواهد شد تا بر اساس قوانین داخلی پیمانکار تشویق اعمال گردد و یا در صورت صلاحیت مدیریت HSE تشویق اعمال می گردد	بر اساس نتایج ارزیابی پیمانکاران و پرسنل توسط بازرسان ایمنی	بُندازکار

کلیه تشویقات سازمان با پیشنهاد نفرات ذی ربط و تاییدیه های لازم قابل اجراست که به درجات زیر تقسیم می شود:

- تشویقات درجه ۳: شامل اعطای لوح تقدیر یا تقدیر کتبی، درج در تابلو اعلانات و پرونده پرسنلی فرد و در صورت نیاز اعلام در حضور همکاران، بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده مخصوصی روزانه تشویقی.
 - تشویقات درجه ۲: بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده، این نوع تشویق شامل: مخصوصی تشویقی روزانه، اعطای جواز اینمنی و تندیس و درج در تابلو اعلانات
 - تشویقات درجه ۱: بنا به نوع ارزیابی اعطای جایز اینمنی تندیس، اعطای جواز نقدی بنا به تشخیص مدیریت و درج در تابلو اعلانات شرکت.

مشکل معرفی شده و از طرف مدیران مورد تشویق، تقدیم قرار می‌گیرد.

تبصره: ارزیابی ها بر اساس سوالات چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO ۱۲۸۰ جهت تشویق مطابق جدول فوق انجام می گیرد. امتیازات بر اساس ضریب اهمیت هر سوال محاسبه می شود. لازم به ذکر است آتم ها می توانند بر اساس اهداف ماهیانه تعریف کنند.

تبصره ۲: رعایت کلیه ضوابط اینمنی جزء الزامات شرکت بوده، تبعیت از قوانین، روش های اجرایی، دستورالعمل و استاندارد های معمولی، مقرنه کار و سنتهاست.

۷- محاسبه مبالغ تشویق و تنفسه برای سال های آینده

سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

سسه آسته زد د. محاسبه د. صد افزایش. مبالغ د. بایان: هرسا. دخیل. هستند:

- درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی
 - درصد افزایش حقوق کارکنان دولت
 - د. صد افزایش حقیقت و ذات کا.

دینی ترتیب با محاسبه میانگین سه آیتم فوق، میزان درصد افزایش مبالغ برای آن سال بدست می آید. در نهایت میزان مبلغ نهایی ایجاد شده با محاسبه مبالغ سالاً یافته و تمام درصد افزایش سالاً ها، میزان اولیه مبلغ را بخواهد.

ف ۵۰۱، محاسبه مبالغ سال‌های آینده:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۱۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محرومگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
WI۱۲۸۷	۰۱ شماره ویرایش	

مقدار تشویق و تنبیه برای سال X = مقدار تشویق و تنبیه سال پایه (۱۴۰۱) + درصد افزایش مبالغ سال X + درصد

افزایش مبالغ سال (X-۱) + درصد افزایش مبالغ سال (X-۲) + درصد افزایش مبالغ سال ۱۴۰۲

برای مثال: در صورتی که مقدار جریمه یک آیتم در سال پایه (۱۴۰۱) به میزان ۱۰۰۰ ریال باشد. و بخواهیم مقدار جریمه آن آیتم در سال ۱۴۰۳ را محاسبه کنیم به صورت زیر اقدام می‌گردد:

مقدار جریمه سال ۱۴۰۳ = مقدار جریمه سال پایه + درصد افزایش سال ۱۴۰۲ + درصد افزایش سال ۱۴۰۳

لازم به ذکر است تمامی این موارد در فایل پیوست (جدول درصد افزایش مبالغ برای سال‌های آینده) آورده شده است.

۸- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد.

۹- مستندات مربوطه

- دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI۱۰۴۲
- دستورالعمل رانندگی تدافعی به کد WI۱۱۷۵

۱۰- پیوست‌ها

- فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد FO۱۰۴۳
- چک لیست ارزیابی عملکرد کارشناسان ایمنی FO۱۲۷۹
- چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO۱۲۸۰
- چک لیست ارزیابی عملکرد HSE مدیران و سرتاسرستان واحد‌ها FO۱۲۸۱
- جدول محاسبه درصد افزایش سالانه مبالغ دستورالعمل تشویق و تنبیه به کد TL۱۹۸۲

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۱۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

جدول محاسبه درصد افزایش مبالغ مستور العمل تضمنی و تبیین				
سال	درصد توجه مبالغ مساله ایکی مهری سال قبل	درصد افزایش حقوق کارکنان بوقت	محاسبه درصد افزایش میرorde	توضیحات
۱۴۰۱	۱	۳۱.۱۷	۳۱.۱۲	برای سال ۱۴۰۲ مبلغ جرمه می باشد مستور العمل می باشند
۱۴۰۲	۲	۳۷	۴۴.۸	برای سال ۱۴۰۳ مبلغ جرمه می باشد مستور العمل می باشند
۱۴۰۳	۳	-	-	-
۱۴۰۴	۴	-	-	-
۱۴۰۵	۵	-	-	-
۱۴۰۶	۶	-	-	-
۱۴۰۷	۷	-	-	-
۱۴۰۸	۸	-	-	-
۱۴۰۹	۹	-	-	-
۱۴۱۰	۱۰	-	-	-

ک. فروردین

ک. فروردین

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۱۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
G.I.S.D Co.

عنوان مستند: دستورالعمل روش ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر
سطح محرومگی(عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
۷۱۲۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
محمدحسین اهراسپ	رئیس ایمنی فنی و فرآیندها

پیوست
کنندگان

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
محمود کورکی	کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها
بهرام کلانتری	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست
مصطفی روستا	مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی
احمدعلی عتیقی	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

تجدد کنندگان

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
حجت نجمی نیا	مدیر عامل

تصویب
کنندگان

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۱۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شماره توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
..	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات	کد مدرک
۱	..		تدوین اولیه سند	..

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۱۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

۱- هدف

هدف از تدوین این سند، کنترل کامل نحوه ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و اقلام موثر بر حوزه HSE می باشد که در راستای کنترل بهتر وضعیت ایمنی تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی سازمان عمل نماید.

۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروره های در دست اجرا می باشد.

۳- تعاریف

شرکت: در این سند منظور از شرکت همان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

۴- مراجع و مأخذ

ندارد

۵- مسئولیت و اختیار

- مسئولیت تهیه و بروزرسانی این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.
- مسئولیت تایید و ابلاغ این سند بر عهده واحد سیستم ها و برنامه ریزی شرکت می باشد.
- مسئولیت نظارت بر اجرایی سازی تمامی مفاد این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می باشد.
- مسئولیت رعایت کامل و پیروی از مفاد این سند بر عهده تمامی کارکنان و شرکت های پیمانکاری و واحد های مختلف سازمان می باشد

۶- منابع موردنیاز:

مطابق شناسنامه فرایند طرح‌بازی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP12-۲۰-۲۳

۶.۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند طرح‌بازی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP12-۲۰-۲۳

۶.۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرح‌بازی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP12-۲۰-۲۳ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۱۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W12148	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

۷- نحوه اجرا

در سایت توسعه آهن و فولاد گهر ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و سایر اقلام موثر بر HSE تحت کنترل و نظارت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می باشد.


۷/۱- ورود و خروج پرسنل

۷-۱-۱- ورود مهمان و بازدید کننده

جهت ورود موقت افراد بازدید کننده یا مهمانان، واحد درخواست کننده لیست افراد را با مشخصات کامل در سامانه جامع ERP در پخش ثبت ملاقات ثبت می نماید. سپس قبل از ورود افراد مذکور به سایت متناسب با نوع درخواست ملاقات ثبت شده (دفتری / عملیاتی) بروشور مختص مهمان و بازدید کنندگان دفتری / عملیاتی که شامل نکات و الزامات ایمنی عمومی جهت ترد در بخش اداری یا عملیاتی این سایت می باشد در اختیار افراد قرار گرفته و در صورت نیاز به ورود به مناطق عملیاتی و بهره برداری وضعیت تجهیزات حفاظت فردی افراد بررسی و اقلام لازم در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

۷-۱-۲- ورود دائم پرسنل

شکل ۱: فلوچارت ورود نفرات

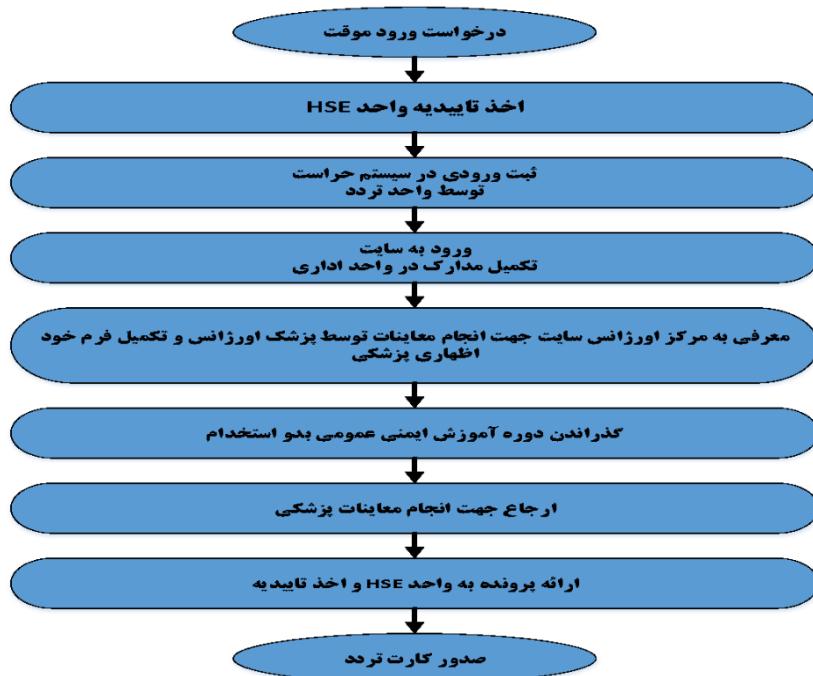

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۱۹ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W12148	کد مدرک	دستورالعمل روش ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

در صورتی که در هر یک از مراحل فوق نقص مدارک یا مشکلی در تایید صلاحیت فرد پیش آید ادامه مراحل کنسل و فرد به بیرون از سایت هدایت خواهد شد.


لازم به ذکر است تمامی افراد دارای مشاغل تخصصی پیمانکاران می باشد علاوه بر مراحل فوق در جلسه مصاحبه (با حضور نماینده کارفرما، مشاور و پیمانکار) تایید صلاحیت تخصصی نیز شرکت و موفق به کسب تاییدیه گردد.

پرسنل HSE جهت استخدام نیازمند شرکت در جلسه مصاحبه و تایید صلاحیت بوده و می باشد شرایط اختصاصی شغل مربوطه که در بند ۷-۲ پخش مربوط به نیروی انسانی روش اجرایی "الزمات HSE پیمانکاران" به شماره PR1961 آمده است را دارد.

۷/۲- ورود و خروج ماشین آلات

الزمات مربوط به تردد ماشین آلات و سایل نقلیه و تجهیزات بالابر و ابزار و تجهیزات می باشد طبق بند ۷-۲-۱-۲ روش اجرایی "الزمات HSE پیمانکاران" به شماره PR1961 و دستورالعمل "ایمنی ترافیک" و ایمنی ماشین آلات به شماره W11191 اجرایی گردد

شکل ۲: فلوچارت ورود و خروج ماشین آلات

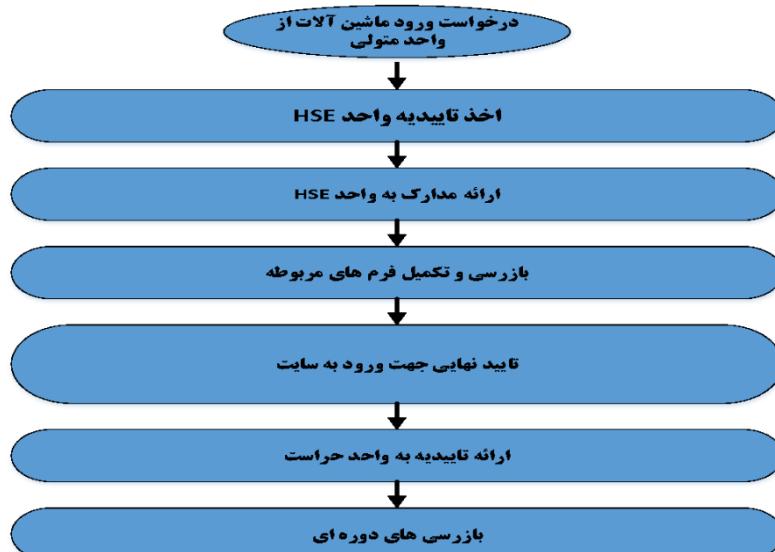

جهت انجام بازرسی و تکمیل فرم های ماشین آلات می باشد طبق دستورالعمل ایمنی ترافیک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام گردد.

- مدارک مورد نیاز جهت ورود و سایل نقلیه

الف) کارت / برگ سند خودرو

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W1۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

ب) گواهی سلامت خودرو

ج) گواهینامه رانندگی به همراه استعلام گواهینامه رانندگی از مراکز پلیس + ۱۰

د) بیمه نامه شخص ثالث خودرو (دارای بودن پوشش بیمه کرایه بیانی برای خودرو های مسافربری)

- کلیه وسائل نقلیه ورودی بایستی مطابق با چک لیست مربوط به خود بررسی و از نظر فنی و ظاهری دارای شرایط مناسب باشند

۷/۳- ورود و خروج سایر اقلام موثر بر HSE

جهت ورود تمامی اقلام موثر بر HSE طبق جدول "لیست اقلام موثر بر HSE" در پیوست می باشد تاییدیه واحد HSE اخذ گردد.

۷-۳- ۱- جرثقیل و تجهیزات باربرداری
جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات باربرداری و جرثقیل هایی باشد طبق دستورالعمل ایمنی باربرداری به شماره W1۱۹۷۱ و همچنین دستورالعمل ایمنی ماشین آلات به شماره W1۱۱۹۱ اقدام گردد.

لازم به ذکر است فقط اقلامی که در "وندور لیست تجهیزات باربرداری" در پیوست آورده شده اند مورد تایید می باشند.

۷-۳- ۲- تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO2144 می باشد مورد تایید هستند.

۷-۳- ۳- تجهیزات مربوط به داربست

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات داربست بندی می باشد طبق دستورالعمل ایمنی داربست بندی به شماره W1۱۹۶۸ اقدام گردد.

۷-۳- ۴- وسائل حفاظت فردی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات حفاظت فردی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO1221 می باشد مورد تایید هستند.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محرومگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

۸- تغییرات

مستویات اعمال هر گونه تغییر و بروزسانی در مراحل و روش اجرای کار در این سند بر عهده مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد

۹- مستندات مربوطه

روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران به شماره PR۱۹۶۱

دستورالعمل ایمنی داربست پندی به شماره WI۱۹۶۸

دستورالعمل ایمنی باربرداری به شماره WI۱۹۷۱

دستورالعمل ایمنی ماشین آلات به شماره WI۱۹۹۱

۱۰- پیوست ها

- وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی FO۱۲۲۱
- وندور لیست تجهیزات آتش نشانی FO۲۱۴۹
- وندور لیست تجهیزات باربرداری FO۲۱۵۰
- لیست اقلام موثر بر HSE FO۲۱۵۱
- تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران FO۱۹۶۲

تجددی مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۲۲ از ۱۶۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات آتش نشانی

دیک توسعه آهن و فولاد گهر
G.I.S.D.Co.

لیست شرکت های سیستم اعلام حریق

ردیف	نام سیستم اعلام حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Fike	آدرس پذیر - متعارف - متعارف هوشمند	UK	LPCB - UL
۲	Apollo	آدرس پذیر - متعارف	UK	LPCB
۳	GFE	آدرس پذیر - متعارف	Portugal	CPR
۴	Hochiki	آدرس پذیر - متعارف	Japan_UK	LPCB - VDSL
۵	Polon-Alfa	آدرس پذیر - متعارف	Poland	LPCB - UL
۶	Nittan	آدرس پذیر - متعارف	UK	-
۷	Jalo Helsinki	آدرس پذیر - متعارف	Finland	-
۸	NSC	آدرس پذیر - متعارف	Germany	VDS - EN

لیست شرکت های سیستم اطفا حریق اتوماتیک

ردیف	نام سیستم اطفا حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Rapidrop	سیستم اطفا حریق آبی	UK	UL
۲	Sefco	سیستم اطفا حریق آبی	Korea	UL
۳	Rotarex	سیستم اطفا حریق گازی	Luxembourg	UL
۴	Betatti	سیستم اطفا حریق گازی	Italy	UL
۵	FirePro	سیستم اطفا حریق آبروسل	Cyprus	UL
۶	Tadbir	سیستم اطفا حریق آبروسل	Iran	-
۷	Hafex	سیستم اطفا حریق آبروسل	Turkey	-
۸	Air fire	سیستم اطفا حریق گازی	Italy	-
۹	Bermad	سیستم اطفا حریق آبی	UK	-

لیست شرکت های سیستم اطفا حریق دستی

ردیف	نام شرکت	بودر و گاز	CO ₂	فوم	آب و گاز	کشور سازنده	تاییدیه
۱	روتاتک گاز خزر	بودر و گاز		فوم	آب و گاز	ایران	-
۲	باپا سیلندر	بودر و گاز		CO ₂	آب و گاز	ایران	-
۳	خزر سیلندر	بودر و گاز		فوم	آب و گاز	ایران	-
۴	آریا	بودر و گاز		-	-	ایران	-
۵	توچال	بودر و گاز		-	-	ایران	-
۶	بیشرو	بودر و گاز		-	-	ایران	-
۷	باران	بودر و گاز		-	-	ایران	-
۸	دز	بودر و گاز		-	-	ایران	-
۹	البرز بیشرو	بودر و گاز		فوم	-	ایران	-

لیست شرکت های بوستر پمپ آتش نشانی و الکتروموتورها و دیزل ژنراتور

ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	فرجام صنعت اینکار	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	-
۲	پمپیران	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	استاندارد ایران
۳	پمپ سازان نبراس	پکیج آتش نشانی	ایران	استاندارد ایران
۴	موتوزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰	ایران	استاندارد ایران
۵	الکتروزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰	ایران	استاندارد ایران

کد مدرک: FO2149

تجددی مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۴۰۴ از ۱۲۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:	وندور لیست تجهیزات آتش نشانی	دستور لیست تجهیزات آتش نشانی
--------	------------------------------	------------------------------

-	Sweden	دیزل پمپ	Volvo Penta	۶
-	UK	دیزل پمپ	Perkins	۷
لیست شرکت های تجهیزات خط آب آتش نشانی شامل هیدرانت، جعبه ها و کوبلینگ ها و ولو ها				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	سد آتش ایرانیان	جعبه های آب آتش نشانی	ایران	-
۲	آریا کولینگ	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها	ایران	-
۳	میراب	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۴	فاراب	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۵	وگ ایران	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۶	آترسان	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدرات	ایران	استاندارد ایران
۷	ایمن تیار	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدرات	ایران	استاندارد ایران
لیست شرکت های تجهیزات F&G				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Scame	F&G Control system	Italy	-
۲	Crowcon	F&G System-Gas Detector	UK	-

توضیحات:

۱- طراحی و اجرای کلیه سیستم های اعلام حریق (متعارف و آدرس پذیر) و اطفاء حریق (آبی، گازی) (دستی و اتوماتیک، رینگ آبی طبق کد و استاندارد های NFPA و دارای استاندارد های ذیل باشد: VDS - LPCB - FM - UL).

کسب تاییدیه از کارفرما بابت طراحی انجام شده، قبل از شروع فرآیند اجرایی الزامی می باشد.

۲- سایر شرکت هایی که در لیست فوق ذکر نگردیده اند با ایستنی در لیست مورد تایید سازمان آتش نشانی (مطابق با به روزترین لیست سازمان)، موجود بوده و دارای استانداردهای بین المللی VDS-UL-LPCB-FM-BS-NFPA باشند و پس از اخذ تاییدیه از کارفرما نسبت به تهیه و تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز اقدام گردد.

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۴ از ۱۲۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات باربرداری



ردیف	نام تجهیز	باربرداری	بلت یا تسمه	۱
	مارک	yall	کشور سازنده	کشور چین
		elephant		کشوره کره
		carlthal		کشور آلمان
		vital		کشور ژاپن
		Hyundai		کشور کره
		bezabala		کشور اسپانیا
		Hamilton		کشور آمریکا
				تمام سایز ها بافت و پرس باشد.
				عرض چشمی سیم بکسل نصف طول چشمی سیم بکسل باشد.
				طول بافت به اندازه طول چشمی باشد.
				مغزی نوع سیم بکسل مطابق با جدول پیوست باشد.
				دارای بافت و پرس باشد.
				هر دو چشمی دارای لاغ باشد.
				سایز سیم بکسل حداقل ۱۰ میلی متر باشد.
				مستر لینک بک تیکه باید و وایر پنجم توسط شگل به مستر لینک متصل شود.
				مشخصات شگل شامل تناز و شرکت سازنده و استاندارد حک شده باشد
				پین شگل تا آخرین رزوه بسته شود و فاقد لقی باشد.
				شگل فاقد دفرمگی و بازشدنگی دهانه باشد.
				مطابق OSHA ۱۹۲۶.۱۰۴
				توانایی تحمل ۵۴۰۰ پوند (حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم) وزن را داشته باشد.
				لایف لاین در حالت عادی، باید از جنس سیم بکسل با مغزی فولادی و حداقل سایز ۸ میلیمتر باشد.
				فاصله پایه های نگهدارنده یا نقاط اتصال یک لایف لاین به تکیه گاه و یا سازه ای متصل شود که که در صورت معلق شدن فرد، بیش از ۲۵٪ طول لایف لاین (در همان پارت) انحنی یا قوس نداشته باشد.
				شش برابر قطر سیم بکسل، فاصله بین کربی ها است و باید دست کم دارای سه عدد کربی باشد. مقدار سفت کردن آن ها باید طوری باشد که لهیدگی به اندازه یک سوم قطر باشد

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۲۵ از ۱۲۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندو ر لیست تجهیزات باربرداری



حالات نسمه	حد مجاز بار برای نسمه دو لایه/دایره ای				
	سلاسل رشته	سدده تک گره متحرک	شعب و زاویه*		
			۰°-۷°	۷°-۴۵°	۴۵°-۶۰°
			ضریب		
			1,0	0,8	2,0
حد مجاز بار	رنگ	mm/عرض	طول/متر	1,4	1,0
1T	بنفش	25	1-10	1000	800
2T	سبز	50	2-10	2000	1600
3T	زرد	75	2-10	3000	2400
4T	طوسی	100	4-10	4000	3200
5T	قرمز	125	4-10	5000	4000
6T	قهوه ای	150	4-10	6000	4800
8T	آبی	200	5-10	8000	6400
10T	نارنجی	250	5-10	10000	8000

** روش دیگر برای تشخیص میزان تناز هر بلت باربرداری خطوط دوخت طولی بر روی بلت می باشد



کد مترک: FO2150.

تجددی مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۲۶ از ۱۲۶

تابستان ۱۴۰۴



شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندو ر لیست تجهیزات باربرداری

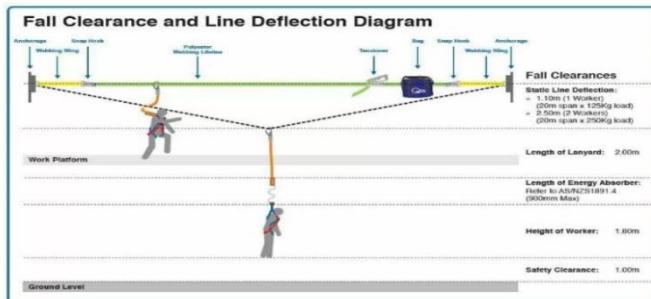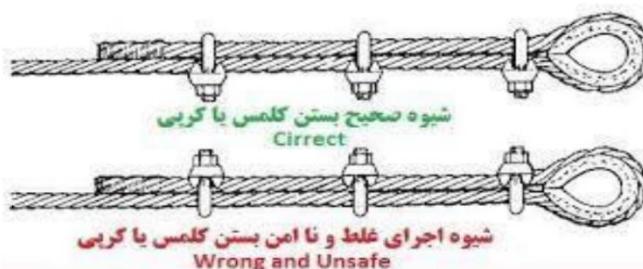

نحوه اتصالات لایف لاین

بازرسی سیم بکسل (تایید/عدم تایید سیم بکسل)

ASME B30.9: سیم بکسل

برای ساخت اسلینگ سیم بکسل از کاتالوگ های ارایه شده که

- توصیه میشود از تیمبول (اشکی) برای دوام حلقه ها استفاده شود

- حداقل طول بین پرس ها باید ۱۰ برابر قطر سیم بکسل باشد

موارد عدم تایید اسلینگ سیم بکسل:

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات سیم بکسل (کارخانه سازنده، ظرفیت مجاز حداقل در حالت عمودی، قطر اسلینگ، تعداد در صورتی که بیش از یک لگ)

- ۱۰ عدد رشته شکسته به طور تصادفی در یک گام یا ۵ عدد رشته شکسته در یک گام

- کاهش قطر اسمی بیش از ۵ درصد حالت اولیه

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۲۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندو ر لیست تجهیزات باربرداری



- هرگونه پیچیدگی ، لهیدگی ، قفس پرنده شدن ، آسیب دمایی

- پرس های ترک خورده ، دفرمه یا فرسودگی و خوردگی بکسل و اتصالات

بازرسی بلت (تایید/ عدم تایید بلت)

بلت ASME B30.9

موارد عدم تایید بلت :

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات بلت (کارخانه سازنده ، شماره سریال یا کد سازنده ، ظرفیت مجاز حداقل در یکی از حالت های باریندی ، ماده سازنده بلت ، تعداد لگ ها در صورتی که بیش از یک لگ)

- هرگونه آسیب دیدگی با اسید ، ذوب شدگی ، سوختگی

- سوراخ شدگی ، بریدگی ، پارگی ، نخ زدگی ، گره خوردگی

- دوخت پاره شده به خصوص در قسمت های چشمی

- ساییدگی ، تغییررنگ نسبت به حالت اولیه

بازرسی شگل (تایید/ عدم تایید شگل)

بلت ASME B30.26: موادر عدم تایید شگل:

- عدم وجود و یا پاک شدگی مشخصات شگل (کارخانه سازنده ، گرید ، متریال ساخته شده یا ظرفیت مجاز) هم بدنه و هم پین هر دو باید دارای مشخصات باشند.

- آسیب گرمابی یا جوشکاری بر روی شگل

- هرگونه ترک ، پیچیدگی ، خوردگی ، شکستگی ، کندگی ، کشیدگی ، دفرمگی و

- سایش ۱۰ درصد از بدنه هوک یا پین نسبت به حالت اولیه

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۲۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



نحوه	واحد	شرح کالا	ردیف	گروه
Kavach KATO SECURA SALSBURY Elsac DPL Regeltex Respirex honeywell (A.S.I.) سایر	جفت	دستکش عالی برق	۱	
Uvex compact Tang Wang Midas گلنان ANSELL مدل ۸۱۰-Hycron-Y7 دستکش ضد مواد نفتی اسل چرم گارد solvex ۶۹۵ دستکش اسل نام نتریبای Kosta A.O. ۵- تمام نتریبای Shunil	جفت	دستکش ضد نفت	۲	محاذطه دست
دستکش نسوز کف دوبل میاس یا بخ نسوز OVER SAFETY HOBART ANSELL J LP -۰۵. MIDAS	جفت	دستکش مخصوص ریخته گری	۳	
دستکش نسوز کف دوبل سایر بلند پایش یا بخ نسوز دستکش نسوز کف دوبل performer یا بخ نسوز Ansell sensilite ATG FOX STARK گلنان MATRIX P GRIP ۹۹۱.	جفت	دستکش پازرسی	۴	محاذطه دست
Ansell Hyflex ۱۱-۴۷۸/Hyflex ۱۱-۸۵۱) PSE FOX مکس Uvex (B11-۳-B11-۲): ۴۲۶, ۴۲۷, ۴۱- سینکما اسناد کار گلنان سری ۲	جفت	دستکش ایمنی ضد بوش	۵	
Ansell edge ۱۲-۵۶۲ دکشن بونا Uvex MIDAS UNIVERSAL PROMAX مالان ATG MaxiChem ۶۶۲. Matrix Pusha chem Maxichem anti acid Ansoll Solvex ۶۷۵		دستکش ضد اسید	۶	محاذطه دست

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۹ از ۱۲۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



Ansell Solvex ۷۱۰				
Honeywell ۱۰۵۶۸۵ WOBO UVEX CRYOGENIC GLOVES	جفت	دستکش عایق کار با مواد پرودانی	۷	محافظه جفت
ATG اسناداک ATOM FOX سانکن uvex Ansell Performer	جفت	دستکش ضد ارتعاش	۸	محافظه جفت
چرم کف دوبل سمعی برند پاپش بانج نسوز UVEX ANSELL OVERSAFETY MIDAS JLP - ۵ HOBART چرم کف دوبل سمعی برند performer بانج نسوز Sperian(Kevlar) Performer	جفت	دستکش عایق حرارت	۹	محافظه جفت
برند سپلیس مدل کف دوبل فرانسوی اسناداک FOX PROMAX HOBART UVEX چرم کف دوبل برند پاپش برند میدانی performer	جفت	دستکش جوشکاری ساق بلند	۱۰	محافظه جفت
(spoggles ۱۰۰۰ مدل) Cana safe UVEX PROTECTIVE SPEXTACLES PARKSON PAN TAIWAN Cana safe(orilla / S poggles)	عدد	عینک ضد گرد و غبار	۱۱	محافظه چشم و صورت
Riley Arezzo PAN TAIWAN PARKSON CANASAFE Riley Arezzo Vuetix عبدک ایمنی توپاقی مدل ATBM Uvex Carbonivision ۱۰۰۰	عدد	کاکل ایمنی ضد گرد و غبار	۱۲	محافظه چشم و صورت
Uvex(sky guard safety spectacle)	عدد	شلد بوشکاری	۱۳	
Cana safe PARKSON Persian safy Uvex Matrix Hellberg	عدد			

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOI GOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۹۵ از ۱۳۰

تائستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴

٦- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

نیز در لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گیر



۴۰۰۱ با هدیه گردانی Cana Safe	UVEX PARKSON IRd	۵ عدد	شلند فسی مخصوص رینخه گزی ظاہل اتصال به کلاهه ایمنی	۴	محلاط چشم و صورت
با هدیه گردانی Canasafe ۴۰۰۱ با هدیه گردانی	PARKSON Persian safty Uvex Matrix Hellberg	۵ عدد	شلند محافظه سنج رانی	۵	
Hatter man CANA SAPE PARKSON uvex JSN Fibermetal		۵ عدد	فسی شلند جوشکاری	۶	
Pan Taiwan PROTECTIVE SPECTACLES Cana safe Parkson		۵ عدد	عینک جوشکاری	۷	محلاط چشم و صورت
Persian safety Safety spectacles uvex Parkson PAN TAIWAN Cana safe باریک توپاچ مدل AT1119 مدل شتاب (۷۰-۳۰-۲)		۵ عدد	عینک تراشکاری	۸	
Canasafe ongard alutatch ۴۰۰۱، ۴۰۰۱، ۴۰۰۲		۵ عدد	فرو گیره اتصال شلند فسی به کلاهه ایمنی	۹	
(Curv-J IRd) سری Canasafe uvex PROTECTIVE SPECTACLES Reflect IRd سری Canasafe		۵ عدد	عینک مادون فریم مخصوص رویت مدارب	۱۰	محلاط چشم و صورت
Reflect IRd ۲۰۱۸ سری Canasafe	PRO Safety promax	۵ عدد	کاکل شلند	۱۱	
hellberg secure Y honeywell Buffalo uvex PELTOR VM OPTIME VM neckband VM Hy... J sp big Howard Leight LyN Howard viking VM		۵ عدد	ابرومات	۱	محلاط گوش
Canasafe db dropxs ۱۰۱۵۲	ELVEX HOWARD Cana safe uvex	جفت	ابروبلک	۲	محلاط گوش
petZL Haru					

تجددی مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۳۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



uvex msa J sp evolite steel pro Hatter Man	عدد	کلاه ایمنی کار در ارتفاع	۱	محلظ سر و گردان
Elsec MSA HARU Regeletex uvex Honeywell Kavach canasafe Respirex Dpl	عدد	کلاه ایمنی عالی برتر	۲	محلظ سر و گردان
Jackson HARU UVEX msa Centurion	عدد	کلاه ایمنی دریسوز سفید رنگ	۳	
متاسب با علی کلاه خردباری شده	عدد	چاله پند کلاه ایمنی	۴	
WOBO	عدد	کلاه عالی توودنی	۵	
Canasafe Podex Jla sky1 msa HARU Matrix Persian safty (Dwarf&X%)	عدد	کلاه ایمنی معمولی	۶	
Uvex TM	عدد	مقنهه تنفسی	۷	
شد درصد کتان با گیرماز ۵۰٪	عدد	مقنهه تنفسی	۸	
درجہ سائنسی گردن - چرمی دکمه ای - ۱۰۰ مقاوم به حرارت نا	عدد	مقنهه دریسوز		
Safety jogger redwing COFRA Respirex WORKMASTER Horus جز مدل کوپر Podex ساز GARD آرک ابن با (Tmax) ۳۷ درجه ملند ابن با جوگر کد ۴۰۵ ابن با جوگر کد ۴۰۷ ابن با جوگر کد ۴۰۹ ابن با جوگر کد (TDS) پیوندی مدل افرا مدل دنا پیوندی مدل superfirm باتن CAT پهشتان کلوه پای آرا کلاه - این بن گارد سندگان - دستور Pezoll horus	جفت	کفش ایمنی	۱	محلظ با

تجددی مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۴۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



Work master COPRA ELECTRICAL Honey well Cofra TMax Redwing Respirex TDS مدل هابکر کافر Hera (نحوی) کفشن آتش کاری کلار Honey well Work master Horus COFRA بای آر کفشن ضد الکتریسیته ساکن دارای لبل ایمنی استاندارک مدر	جفت	کفشن ابعادی عایق برق ۷۸+ وات	۲	محافظه با
cogra Redwing Work master Mdl هابکر pezziol Honey well respirex Horus	جفت	کفشن ابعادی عایق برق دشار فوی ۱۸ کیلو وات (عایق برق و لذاز نا ۱۸ کیلو وات)	۳	
Honeywell COPRA redwing Work master wobo	جفت	چکمه کار با مواد بوتونی	۴	محافظه با
Honeywell ۲-۵۸۶۸۵ wobo	جفت	چکمه ضد مواد بوتونی (شتورون مایع)	۵	
Honeywell Redwing respirex horus Work master truck safety jogger Panoply	جفت	چکمه ضد سید	۶	
کافر Work master respirex Horus redwing	جفت	گتر عایقی حرارت دبرسوز	۷	
دو نیکه BTH میهن دوخت جنس ۱۰۰ فرد کتل با ضخامت بارچه مناسب پس از تایید نموده ارسالی mkf	دست	لیلیس نسوز (حداکثر تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد از جنس کتان)	۸	محافظه بدنه
BTH	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	

تجددی مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۴۰۴ از ۱۴۲۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



PODEX میهن موتخت	عدد	پسندیده کمپرسور		
حداکثر جنس آن با ۰-۲ درصد کتان و تحمل گرمای ۲۷۰-۲۸۰ تاندی واحده سلامت کار شرکت توسعه آهن ازابی است	دست	لیبلی کار یک نیمه (۰-۲ درصد کتان)	۲	محلاط بدن
BTH PODEX Power - Dickies	دست	لیاس کار دو تیکه از جنسی لی	۴	
بدون پلی استر و غیر کتسان با مقاومت حرارتی بالا میهن موتخت BTH PODEX	دست	لیاس کار جوشکاری	۵	
بارچه ای ملا احمدی نشسته شده	دست	لیاس کار ضد آرک	۷	
لی صد درصد کتان با گفتگوی درجه (۰- گرمای ۲۰۰-۲۶۰)	دست	لیاس ضد الکتریسیته ساکن	۸	محلاط بدن
PODEX BTH	دست	لیاس عایق یو و دنی (دک ، کامل شامل بیکمه ، هستکشن ، لیاس ، کلاه ، ماسک)	۹	
TURKMENBASHI JEAN COMPLEX نشسته شده	دست	لیاس کار با مواد شیمیایی	۱۰	
Ansell leodlin lv. PODEX magma BTH promax	دست	بارچه ای و داگر	۱۱	
Honeywell IS T	دست	جلد شریک	۱۲	
بارچه ای جنسی بالا ضد استاندارک برند زمز بود	دست	لیاس تراشکاری	۱۳	
WO BO	دست			
Honeywell raychem ۶... Podex delta BTH Panoply promax Angell North	دست			
طبق معرفه با تابند واحده سلامت کار	دست			
طبق معرفه با تابند واحده سلامت کار	دست			
آستین کوناه - حداقل ۷۰-۷۸ درصد کتان با گرمای ۳۷-۳۸	دست			
BTH PODEX	دست			
بند مدل (اصلی) MFA-۰-۰M	دست	ماسک تنفسی تمام صورت	۱	محلاط تنفسی
uvex NORTH BLS Drager MSA	دست	ماسک تنفسی نیم صورت	۲	
onnuriplan ONSM ۷... BLS NORTH uvex MSA DRAGER ۷M ۹۶-۲ ۷M ۹۶-۳	دست			
P100-۸۰۰-۴ ۷M	بند			

تجددی مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۲۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



DRAGER BLS γM MSA UVE X NORTH فلتر مولنی گاز زیستی	عدد	فلتر کارتویج ماسک	۲	
Zero onnuriplan ONSM γ...				
DRAGER BLS MSA UVE X Sperian NORTH γ...	عدد	مالک فیلتر دار - کارتویج دار	۴	
γM γM γ - γM γM γ γM γM γ - γM γM γ				
متاناسب با فیلتر خودداری شده	جفت	بد خد گرد و غبار	۵	
متاناسب با فیلتر خودداری شده	جفت	دروپوش بد خد گرد و غبار	۶	محافظه تنفسی
Canasafe γmax GSP Drager APOLO Maxell γ M Uvex γγ - J γ γγγ SPC ATγ نلو یاک نومه	عدد	ماسک سوپلی دار /FFP2 و بیزشکی / بهداشتی	۷	
ارسال تاییدیه از است.	متر مربع	کفپوش عایق برن ۴۰۰ وات بی وی سی غیرقابل انتقال	۸	
PETZL HARU canasafe PROTECTOR Promax LA11-4 HYVVA ADELA هارنس گیرز بوش مدل AYYA بوش مدل AYYX بوش مدل AYYX همه مدل های هارنس فول پادی گیرز بوش مدل AYYZ	عدد	کمربند اندی	۹	سازمانی و حفاظت فردی
پارچه	عدد	زام ملتوی	۱۰	
پارچه	عدد	بشنی کمری	۱۱	

توجه: قبل از خرید معدله برای احرار اصالت کالا اقدام به اخذ تاییدیه از واحد سلامت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر گردد

تایید کننده: حسین ابراهیمی

پیوست: شهریار منتظری

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۴۰۴ از ۱۳۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

لیست اقلام موثر بر



لیست اقلام موثر بر HSE در سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر

توضیحات	نوع تگ	نوع گزارش	نیم بازرگانی	دوره بازرگانی پس از ورود به سایت	بازرسی قبل از ورود به سایت	اطلاع به HSE (اخذ مجوز ورود)	گروه	نوع تجهیز / متریال
	گواهی سلامت	چک لیست / گزارش بازرگانی HSE	شرکت های بازرگانی / جرثقیل / HSE	ماهیانه / هفتگی	بله	بله	ماشین آلات	جرثقیل
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	TAG-color code	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	روزانه	بله	بله	ماشین آلات	تجهیزات باربرداری
	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	ماشین آلات	ماشین آلات سنجی
این مورد سرویس های رفت و آمد را نیز شامل می شود	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	ماشین آلات	ماشین آلات سبک
	برچسب	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / واحد برق	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	تبلوهای برق
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	کارت شارژ	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / پرسنل آتش نشانی	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	کپسول آتش نشانی
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	لوله داربست
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	متعلقات داربست، (تخته، بست، مغزی)
	برچسب بازرگانی سیستم رنگ بندي	visual check / فرم مجوز ورود اموال	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	کپسول های تحت فشار
	برچسب بازرگانی color code	visual check/ Report	HSE پرسنل	هفتگی	بله	بله	تجهیزات	دستگاه خم و برش

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۴۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:		<u>لیست اقلام موثر بر</u>						لیست اقلام موثر بر	
نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب مشخصات فوم	فرم گزارش روزانه آتش نشانی	HSE بررسی رازنه نشانی	روزانه	بله	بله	تجهیزات	مواد آتش نشانی	
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	آرم شرکت پیمانکار	گزارش در فرم - فرم TBM مجوز ورود اموال	HSE بررسی	روزانه	بله	بله	تجهیزات	وسایل حفاظت فردي	
	برچسب استاندارد سازنده	گزارش در فرم - فرم TBM مجوز ورود اموال	HSE بررسی	روزانه	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات کار در ارتفاع	
	MSDS	-MSDS چک لیست	HSE بررسی	ماهیانه	بله	بله	مواد	مواد شیمیایی	
	برچسب تاریخ	چک لیست دارو	HSE بررسی	هفتگی	بله	بله	مواد	مواد دارویی	
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب بازرسی و مشخصات	چک لیست / visual check	HSE بررسی رازنه نشانی	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات آتش نشانی	
	برچسب کالibrاسیون	چک لیست عملکرد اورزانس	HSE بررسی بررسی اورزانس	ماهیانه	بله	بله	ملزومات	تجهیزات بیشگی	

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۳۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران		تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳	
تخصص نفرات HSE	حداقل تعداد نیروی HSE لازم برای پیمانکار	مشاغل کارگری و کارمندی	عنوان فعالیت/خدمات
-گرایش های مختلف محیط زیست -گرایش های مختلف پهداشت -گرایش های کشاورزی با ۴ سال سابقه مرتبط با HSE	-تا ۲۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۲۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول ۲ روز در هفته) -از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (تمام وقت)HSE	باغبان	خدمات با غبانی و فضای سبز
-گرایش های مختلف پهداشت -گرایش های مختلف ایمنی صنعتی	-تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE نیز می باشد -از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (تمام وقت) -از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول (تمام وقت)HSE	-نظافتچی -پیش خدمت	خدمات نظافت عمومی و صنعتی
-گرایش های مختلف پهداشت -گرایش های مختلف ایمنی -گرایش های مختلف مکانیک با ۴ سال سابقه مرتبط با HSE	-تا ۲۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۲۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (تمام وقت) -از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول (تمام وقت)HSE	-راننده و سانط نقلیه سبک -خدمات اعزام خودرو -خدمات تاکسیرانی و مسافرت -خدمات رانندگی و سانط نقلیه ویژه -خدمات حمل و نقل و سرویس کاری ماشین آلات سبک و سنگین	خدمات ایاب و ذهاب(تاکسیرانی سرویس و...)
-گرایش های مختلف پهداشت -گرایش مختلف علوم تغذیه با ۴ سال سابقه	-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE نیز می باشد -از ۵ تا ۵ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (تمام وقت)HSE	-آشپز -مامور پذیرایی -پیش خدمت رستoran -پخت کننده غذا	پیمان غذایی
تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف پهداشت)	-تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی ۳)HSE پیمانکار ۱ نفر مسئول (تمام وقت) روز در هفته) -از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (تمام وقت)HSE	-نگهدان -نگهدان و راهنمای اداره مرکزی -نگهدان درب ورودی، ساختمان های عملیاتی و حفاظت فزیکی	خدمات حراست و نگهدانی

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۴۰۴ از ۱۳۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

<p>-گرایش های مختلف ایمنی -رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی -گرایش های مکانیک،برق،تاسیسات،الکترونیک،عمران با ۵ سال سابقه کار مرتبط</p>	<p>-تا ۵ نفرنیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد</p> <p>-از ۵ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>-از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>-برق کار -مراقب دستگاه آب و برق و بخار -مراقب اتاق کنترل آب و برق و بخار -مکانیک سوله -مکانیک برق -مکانیک ابزار دقیق -مکانیک دستگاه های تهویه و خنک کننده -مکانیک تاسیسات -تکنسین دستگاه های تهویه</p>	<p>خدمات راهبری تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی، تهویه و خدمات تعمیراتی عمومی</p>	۶
<p>-گرایش های مختلف ایمنی -رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی -گرایش های مختلف مکانیک،برق،شیمی و صنایع با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار یک نفر آنها مسئول HSE نیز می باشد</p> <p>-از ۱۰ تا ۵۰ نفر ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفتة)</p> <p>-از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>-آتش نشان -خدمات ایمنی و آتش نشانی -خدمات آتش نشانی و رانندگی -خدمات آموزشی و آموزسی -خدمات درمانی</p>	<p>خدمات آتش نشانی و اورژانس</p>	۷
<p>-گرایش های مختلف ایمنی -رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی -گرایش های مختلف مکانیک،برق،شیمی و صنایع با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا ۱۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد</p> <p>-از ۱۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>-از ۲۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p> <p>-از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۳ نفر مسئول HSE (تمام وقت)</p>	<p>-تراشکار -فلزکار -آهنگر -لحيم کار -جوشکار -مکانیک و ...</p>	<p>خدمات فلزکاری،تراشکاری،جوشکاری،مکانیک عمومی و ...</p>	۸
	<p>-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>-از ۵ تا ۷ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت در هر شیفت)</p>	<p>نویت کار مشاغل مختلف</p>	<p>خدمات بهره برداری انویت کاری</p>	۹

تذکر ۱: حداقل تحصیلات مورد نیاز فوق دیپلم می باشد.

تذکر ۲: در صورتی که تعداد نفرات نیروهای پیمانکار در حدی است که نماینده پیمانکار مسئولیت HSE را به عهده می گیرد نماینده پیمانکار موظف است موارد مطروحه در دستورالعمل HSE پیمانکاران را کاملا رعایت نموده و مطابق مستندات دفترچه عمل نمایند. همچنین نماینده HSE کارفرما موظف است در زمان های مختلف از نحوه عملکرد پیمانکاران در مورد مسائل HSE بازرسی به عمل آورد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۳۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/ق

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار
مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره قرارداد : ۱۱۵۵/۰۴/ق

تاریخ قرارداد : ۱۴۰۴/.../...

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۴۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵ ق

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

«شرح خدمات فنی تامین، نصب، اجرا، تست و راه اندازی تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی»

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر در نظر دارد تا یک عدد کمپرسور (بلوئر) ارزن به همراه موتور، گیربکس، سایلنسر و متعلقات جانبی آن را در سایت طوبی اجرا نماید به نحوی که این کمپرسور قابلیت جایگزینی برای کمپرسورهای پروسسی استیچ اول، کمپرسورهای پروسسی استیچ دوم و کمپرسور کولینگ را داشته باشد. در این راستا بخش اعظمی از پایپینگ پروسسی به همراه فونداسیون مربوط به کمپرسور، گیربکس، موتور و همچنین سایلنسر اجرا شده است و به جهت تامین، نصب، اجرا و راه اندازی مابقی پایپینگ‌ها، فوت‌پلیت‌ها و تجهیزات جانبی (از قبیل یونیت‌های روغن، تجهیزات ابزار دقیق، تجهیزات برق، تجهیزات آب، هوای ابزار دقیق و اتصالات برقی، ابزار دقیقی و پایپینگی و ...) مطابق شرح خدمات ذیل و مشابه به سایر کمپرسورهای فرایندی نصب شده در سایت از طریق اخذ پیمانکار تخصصی اقدام نماید. لازم به توضیح است تامین خود کمپرسور، گیربکس و موتور با کارفرما می‌باشد اما نصب و اتصال و راه اندازی آن‌ها با پیمانکار می‌باشد. همچنین کارفرما در شرح خدمات فنی ذیل سعی می‌کند جهت همسنگ سازی قیمت‌ها کلیه موارد اجرایی و تامین را به همراه برآورد تقریبی در نظر بگیرد اما ممکن است برخی موارد در این شرح خدمات دیده نشود و سایتران باشند یا برآورد با واقعیت اجرا تغییراتی داشته باشد که بایستی حتماً پیمانکار قبل از شرکت در مناقصه از سایت بازدید نماید و تمامی مسیرها و چالش‌های اجرایی را مشاهد نماید و مسئولیت قیمت دادن برای هر آیتم با برآورد صحیح آن با پیمانکار می‌باشد. کمپرسور هفتم و متعلقات آن بایستی دقیقاً مشابه با سایر کمپرسورهای پروسسی نصب شده در سایت اجرا شود چه از لحظه متريال و تجهیزات مورد استفاده و چه از نظر موقعیت نصب تجهیزات. لذا پیمانکار با بازدید از سایت می‌تواند برآورد دقیقی از احجام داشته باشد و قیمت جزئیات کوچک کار که در شرح خدمات دیده نشده است را روی آیتم‌های کلی که در شرح خدمات دیده شده است لحاظ نماید.

شرح خدمات:

۱- پیمانکار حتماً بایستی قبل از شرکت در مناقصه از سایت و محل انجام عملیات بازدید نماید و هیچ گونه ادعایی از پیمانکار مبنی بر عدم اطلاع از شرایط سایت مورد پذیرش نمی‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۴۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

۲- تمامی تجهیزات خریداری شده بایستی مطابق با داکیومنت‌های ارسالی کارفرما و مشابه با تجهیزات نصب شده بر روی سایر کمپرسورهای فرایندی موجود در سایت طوبی باشد. فاینال بوک مربوط به کمپرسورها به پیوست اسناد مناقصه ارسال می‌گردد.

FINAL BOOK & Catalogue FOR Process & Cooling Gas

Compressors AERZEN

۳- فونداسیون مربوط به کمپرسور، گیربکس، الکتروموتور MV و سایلنسر ساخته شده است، اما قسمت پایانی آن شامل فوت‌پلیت، پیچ‌ها، انکرها، تی‌بولت، الایمنت شیم‌ها و غیره بر روی فونداسیون موجود اجرا نشده که بایستی مطابق نقشه مربوط به فونداسیون کمپرسور که به پیوست ارسال می‌گردد (نقشه شماره ۴۰۰۱۳۰۸۶۰۵ در فایل بوک و همچنین نقشه‌های فونداسیون در پوشش فونداسیون اجرا شده) تکمیل گردد، وظیفه تکمیل و تامین مابقی متریال و همچنین گروت ریزی با پیمانکار می‌باشد.

۴- نقشه یونیت‌های روغن مربوط به یونیت روغن کمپرسور و یونیت روغن گیربکس به همراه لیست تجهیزات آن‌ها به پیوست ارسال می‌گردد (فایل‌های یونیت روغن گیربکس و یونیت روغن بلوئر)، همچنین نقشه P&ID مربوط به کمپرسور هفتم (نقشه TGMMMPG00M5152) نیز ارسال می‌گردد. پیمانکار بایستی یونیت‌های روغن به همراه تجهیزات منصوبه بر روی آن را مطابق با داکیومنت‌های ارسالی، تامین، نصب، تست و راهاندازی نماید. همچنین اتصال کردن آن به کمپرسور و گیربکس و همچنین اتصالات تعذیه آن و اتصال به سیستم کنترل به همراه تامین کابل‌های مربوطه با پیمانکار می‌باشد. در هر مورد که اطلاعات تکمیلی مورد نیاز باشد پیمانکار می‌تواند از تجهیزات نصب شده مشابه بر روی سایر کمپرسورهای فرایندی موجود، اطلاعات لازم را کسب نماید. در جدول زیر لیست تجهیزات مهمی که بر روی یونیت‌های روغن بلوئر و گیربکس نصب می‌شود آورده شده است. برآورد پایپینگ، جوشکاری، فلنچ، گسکت، زانو، سه راه، ولو دستی، پیچ و مهره و غیره که سایتران می‌باشد از روی نقشه‌های موجود و بلوئرهای مشابه نصب شده، با پیمانکار می‌باشد و این موارد را نیز بایستی تامین واجرا نماید و در پیشنهاد قیمت خویش لحاظ نماید، درخواست اضافه پرداخت بابت این متریال پس از عقد قرارداد پذیرفتی نمی‌باشد.

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۴۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴-ق

پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

Row	Unit	Equipment	Model	Manufacturer	Qty.
1	gear box oil unit	heat exchanger	BCF 806-0-B 15-4 weg	Funke wametauscher	1
2	gear box oil unit	duplex filter	Du 251.25G.30.E.P.-.FS.8, DN50PN32	Eaton technologies	1
3	gear box oil unit	Gear pump	Sf3-32 RD-LFM	Gebr. Steimel	2
4	gear box oil unit	electromotor	DCEx 132VP/4K ,400/690 D/Y , 7.5KW, 50hz, 1465rpm, cosphi 0.78, IP55, class F,Cert no: BVS 14ATEX E 114X	HEW	2
5	gear box oil unit	coupling	Rotex , KTR-N 40210	KTR system	2
6	gear box oil unit	pressure gauge	burden tube: model 233.50.100 ,0...6 bar, R1/2, under connection	WIKA	2
6	gear box oil unit	pressure gauge	burden tube: model 233.50.100 ,0...2.5 bar, R1/2, under connection	WIKA	1
7	gear box oil unit	resistance thermometer	omnigrad M TR 10, TR10-GAD9BHRYC2100	Endress & Hauser	1
8	gear box oil unit	thermometer gauge	F73.100 , -40...120 C	WIKA	2
9	gear box oil unit	bimetal thermometer	R5502/4/ G 1/2 under connection, -40...60 C	WIKA	1
10	gear box oil unit	Differential pressure transmitter	Deltabar S PMD 75, PMD75-1BJ7HB1DHBA	Endress & Hauser	1
11	gear box oil unit	Pressure transmitter	Cerabar S PMP 71 , PMP71-1BA1PB1GAABU	Endress & Hauser	1
12	gear box oil unit	Temperature transmitter	TMT 142 / Thermowell TW 10, TMT142-B22131BBA1	Endress & Hauser	1
13	gear box oil unit	Expansion joint	Lateralkompensator DN50, PN16, BL114, material:1.4571	HKS	2
14	gear box oil unit	safety valve	MU-ECK 1/2 inch, 06370.0400.0000, ST.	Herose GMBH Armaturen und Metalle	1
15	gear box oil unit	flow meter	H250/RR/M40/ESK-Ex, 1...10 m^3/hr,Dn50PN16	Krohne	1
16	gear box oil unit	manometer gauge valve	1/2 inch, 1*D12, M02EKL12swlG12 DN4 PN 400, material 1.4571		3
17	gear box oil unit	shut off valve	DN50PN16,material:GG25		3
18	gear box oil unit	temperature controller	M 50TD 3G 110 38 A DN5, material: GG40.3		1
19	gear box oil unit	non return valve	Typ: RK 86 DN50 PN16, material:1.4571/1.4317		2
20	gear box oil unit	shut off valve	1/2 inch PN16,DAVR216,material:ST.		2
21	gear box oil unit	globe valve	Dv 10-L, material: brass		2
22	gear box oil unit	Tank,Piping, flange, elbow, T joint, ...	Seamless ST		Site run

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۴۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

Row	Unit	Equipment	Model	Manufacturer	Qty.
1	Blower oil unit	heat exchanger	BCF 804-0-B 13-4 weg	Funke wametauscher	1
2	Blower oil unit	duplex filter	Du 251.25G.30.E.P.-.FS.8, DN50PN16	Eaton technologies	1
3	Blower oil unit	Gear pump	KF 3/100 F20B POA	Kracht	2
4	Blower oil unit	electromotor	Frame112M, class F, IP55, Amb Temp:-20...40 C, 400/690, 50Hz, 1450rpm, cosphi=0.81, 4KW	WEG	2
5	Blower oil unit	coupling	KTR-N 41010	KTR system	2
6	Blower oil unit	pressure gauge	burden tube: model 233.50 ,0...6 bar, R1/2, under connection	WIKA	1
6	Blower oil unit	pressure gauge	burden tube: model 233.50 ,0...10 bar, R1/2, under connection	WIKA	2
7	Blower oil unit	resistance thermometer	omnigrad M TR 10, TR10-GAD9BHRYC2100	Endress & Hauser	1
8	Blower oil unit	thermometer gauge	F73.100 , -40...120 C	WIKA	2
	Blower oil unit	bimetal thermometer	R5502/4/ G 1/2 under connection, -40...60 C	WIKA	1
9	Blower oil unit	bimetal thermometer	R5502/4/ G 1/2 under connection, -40...160 C	WIKA	1
10	Blower oil unit	Differential pressure transmitter	Deltabar S PMD 75, PMD75-1BJ7HE1DHBA	Endress & Hauser	1
11	Blower oil unit	Pressure transmitter	Cerabar S PMP 71 , PMP71-1BA1PE1GAABU	Endress & Hauser	1
12	Blower oil unit	Temperature transmitter	TMT 142 / Thermowell TW 10, TMT142-B22131BBA1	Endress & Hauser	1
13	Blower oil unit	Expansion joint	Lateralkompensator DN40 PN16, material: 1.4571	HKS	2
14	Blower oil unit	safety valve	MU-ECK 1/2 inch, 06370.0400.0000, ST.	Herose GMBH Armaturen und Metalle	1
15	Blower oil unit	flow meter	H250/RR/M40/ESK-Ex, 1...10 m³/hr,Dn50PN16	Krohne	1
16	Blower oil unit	oil heater	DHF22B03GG-3-T6, elmess 3kw, 3ph,400V, 4.3A, 1.3W/cm²	elmess thermosystem technik	1
17	Blower oil unit	oil level switch	INV60A01St-T6/65-16H375-L405 ,IP66	elmess thermosystem technik	1
18	Blower oil unit	manometer gauge valve	1/2 inch, 1*D12, M02EKL12swIG12 DN4 PN 400, material 1.4571		3
19	Blower oil unit	non return valve	Typ: RK 86 DN40 PN16, DRVZ42A001R307, material:1.4571/1.4317		2
20	Blower oil unit	shut off valve	DN40PN16, gray cast iron		2
21	Blower oil unit	globe valve	Dv 10-L, material: brass		2
22	Blower oil unit	temperature controller	M40TD8A110-CC DN40, material: GG40.3		1
23	Blower oil unit	shut off valve	1/2 inch , material RG5		2
24	Blower oil unit	shut off valve	2 inch , material RG5		1
25	gear box oil unit	Tank,Piping, flange, elbow, T joint, ...	Seamless ST		Site run

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۴۴

تابستان ۱۴۰۴


شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

۵- پایپینگ این کمپرسور جهت اتصال به خطوط فرایند تا حد زیادی انجام شده است و بخش‌های کوچکی از آن باقیمانده است که مطابق تصویر پیوست و جدول ذیل لیست حدودی متریال و مسیر پایپینگ ارائه می‌گردد که پیمانکار بایستی متریال مباقی مسیر را تامین و اجرا نماید.

Row	شرح	Unit	Qty
1	Pipe 1200mm, ASME B36.10, 9.53mm Wall Thickness, EFW WELDED BE ASTM A139 GR. B	meter	45
2	Pipe 250mm, ASME B36.10, SCH40, SEAMLESS, BE, ASTM A53 GR. B	meter	22
3	MITERED ELBOW 90 LR, FABRICATED FORM PIPE SIZE 1200mm, 9.53mm WALL THICKNESS, ASTM A139 GR. B	Pcs.	3
4	EQUAL TEE 1200mm, 9.53mm, ASME B16.9, ASTM A234 GR.WPB	Pcs	1
5	CAP 1200mm, 9.53mm, ASME B16.9, ASTM A234GR.WPB	Pcs	1
6	SPECTACLE BLIND 1200mm, WEAMCO TYPE 8F OR EQ, 150# RF, ASME B16.5, ASTM A36	Pcs	2
7	ELBOW 90 LR, 250mm, ASME B16.9, BW, SCH40, ASTM A234 GR. WPB	Pcs	2
8	FLANGE SO, 250mm, ASME B16.5, 150# RF, Serrated Finish, ASTM A105	Pcs	2
9	BUTTERFLY VALVE 250mm, LUG TYPE, GEAR OPR, API 609, BODY Cast Steel A126-B, Disc A536-65	Pcs	1

خطوط مورد نیاز برای اجرا در مدل سه بعدی زیر به رنگ قرمز نمایش داده شده است.

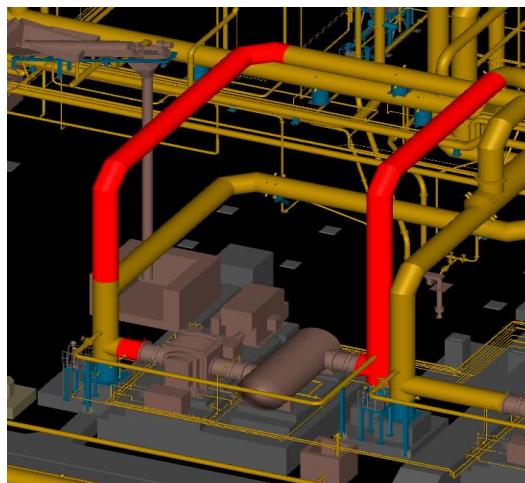

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۴۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱۵۵

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

۶- تامین و نصب کامل سایلنسر با پیمانکار می‌باشد، نقشه مربوط به ساینسر با شماره ۲۰۰۰۰۶۴۶۴۱ به همراه پارت لیست تجهیزات بکار گرفته شده در ساخت آن، در فاینال بوک ارسالی موجود می‌باشد.

۷- نقشه مربوط به جانمایی تجهیزات جانبی از قبیل جانکشن باکس‌ها و یونیت‌های روغن و مسیر کابل‌ها به پیوست ارسال می‌گردد، لازم به توضیح است لوله گذاری‌های زیر بتن اجرا شده است و فقط در صورت نیاز و اجرای سایتران، ممکن است در برخی مسیرها نیاز به کاندویت گذاری باشد که اجرای کاندویت‌های روکار با پیمانکار می‌باشد. همچنین تامین JB‌ها با پیمانکار می‌باشد.

۸- غیر از یونیت روغن و سیستم تزریق آب، خود کمپرسور دارای تعدادی تجهیز ابزار دقیقی می‌باشد که بر روی یک رک ابزار دقیق نصب می‌شود. تامین و نصب خود رک و تجهیزات آن به همراه کانکشن آن به تپ پوینت‌های مشخص شده بر روی لاینهای ورودی و خروجی کمپرسور با پیمانکار می‌باشد. ایجاد تپ پوینت‌ها بر روی پایپینگ نیز با پیمانکار می‌باشد. مشخصات تجهیزات ابزار دقیق در جدول ذیل آورده شده است.

Row	Tag	Description	Qty.
1	TIT.A04.1	TEMPERATURE SENSOR RTD , RANGE: 0~100 DEG , MODEL: TR66 , ORDER NO: TR66-AEEED1XCHK20 , ENDRESS+HAUSER	1
2	PDIT.A29.1	DIFFERENTIAL PRESSURE AND INDICATOR TRANSMITTER , RANGE: -3...3 BAR , OUTPUT SIGNAL: 4~20 MA + HART , Model: PMD75-1BJ7HE1DABA+Z1	1
3	PIT-A48.1B	PRESSURE AND INDICATOR TRANSMITTER , RANGE: -1...4 BAR , OUTPUT SIGNAL: 4~20 MA + HART , model: PMP71-1BA1ME1GAABA+Z1 , G1/2"	1
4	PIT-A7.1B	PRESSURE AND INDICATOR TRANSMITTER , RANGE: -1...4 BAR , OUTPUT SIGNAL: 4~20 MA + HART , model: PMP71-1BA1ME1GAABA+Z1 , G1/2"	1

۹- تامین کابل و کابل کشی و کانکشن از تابلو مربوط به هیتر یونیت‌های روغن کمپرسورها و گیربکس‌ها (که برای تمامی کمپرسورها یک تابلوی مرکزی در سایت می‌باشد) تا هیترهای یونیت روغن کمپرسور و

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۹۵ از ۱۴۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱



شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

گیربکس با پیمانکار می‌باشد. همچنین کابل کشی ابزار دقیقی از تابلوی هیتر تا تابلوی CB02 که در ساختمان کنترل مرکزی طوبی مستقر است با پیمانکار می‌باشد.

۱۰- تامین کابل و کابل کشی و کانکشن از JB ها و دیوایس‌های نصب شده بر روی کمپرسور، رک ابزار دقیق و همچنین یونیت‌های روغن و سیستم تریپ قارچی الکتروموتور MV کمپرسور با پایه ساپورت مربوطه و کابل

کشی آن تا سیستم کنترل و اتاق برق به همراه دو عدد کن tact NC و همچنین تابلو برق تغذیه موتور و کانکشن آن با پیمانکار می‌باشد.

۱۲- تامین کابل، کانکشن و کابل کشی پاور موتور MV به همراه سیگنال‌های ابزار دقیقی مربوط به RTD های بیرینگ و سیم پیچ‌های موتور از محل موتور تا تابلو برق با پیمانکار می‌باشد. همچنین تامین کابل، کابل کشی و کانکشن مربوط به هیتر موتور تا تابلو برق با پیمانکار می‌باشد.

۱۳- تامین کابل و کانکشن و کابل کشی از موتورهای یونیت روغن گیربکس (دو موتور) و همچنین از موتورهای یونیت روغن کمپرسور (دو موتور) تا فیدرهای مربوط در اتاق برق با پیمانکار می‌باشد.

۱۴- لازم به توضیح می‌باشد، هرجا لازم به کابل کشی و اتصال به تجهیزات و یا تابلوها باشد (چه سیستم کنترل و چه پاور) تامین کابل و کابل کشی، در صورت لزوم اجرای کاندوفیت، اجرای فلکسیبل یا سینی کابل باید مطابق با سایر کمپرسورهای نصب شده باشد، همچنین در همه نقاط بایستی سر کابل یا سر سیم مناسب با آن کابل یا سیم و مطابق استاندارد استفاده شود و سر کابل‌ها حتماً مسی باشند، تمامی کابل‌ها چه کنترل و چه پاور متناسب با سایز عنوان شده نیز حتماً مسی باشند.

۱۵- تامین تجهیزات مربوط به سیستم آب اینجکشن و فلاشینگ کمپرسور با پیمانکار می‌باشد. همچنین پایپینگ، مربوط به انتقال هوای ابزار دقیق برای ولو روی خط آب از نزدیکترین انشعاب خط هوای ابزار دقیق با پیمانکار می‌باشد. تامین کابل، کابل کشی و کانکشن مربوط به ولو و فلومتر آب روی خط تزریق آب کمپرسور با پیمانکار می‌باشد.

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۴۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

TAG	Sh. P&ID	Loc. P&ID	Service			Tightness	Fail Position	Type	Actuator Type	Body Material	Hazard
Line NO.	Line Size	Valve Size	Norm.Temp	Max. Temp	Flow Rate	Des Flow RATE	Norm. Press	Max. Press	Fluid		
Process Connection		Sp. Gr.	mol_weight	Remark							
IV-E32.1	152	2-B	M.W FOR Standby Compressor (CP-A07)	IV	F.C	BALL	Spring Piston	A105			
0-MWS-09550-C1		40	1 1/2"	32/34	34	6	7	3.8	4.2	Machinery Water	
flanged, ANSI 150		0.994	18.02	ZS-E32.1A/B							
Row	Tag	description									Qty
1	FIT-E32.1	FLOW INDICATOR AND TRANSMITTER, TYPE: H250, MODEL: H250/RR/M40/ESK-EX, RANGE: RP-16 M ³ /H, SN: D220000001138881 SO:010268447/0010, DN50, PN40, P/A:01136365312.004, Ps=40bar, PT _{max} =78bar, Ts=300°C, KROHNE									1

۱۶- تامین و اجرای پایپینگ ورودی و خروجی کمپرسور شامل مجموعه اکسپنشن جوینتها (sliding sleeves)، استرینر ساکشن (starting strainer) و دیسشارژ (diffuser) و... همچنین خود سایلنسر به همراه درین آب‌های کمپرسور و سیل لگ‌های کمپرسور به همراه درین سایلنسر و انتقال آن به مخزن سیل لگ (TK10)، اتصالات و پایپینگ از یونیت‌های روغن به کمپرسور و گیربکس، نحوه اتصال به فونداسیون و ساپورت‌ها مطابق نقشه‌های شماره ۱۳۰۸۶۰۵، ۴۰۰۱۳۰۸۶۳۲، ۴۰۰۸۵۳۶۳۲ و ۴۰۰۸۵۰۹۷۴ در فاینال بوک و پارت لیست پیوست با عنوان main component با پیمانکار می‌باشد.

۱۷- تامین و لوهای روی خطوط آب ورودی به کمپرسور، خروجی از کمپرسور و درین‌ها مطابق P&ID به شماره TGMMMPG00M5152 و صفحات فاینال بوک ذکر شده در آیتم قبل با پیمانکار می‌باشد.

۱۸- انشعب اگرفتن از خط آب ماشینری برای ورودی کمپرسورها، ورودی کولرهای یونیت‌های روغن و نصب ولو در ورودی انشعب از خط اصلی با پیمانکار می‌باشد. برآورد تقریبی در جدول پایپینگ غیر پروسسی در آیتمهای زیر دیده شده است.

۱۹- برای اتصال واپرینگ سیگنال‌های ابزار دقیق به تابلو CB02 نیاز است تا پیمانکار ۱ عدد کارت DI کاناله، یک عدد کارت AI، ۳۲ کاناله و ۳ عدد کارت AI، ۸ کاناله به همراه بک پلین‌های مربوطه مطابق با شماره سریال‌های زیر از برند زیمنس خریداری گردد. ضمناً بایستی فیوز ترمینال برای تمامی سیگنال‌های

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۴۸ از ۱۴۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴-ق


۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

DI به همراه فونیکس کنتاکت (برای سیگنال‌های ورودی و خروجی مطابق نقشه loop diagram به تعداد مورد نیاز به همراه ترمینال بر حسب نیاز توسط پیمانکار تامین گردد.

row	Type	order No.	Qty.
1	DO 16*DC 24V, 0.5A	6ES7 322-1BH01-0AA0	1
2	DI 32*DC 24V, 0.5A	6ES7 321-1BL00-0AA0	1
3	AI 8* 0/4...20mA HART	6ES7 331-7TF01-0AB0	3
4	BACK PLANE	بک پلین متناسب با کارت‌های ورودی و خروجی ذکر شده در ردیفهای بالا برای سیستم ET200M	4

- ۲۰- نقشه SLD تایپ ۱۱ فیدر ۱۱ کیلوولت برای موتور کمپرسور هفتم طرح Simoprime

زیمنس شرکت الکتروکویر مطابق تصویر زیر به همراه وایرینگ دیاگرام آن که به پیوست ارسال می‌گردد می‌باشد. وظیفه تامین و نصب تابلو به همراه وایرینگ داخلی آن و بریکر آن و همچنین یراق الات (شامل شمش و پیچ‌ها جهت اتصال آن به بس ۱۱ کیلوولت موجود) با پیمانکار می‌باشد. ضمناً وایرینگ تابلو بایستی در شرکت الکتروکویر انجام شود و پک نهایی توسط پیمانکار جهت نصب در سایت حمل شود. تایپ بریکر 3AE5225-1 مطابق تصویر پیوست با ولتاژ نامی ۱۷.۵ کیلوولت و جریان نامی ۸۰۰ آمپر می‌باشد. (بریکر بایستی مطابق با تایپ و مشخصات تصویر زیر تامین گردد).

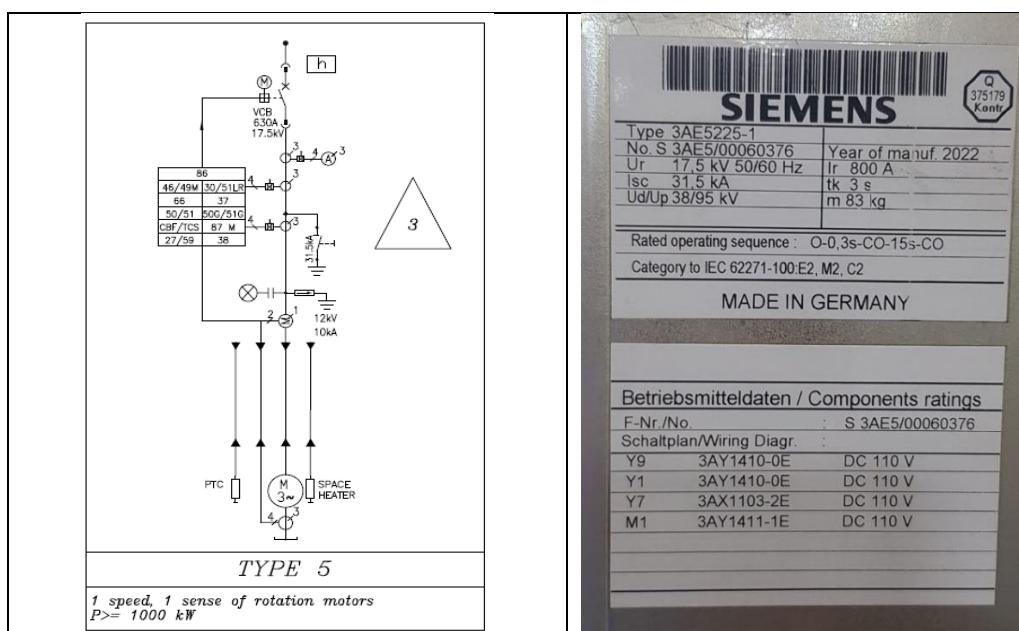

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر




صفحه ۱۴۹ از ۱۴۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵ ق

- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

۲۱- تامین دو عدد فیدر کشویی ۴۰۰ ولت ۴kW طرح جابون تیپ (Type2) و همچنین دو عدد فیدر کشویی ۴۰۰ ولت ۷.۵kW طرح جابون تیپ (Type2) مطابق تصاویر پیوست جهت پمپ‌های یونیت روغن گیربکس و کمپرسور با پیمانکار می‌باشد. همچنین تامین و کابل کشی مربوط به سیگنال‌های کنترلی این فیدرها تا سیستم کنترل با پیمانکار می‌باشد.
نقشه و تصویر یک نمونه فیدر آورده شده است که از هر کدام بایستی دو سری تامین گردد.

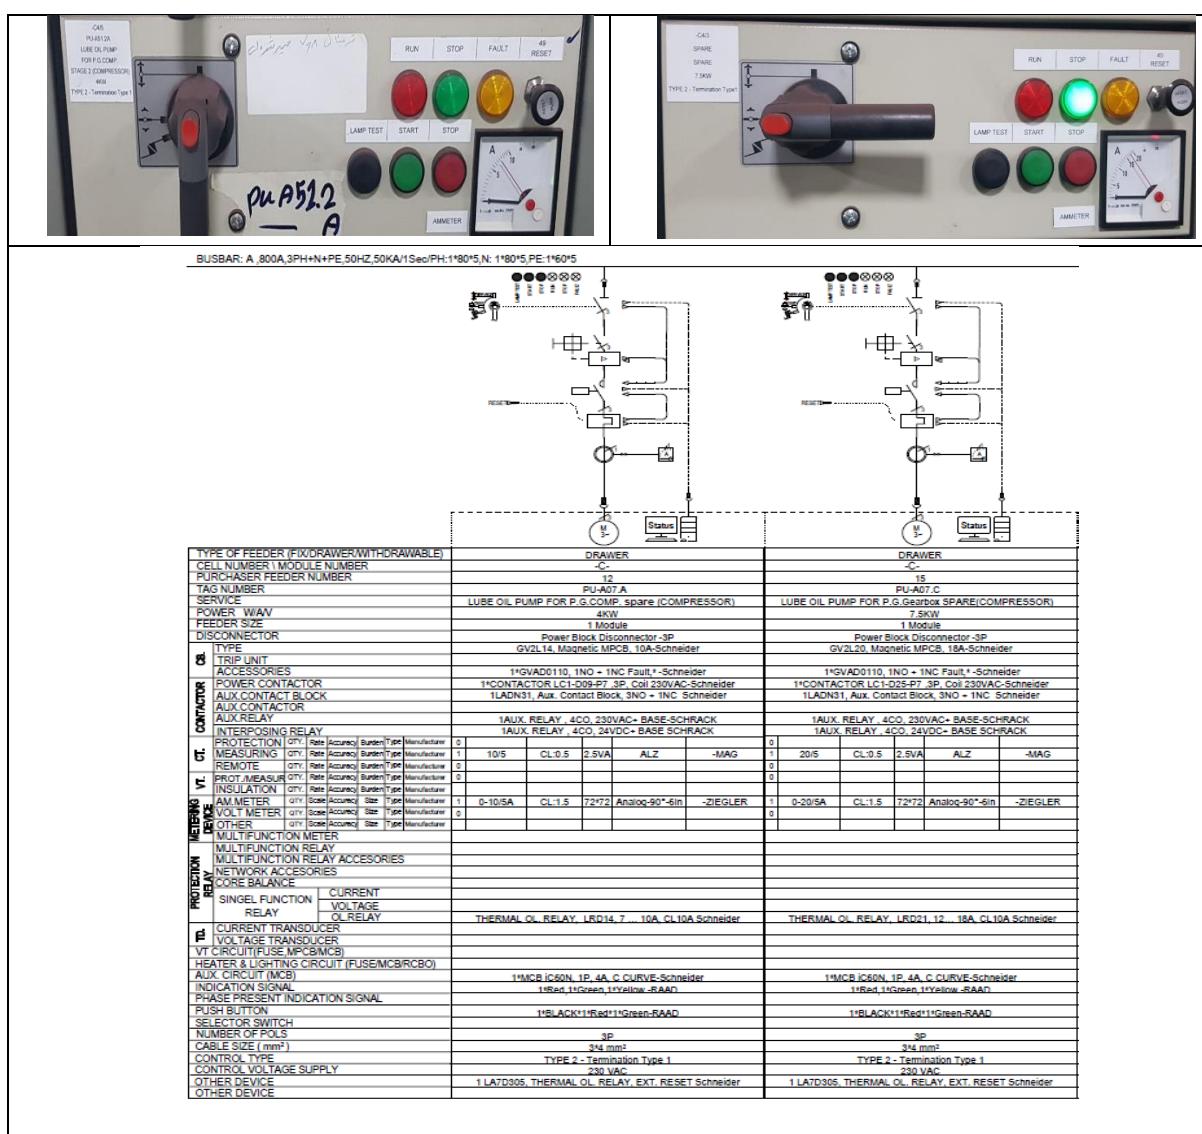

۲۲- تامین کوپلینگ بین گیربکس و موتور، همچنین کوپلینگ بین کمپرسور و گیربکس به همراه حفاظت کوپلینگها با پیمانکار می‌باشد.

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۵۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱۵۵

- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

row	description	manufacturer	qty
1	Boku-N A1000S /240H7P1-240H7P1 4500531573-20	KWD	1
2	GMK 4300-DE-AA-300/200H7P1 4500531573-10	KWD	1
3	Coupling guard	-	2

- ۲۳- متریال مربوط به پایپینگ غیر پروسسی برای سیل لگ‌ها، درین‌ها، انتقال آب ماشینری، خط هوای ابزار دقیق به صورت حدودی جهت همسنگ سازی قیمت‌ها در جدول زیر آورده شده است. برآورد کامل بايستی توسط پیمانکار انجام گردد، همچنین اقلام کوچک مانند فلنچ، گسکت، پیچ و مهره در این جدول دیده نشده است که برآورد و تامین آن‌ها با پیمانکار می‌باشد و قیمت آن‌ها نیز بايستی در پیشنهاد قیمت از سمت پیمانکار بر روی همین آیتم‌ها دیده شود. وظیفه برآورد دقیق با پیمانکار می‌باشد. اجرای این پایپینگ نیز با پیمانکار می‌باشد.

Row	Description	Unit	Qty
1	BALL VALVE 25mm FULL BORE, SW, #600, BS-5351 BOLTED GLAND SYMBOL:BA05 Forged Steel (A105) Body, Stainless Steel A276-304 or A351-CF8 Ball	Pcs.	1
2	BALL VALVE 40mm FULL BORE, SW, #600, BS-5351 BOLTED GLAND SYMBOL:BA05 Forged Steel (A105) Body, Stainless Steel A276-304 or A351-CF8 Ball	Pcs.	5
3	CAP 65mm, ASME B16.9, BW, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	1
4	CAP 80mm, ASME B16.9, BW, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	1
5	ELBOW 100mm, 90°, LR, ASME B16.9, BW, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	8
6	ELBOW 25mm, 90°, ASME B16.11, #3000, SW, ASTM A105	Pcs.	1
7	ELBOW 40mm, 45°, ASME B16.11, #3000, SW, ASTM A105	Pcs.	1
8	ELBOW 40mm, 90°, ASME B16.11, #3000, SW, ASTM A105	Pcs.	23
9	ELBOW 50mm, 90°, LR, ASME B16.9, BW, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	37
10	ELBOW 65mm, 90°, LR, ASME B16.9, BW, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	3
11	ELBOW 80mm, 90°, LR, ASME B16.9, BW, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	3
12	FLANGE 100mm, SO, ASME B16.5, #150, R.F, Serrated Finish, ASTM A105	Pcs.	2
13	FLANGE 40mm, SW, ASME B16.5, #150, R.F, Serrated Finish, ASTM A105	Pcs.	6
14	FLANGE 50mm, SO, ASME B16.5, #150, R.F, Serrated Finish, ASTM A105	Pcs.	2
15	Globe Valve 40mm, SW, #800, H-WHEEL OPR, BS-5352/ISO-15761, BB-OS&Y, SYMBOL: GL05, Forged Steel A105 Body, 13% Cr-Stainless Steel A276-420 Disc	Pcs.	4
16	ON/OFF BALL VALVE 40mm, SOV-E32.1	Pcs.	1
17	ORIFICE PLATE 100mm, FO-A07.2	Pcs.	1

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۵۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

-۷ پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

18	ORIFICE PLATE 40mm, FO-D90.22	Pcs.	2
19	PIPE 100mm, ASME B36.10, SCH 40, SEAMLESS, BE, ASTM A53 Gr. B	meter	102.2
20	PIPE 20mm, ASME B36. 10, SCH80, SEAMLESS, PE, ASTM A53 GR. B	meter	0.2
21	PIPE 25mm, ASME B36. 10, SCH80, SEAMLESS, PE, ASTM A53 GR. B	meter	1.6
22	PIPE 40mm, ASME B36. 10, SCH80, SEAMLESS, PE, ASTM A53 GR. B	meter	52.5
23	PIPE 50mm, ASME B36. 10, SCH40, SEAMLESS, BE, ASTM A53 GR. B	meter	390.7
24	PIPE 65mm, ASME B36.10, SCH 40, SEAMLESS, BE, ASTM A53 Gr. B	meter	44.9
25	PIPE 80mm, ASME B36.10, SCH 40, SEAMLESS, BE, ASTM A53 Gr. B	meter	28
26	ASTM A105 REDUCER 25*20, COUPLING SW, ASME B16.11, #3000,	Pcs.	1
27	REDUCER CONC 50*40mm, ASME B16.9, BW, SCH40/SCH80, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	2
28	REDUCER ECC 50*40mm, BW, ASME B16.9, SCH40*SCH80, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	1
29	REDUCER ECC 80*65mm, BW, ASME B16.9, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	1
30	SOCKOLET 80*25mm, ASME B16.11, #3000, ASTM A105	Pcs.	1
31	SWING CHECK VALVE 40mm, SW, #800, BS-5352/ISO15761 BC SYMBOL: CK04 FORGED STEEL A105 BODY, STAINLESS STEEL A182-F6A DISC	Pcs.	2
32	ASME B16.11, #3000, ASTM A105 SW , TEE 40*40mm ,	Pcs.	2
33	TEE 65*40mm, BW, ASME B16.9, SCH40/SCH80, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	4
34	TEE 80*40mm, BW, ASME B16.9, SCH40/SCH80, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	4
35	TEE 100*100mm, BW, ASME B16.9, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	1
36	TEE 50*50mm, BW, ASME B16.9, SCH40, ASTM A234 Gr.WPB	Pcs.	2

-۲۴ تمامی اقلام فوق باید نو و دارای نتایج معتبر آزمایشگاه یا Certificate مربوطه، مطابق با استاندارد باشند.

-۲۵ خطوط پایپینگ اجرا شده به صورت حداقل ده درصد RT میباشد.

-۲۶ جدول کابل های تامینی به شرح ذیل میباشد. این برآورد تقریبی و جهت همسنگ سازی قیمتها میباشد.

Row	device	from	to	type	S(mm ²)	Qty	distance	unit	total meter
1	MV motor EM-cp-A07	MV motor	electrical room 11KV bus	N2XSY ,12/20(24)kv	3*1*240	3	200	meter	600
2	Lv oil pump motor Pu-A07.A&B	blower oil unit	electrical room 400V bus	N2XY, 0.6(1)kv	3*4	2	200	meter	400
3	Lv oil pump motor Pu-A07.C&D	Gearbox oil unit	electrical room 400V bus	N2XY, 0.6(1)kv	3*6	2	200	meter	400

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۱۵۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴ ق

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

ردیف	نام و توضیح	مدل	جایگاه	مشخصات	متریال	تعداد	دستگاه	دستگاه	دستگاه
4	Mv motor space heater	Mv motor	electrical room 11KV bus	N2XY, 0.6(1)kv	3*2.5	1	200	meter	200
5	heater control cable	LCP-COMP-HEATER& instrumrnt	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	(12C0.75)	2	200	meter	400
6	instrument rack	JB1-Cp-A07& motor	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	2P0.75	2	200	meter	400
7	winding & bearing temp	JB1-Cp-A07& motor	electrical room 400V bus	twisted pair & shielded instrument	6P0.75	1	200	meter	200
8	emergency stop push PB	MV motor PB	electrical room CB02& electrical room 11KV bus	twisted pair & shielded instrument	2C1	2	200	meter	400
9	blower oil unit	JB1-Cp-A07-OBL	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	4C0.75	1	200	meter	200
10	blower oil unit	JB1-Cp-A07-OBL	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	2P0.75	2	200	meter	400
11	gearbox oil unit	JB2-Cp-A07-OGB	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	2P0.75	2	200	meter	400
12	flow meter	FIT-E32.1	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	1P1	1	200	meter	200
13	solenoid valve	SOV-E32A	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	2C2.5	1	200	meter	200
14	open& close feed back	SOV-E32A	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	4C0.75	1	200	meter	200
15	vibration of blower	VT(V&H)-A18.1	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	1P1	2	200	meter	400
16	position of blower	ZS-A02.6	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	2C1	1	200	meter	200
17	control oil pump motor Pu-A07.A&B	electrical room 400V bus	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	5C0.75	2	50	meter	100
18	control oil pump motor Pu-A07.C&D	electrical room 400V bus	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	5C0.76	2	50	meter	100
19	winding & bearing temp	electrical room 11KV bus	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	6P0.75	1	100	meter	100
20	control motor EM-cp-A07	electrical room 11KV bus	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	8C0.75	1	100	meter	100

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۵۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴


۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

21	current transmitter	electrical room 11KV bus	electrical room CB02	twisted pair & shielded instrument	1P1	1	100	meter	100
22	Oil heater	LCP-COMP-HEATER& instrumrnt	blower oil unit	N2XY, 0.6(1)kv	3*4	1	100	meter	100
23	Oil heater	LCP-COMP-HEATER& instrumrnt	Gearbox oil unit	N2XY, 0.6(1)kv	3*4	1	100	meter	100

-۲۷- تامین متریال، ساخت و نصب استراکچر راه دسترسی به ولو بای پس کمپرسور، متناسب با جدول

متریال و تصویر پیوست همچنین نصب رک ابزار دقیق بر روی این استراچکر با پیمانکار می باشد. ضمناً

نردبال این راه دسترسی بایستی شامل حفاظ گیر پشت مشابه Monkey ladder های دیگر نیز باشد.

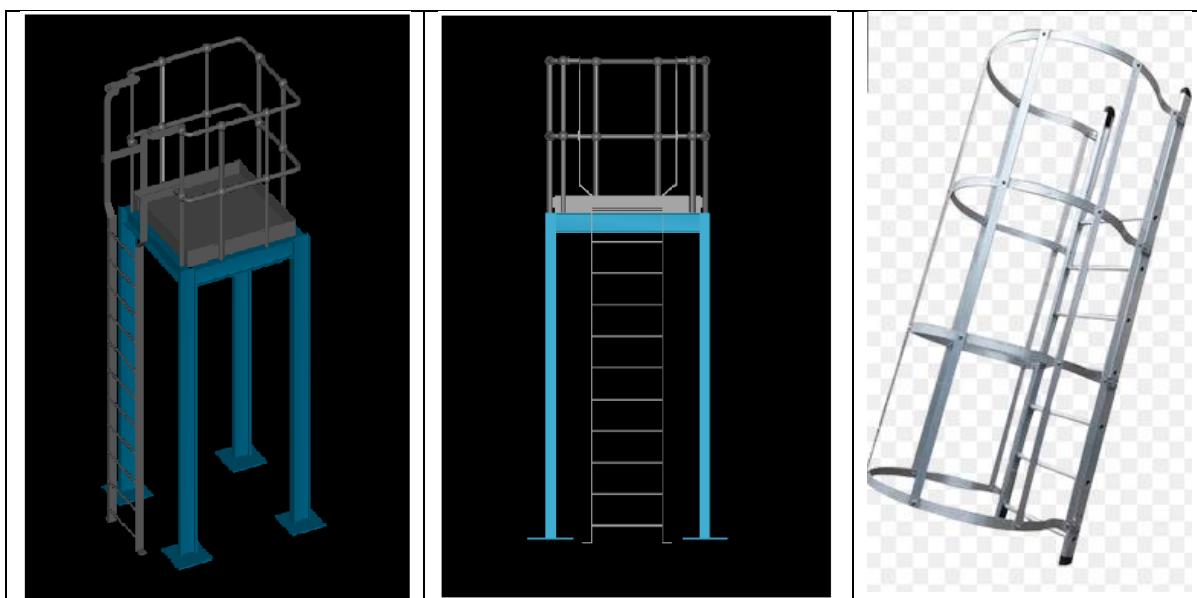

ROW	Description	unit	Qty.
1	IPE 140	Meter	16
2	PIPE 1 1/2"	Meter	8
3	PIPE 3/4"	Meter	10
4	L 60*60*6	Meter	8
5	PL 300*300*10	PCs	4
6	PL 1000*150*6	PCs	3
7	Expansion Bolt	PCs	16
8	ELBOW 1 1/2"	PCs	4
9	Human guard	PCs	1

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۱۵۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱۵۵

-۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

-۲۸- مجدداً یاد آور می شود کافرما فقط خود موتور MV، خود کمپرسور و خود گیربکس را تامین می نماید و وظیفه تامین مابقی تجهیزات برای راه اندازی کمپرسور و اتصالات مکانیکی و الکتریکی با پیمانکار می باشد.

-۲۹- تامین کلیه تجهیزات، ابزار آلات و ماشین آلات جهت اجرای پروژه (دستگاه های جوش، برش، آچار آلات، دریل، پیکور، جرثقیل، سرکابل زن، میکسر بتن و ...) تماماً با پیمانکار می باشد، ماشین آلات و ابزار آلات باید گواهینامه های و مجوزات لازم را جهت اخذ تاییدیه ایمنی کارفرما مطابق دستور العمل ایمنی پیوست قرارداد داشته باشند. ایمنی سایت از ورود ماشین و ابزار آلاتی که تاییده های لازم را نداشته باشند به سایت جلوگیری می کند و مسئولیت این موضوع با پیمانکار می باشد.

-۳۰- پرسنل پیمانکار بایستی کلیه مجوزات لازم جهت ورود به سایت را مطابق دستورالعمل ایمنی کارفرما داشته باشند. (مجوزاتی از قبیل انجام معاینات طب کار و سایر تست های مورد نیاز منجمله نوار مغز برای کار در ارتفاع و ...) این موارد در دستورالعمل ایمنی پیوست قرارداد ذکر شده است و بایستی تمام موارد آن رعایت گردد.

-۳۱- پیش از شروع پروژه و ظرف یک هفته پس از ابلاغ قرارداد پیمانکار برای برگزاری جلسه K.O.M به همراه نفرات اصلی پیمانکار منجمله نفر ایمنی و مدیر پروژه در سایت حضور یابند. همچنین پیمانکار بایستی ITP مربوط به قرارداد را جهت بررسی و تایید کافرما ظرف یکماه پس از ابلاغ قرارداد ارسال نماید.

-۳۲- کالاهای تامین خارج بایستی گواهی اصالت کالا داشته باشند.

-۳۳- پیمانکار بایستی دستورالعمل WPS مربوط به تمامی حوزه های کاری را جهت بررسی و تایید کافرما مطابق استاندارد های جوشکاری ارسال نماید. و موارد بازرگانی جوشها در ITP در نظر گیرد.

-۳۴- پیمانکار بایستی با هماهنگی با واحد IT کافرما جهت دریافت و اخذ valid IP و اکانت سیستم اداری کارفرما برای ثبت درخواست های ورود و خروج پرسنل خود به سایت اقدام نماید و بدین منظور یک نفر کارشناس اداری برای این کار ضروری می باشد.

-۳۵- پیمانکار جهت اجرای روزانه فعالیت ها نیاز به اخذ پرمیت دارد و بایستی با هماهنگی با بهره برداری سیستم نسبت به اخذ پرمیت روزانه اقدام نماید. انجام فعالیت بدون داشتن پرمیت به هیچ وجه مورد

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۱۵۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

پذیرش نمی باشد و به شدت با این امر برخورد خواهد شد و در صورت رخداد حوادث مسئولیت کامل آن
با پیمانکار می باشد.

- ۳۶- ایاب و ذهب، اسکان و غذای پرسنل پیمانکار با خود پیمانکار می باشد.
- ۳۷- تمام تجهیزات ابزار دقیق تامینی بایستی مطابق با تجهیزات ذکر شده در استناد قرارداد باشد و تمامی آنها گواهی کالیبراسیون داشته باشند.
- ۳۸- با توجه به ناحیه فعالیتی پیمانکار و مباحثت اینمی ممکن است برخی فعالیتها نظیر جوشکاری و برش کاری و ... در زمان در سرویس بودن واحد امکان پذیر نباشد و انجام این فعالیتها منوط به شاتدانهای برنامه ریزی شده باشد و پیمانکار بایستی آمادگی انجام فعالیت را در زمانهای شاتدان و با تعداد نفرات بالا را داشته باشد.
- ۳۹- مدت زمان اجرای این قرارداد یک سال از زمان ابلاغ می باشد.
- ۴۰- در صورت تأخیر غیرمجاز پیمانکار به ازای هر هفته تأخیر غیر مجاز مبلغ ۵.۰ درصد قرارداد تا سقف ۵ درصد قرارداد جریمه می گردد.
- ۴۱- در صورتیکه اجرا با نقشه هایی ارسالی به پیمانکار بنا به دلایل فنی (البته با تایید کارما) تغییر پیدا کرد. تهیه نقشه ازبیلت با پیمانکار می باشد.
- ۴۲- کانکشن کابلها به سیستم کنترل و لاجیک نویسی حتما در حضور DCS man کافرما و در زمان شاتدان انجام گردد.

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۱۵۶ از ۱۱۵۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱۵۵

- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

جدول مربوط به سیگنال‌های ارسالی از تابلو هیتر مرکزی به تابلوی CB02 بابت سیگنال‌های مربوط به هیترهای یونیت روغن گیربکس و یونیت روغن بلؤئر کمپرسور هفتم (CP-A07).

CABLE		LCP					RIO			SIGNAL				
CABLE TAG	CABLE SIZE	LCP TAG	WIRE NO./PAIR NO.	LCP TER.	LCP STRIP	JUMPED TER.	TO	RIO STRIP	TER.	I/O TAG	DESCRIPTION	SIGNAL TYPE	SIGNAL FORM	
CB02/LCP-Spare-Comp-HE/D1	120x0.75	LCP-Spare-Comp-HE	C1 , C2	HOLD	HOLD	-	RIO-CB02	LCP-COMP-HE		HOLD	HE-A07.1-HP	SPARE COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1,HEATER PMT	DO	Dry
			C3 , C4	HOLD		-				HOLD	HCST-HE-A07.1	SPARE COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1,ON/OFF	DO	Dry
			C5 , C6	HOLD		-				HOLD	HCST-HE-A07.2	SPARE COMP(CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2,ON/OFF	DO	Dry
			C7 , C8	HOLD		-				HOLD	HE-A07.1-LR	SPARE COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1, LOCAL-REMOTE SELECTOR(1=REMOTE)	DI	NO-Dry
			C9 , C10	HOLD		-				HOLD	XSR-HE-A07.1	SPARE COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1,RUNNING	DI	NO-Dry
			C11 , C12	HOLD		-				HOLD	XSF-HE-A07.1	SPARE COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1,FAULT	DI	NO-Dry
			C1 , C2	HOLD		-				HOLD	HE-A07.2-LR	SPARE COMP CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2, LOCAL-REMOTE SELECTOR(1=REMOTE)	DI	NO-Dry
			C3 , C4	HOLD		-				HOLD	XSR-HE-A07.2	SPARE COMP(CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2,RUNNING	DI	NO-Dry
CB02/LCP-Spare-Comp-HE/D2	120x0.75		C5 , C6	HOLD		-				HOLD	XSF-HE-A07.2	SPARE COMP CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2,FAULT	DI	NO-Dry

جدول مربوط به سیگنال‌های ارسالی از تابلو JB1-CP-A07 به تابلوی CB02 بابت سیگنال‌های رک ابزار دقیق بلؤئر، دمای سیم پیچ و یاتاقان الکتروموتور مربوط به کمپرسور هفتم (CP-A07).

CB02/JB1-CP-A07/A1	2P0.75	JB1-CP-A07	P1	1 , 2	X1	-	RIO-CB02	JB1-CP-A07	1 , 2	PDT-A29.1	SPARE COMP(CP-A07), DIFF PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
			P2	3 , 4		-			3 , 4	PIT-A72.1B	SPARE COMP (CP-A07), PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
CB02/JB1-CP-A07/A2	2P0.75	JB1-CP-A07	P1	5 , 6	X1	-	RIO-CB02		5 , 6	PIT-A48.1B	SPARE COMP (CP-A07), PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
			P2	7 , 8		-			7 , 8	TIT-A58.1	SPARE COMP (CP-A07) OUTLET, TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
MCC-CORE2/JB1-CP-A07/A	6P0.75	JB1-CP-A07	P1	9 , 10	X1	-	RIO-MCC-CORE2	MCC-CP-A07	9 , 10	TIT-CP-A07.1	SPARE COMP(CP-A07), CP-A07, WINDING A TEMPERATURE	AI	4..20mA
			P2	11 , 12		-			11 , 12	TIT-CP-A07.2	SPARE COMP(CP-A07), CP-A07, WINDING B TEMPERATURE	AI	4..20mA
			P3	13 , 14		-			13 , 14	TIT-CP-A07.3	SPARE COMP(CP-A07), CP-A07, WINDING C TEMPERATURE	AI	4..20mA
			P4	15 , 16		-			15 , 16	TIT-CP-A07.7	SPARE COMP(CP-A07), CP-A07, BEARING TEMPERATURE DE	AI	4..20mA
			P5	17 , 18		-			17 , 18	TIT-CP-A07.8	SPARE COMP(CP-A07), CP-A07, BEARING TEMPERATURE NDE	AI	4..20mA

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۵۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

جدول مربوط به سیگنال‌های ارسالی از تابلو CB02 به تابلو JB1-CP-A07-OBL باست سیگنال‌های یونیت روغن بلؤر، مربوط به کمپرسور هفتم (CP-A07).

CB02/JB1-CP-A07-OBL/D	4C0.75	JB1-CP-A07-OBL	C1, C2	1, 2	X1	-	RIO-CB02	JB1-CP-A07-OBL	1, 2	LS-A92.1	SPARE COMP (CP-A07) Oil Tank, LEVEL SWITCH,LOW	DI	NO-Dry
			C3, C4	4, 5		-	RIO-CB02		3, 4	LSLL-A92.1	SPARE COMP (CP-A07) Oil Tank, LEVEL SWITCH,LOW LOW	DI	NO-Dry
CB02/JB1-CP-A07-OBL/A1	2P0.75	JB1-CP-A07-OBL	P1	7, 8		-	RIO-CB02		5, 6	PDIT-A78.1	SPARE COMP(CP-A07) Oil Input, DIFF PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
			P2	10, 11		-	RIO-CB02		7, 8	PIT-A44.1	SPARE COMP Oil Input, PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
CB02/JB1-CP-A07-OBL/A2	2P0.75	JB1-CP-A07-OBL	P1	13, 14		-	RIO-CB02		9, 10	TIT-A59.1	SPARE COMP Lub Oil, TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
			P2	16, 17		-	RIO-CB02		11, 12	FIT-M36.1	SPARE COMP Lub System Cooling Water, FLOW INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA

جدول مربوط به سیگنال‌های ارسالی از تابلو CB02 به تابلو JB1-CP-A07-OGB باست سیگنال‌های یونیت روغن گیربکس، مربوط به کمپرسور هفتم (CP-A07).

CB02/JB2-CP-A07-OGB/A1	2P0.75	JB2-CP-A07-OGB	P1	1, 2	X2	-	RIO-CB02	JB2-CP-A07-OGB	1, 2	PDIT-A47.1	SPARE COMP(CP-A07) Gear Box Oil Input, DIFF PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
			P2	4, 5		-	RIO-CB02		3, 4	PIT-A49.1	SPARE COMP(CP-A07) Gear Box Oil Input, PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
CB02/JB2-CP-A07-OGB/A2	2P0.75	JB2-CP-A07-OGB	P1	7, 8		-	RIO-CB02		5, 6	TIT-A60.1	SPARE COMP(CP-A07) Gear Box Oil Input, TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
			P2	10, 11		-	RIO-CB02		7, 8	FIT-M37.1	SPARE COMP (CP-A07) Lub System Cooling Water, FLOW INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA

جدول مربوط به سیگنال‌های ارسالی از فلومتر FIT-E32.1 به تابلو CB02 باست سیگنال‌های فلو آب فلاشینگ، مربوط به کمپرسور هفتم (CP-A07).

CB02/FIT-E32.1/A	1P1	FIT-E32.1	P1	-	-	-	RIO-CB02		17, 18	FIT-E32.1	Spare Compressor Spray Water, FLOW INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA
------------------	-----	-----------	----	---	---	---	----------	--	--------	-----------	--	----	---------

جدول مربوط به سیگنال‌های ارسالی از سلوونوئید ولو آب SOV-E32A-COM به تابلو CB02 باست سیگنال‌های قطع ووصل سلوونوئید ولو آب ماشینری، مربوط به کمپرسور هفتم (CP-A07). همچنین این ولو دارای فیدبک های Close و Open نیز می‌باشد که با استیتی این سیگنال‌ها به همراه کابل آن نیز در فعالیت پیمانکار دیده شود.

CB02/SOV-E32A COM/D	2C2.5	SOV-E32A-COM	C1, C2	-	-	-	RIO-CB02		13, 14	SOV-E32A-COM	Spare Compressor (CP-A07), ON-OFF VALVE, COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)
CB02/SOV-E32.1.A	2C2.5	SOV-E32A-COM	C1, C2	-	-	-	RIO-CB02		14, 15	SOV-E32.1.A	Spare Compressor (CP-A07), ON-OFF VALVE, feed back open position	DI	Dry
CB02/SOV-E32.1.B	2C2.5	SOV-E32A-COM	C1, C2	-	-	-	RIO-CB02		16, 17	SOV-E32.1.B	Spare Compressor (CP-A07), ON-OFF VALVE, feed back close position	DI	Dry

تجدید مناچه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۵۸ از ۱۵۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱۵۵

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

جدول مربوط به سیگنال‌های ارسالی از ویبره VT(H&V) و پوزیشن سوئیچ به تابلوی CB02 بابت سیگنال‌های ویبره و موقعیت بلوار، مربوط به کمپرسور هفتم (CP-A07).

CB02/VT(H)-A18.1A/A	1P1	VT(H)-A18.1A	P1	-	-	RIO-CB02	FIELD-AI-EX	25 , 26	VT(H)-A18.1A	SPARE COMPRESSOR (CP-A07), VIBRATION TRANSMITTER	AI	4..20mA
CB02/VT(V)-A18.1B/A	1P1	VT(V)-A18.1B	P1	-	-	RIO-CB02		27 , 28	VT(V)-A18.1B	SPARE COMPRESSOR (CP-A07), VIBRATION TRANSMITTER	AI	4..20mA
CB02/ZS-A02.6/D	2C1	ZS-A02.6	C1 , C2	-	-	RIO-CB02		13 , 14	ZS-A02.6	SPARE COMPRESSOR (CP-A07), POSITION SWITCH	DI	NO-Dry

I/O لیست مربوط به این سیگنال‌ها، همچنین سیگنال‌های مربوطه از سمت فیدرها بر ق و موتور MV و همچنین موتورهای LV پمپ‌های یونیت روغن به شرح جدول زیر آورده شده است.

TAG	SH	Loc	DESCRIPTION	SIGNAL TYPE	SIGNAL FORM	WIRING TYPE	SIGNAL LOC	HAZ	RIO	POWER
PIT-A48.1B	152	10-D	Standby Compressor (CP-A07), PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
HCST-HE-A07.2	152	13-D	STANDBY COMP (CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2, ON/OFF	DO	Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
HE-A07.2-LR	152	13-D	STANDBY COMP(CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2, LOCAL-REMOTE SELECTOR(1= REMOTE)	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
TIT-A58.1	152	13-D	Standby Compressor (CP-A07) OUTLET, TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
XSF-HE-A07.2	152	13-D	STANDBY COMP (CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2,FAULT	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
XSR-HE-A07.2	152	13-D	STANDBY COMP(CP-A07) GB HEATER, HE-A07.2,RUNNING	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
SOV-E32.1-COM	152	2-B	M.W FOR Standby Compressor (CP-A07), ON-OFF VALVE, COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	FIELD		RIO-CB02	NA
ZS-SOV-E32.1.A	152	2-B	M.W FOR Standby Compressor (CP-A07), ON-OFF VALVE, OPEN POSITION	DI	NO-Dry	2 WIRE	FIELD		RIO-CB02	NA
ZS-SOV-E32.1.B	152	2-B	M.W FOR Standby Compressor (CP-A07), ON-OFF VALVE, CLOSE POSITION	DI	NO-Dry	2 WIRE	FIELD		RIO-CB02	NA
PDIT-A78.1	152	3-C	Standby Compressor (CP-A07) Oil Input, DIFF PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power

تجدید مناقدسه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۱۵۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

TIT-A59.1	152	3-C	Standby Compressor Lub Oil, TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
HCST-PU-A07B	152	3-F	STANDBY BLOWER OIL PUMP(MAIN), PU-A07B, COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE2	NA
XSF-PU-A07B	152	3-F	STANDBY BLOWER OIL PUMP(MAIN), PU-A07B, FAULT	DI	NC-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE2	NA
XSR-PU-A07B	152	3-F	STANDBY BLOWER OIL PUMP(MAIN), PU-A07B, RUNNING	DI	NO-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE2	NA
FIT-M36.1	152	3-G	Standby Compressor Lub System Cooling Water, FLOW INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
HCST-HE-A07.1	152	3-H	STANDBY COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1, ON/OFF	DO	Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
HE-A07.1-HP	152	3-H	STANDBY COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1.HEATER PMT	DO	Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
HE-A07.1-LR	152	3-H	STANDBY COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1, LOCAL-REMOTE SELECTOR(1= REMOTE)	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
XSF-HE-A07.1	152	3-H	STANDBY COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1.FAULT	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
XSR-HE-A07.1	152	3-H	STANDBY COMP(CP-A07) BLOWER HEATER, HE-A07.1.RUNNING	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP HEATER LCP		RIO-CB02	NA
FIT-E32.1	152	4-B	Standby Compressor Spray Water, FLOW INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
PIT-A44.1	152	4-C	Standby Compressor Oil Input, PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
LS-A92.1	152	4-E	Standby Compressor (CP-A07) Oil Tank, LEVEL SWITCH LOW	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	NA
LSLL-A92.1	152	4-E	Standby Compressor (CP-A07) Oil Tank, LEVEL SWITCH LOW LOW	DI	NO-Dry	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	NA
HCST-PU-A07A	152	4-F	STANDBY BLOWER OIL PUMP(AUXILIARY), PU-A07A, COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE1	NA
XSF-PU-A07A	152	4-F	STANDBY BLOWER OIL PUMP(AUXILIARY), PU-A07A, FAULT	DI	NC-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE1	NA
XSR-PU-A07A	152	4-F	STANDBY BLOWER OIL PUMP(AUXILIARY), PU-A07A, RUNNING	DI	NO-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE1	NA
SOV-E32A-COM	152	5-B	Standby Compressor (CP-A07), ON-OFF VALVE, COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	NA
VT(H)-A18.1A	152	5-B	Standby Compressor (CP-A07), VIBRATION TRANSMITTER	AI	4..20mA	4 WIRE	COMP JB	H	RIO-CB02	24VDC
VT(V)-A18.1B	152	5-C	Standby Compressor (CP-A07), VIBRATION TRANSMITTER	AI	4..20mA	4 WIRE	COMP JB	H	RIO-CB02	24VDC
ZS-A02.6	152	5-C	Standby Compressor (CP-A07), POSITION SWITCH	DI	NO-Dry	4 WIRE	COMP JB	H	RIO-CB02	24VDC
TIT-A60.1	152	6-C	Standby Compressor (CP-A07) Gear Box Oil Input, TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

PDIT-A47.1	152	6-D	Standby Compressor (CP-A07) Gear Box Oil Input, DIFF PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
PIT-A49.1	152	6-D	Standby Compressor (CP-A07) Gear Box Oil Input, PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
PIT-A72.1B	152	6-D	Standby Compressor (CP-A07), PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
FIT-M37.1	152	6-E	Standby Compressor Lub System Cooling Water, FLOW INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power
CP-A07-EMG	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, EMERGENCY STOP PB	DI	NC-Dry	2 WIRE	LCB		RIO-CB02	NA
HCSP-CP-A07	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, STOP COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	SWG		RIO-MCC-CORE2	NA
HCST-CP-A07	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, START COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	SWG		RIO-MCC-CORE2	NA
IT-CP-A07	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, CURRENT TRANSMITTER	AI	4..20mA	4 WIRE	SWG		RIO-MCC-CORE2	NA
TIT-CP-A07.1	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, WINDING A TEMPERATURE	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-MCC-CORE2	Loop Power
TIT-CP-A07.2	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, WINDING B TEMPERATURE	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-MCC-CORE2	Loop Power
TIT-CP-A07.3	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, WINDING C TEMPERATURE	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-MCC-CORE2	Loop Power
TIT-CP-A07.7	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, BEARING TEMPERATURE DE	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-MCC-CORE2	Loop Power
TIT-CP-A07.8	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, BEARING TEMPERATURE NDE	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-MCC-CORE2	Loop Power
XSA-CP-A07	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, AVAILABILITY	DI	NC-Dry	2 WIRE	SWG		RIO-MCC-CORE2	NA
XSF-CP-A07	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, FAULT	DI	NC-Dry	2 WIRE	SWG		RIO-MCC-CORE2	NA
XSR-CP-A07	152	7-C	STANDBY COMP(CP-A07), CP-A07, RUNNING	DI	NO-Dry	2 WIRE	SWG		RIO-MCC-CORE2	NA
HCST-PU-A07C	152	8-D	STANDBY COMP(CP-A07) GB OIL PUMP(MAIN), PU-A07C, COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE1	NA
XSF-PU-A07C	152	8-D	STANDBY COMP(CP-A07) GB OIL PUMP(MAIN), PU-A07C, FAULT	DI	NC-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE1	NA
XSR-PU-A07C	152	8-D	STANDBY COMP(CP-A07) GB OIL PUMP(MAIN), PU-A07C, RUNNING	DI	NO-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE1	NA
HCST-PU-A07D	152	8-E	STANDBY COMP(CP-A07) GB OIL PUMP(AUXILIARY), PU-A07D, COMMAND	DO	NO-Wet(24Vdc)	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE2	NA
XSF-PU-A07D	152	8-E	STANDBY COMP(CP-A07) GB OIL PUMP(AUXILIARY), PU-A07D, FAULT	DI	NC-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE2	NA
XSR-PU-A07D	152	8-E	STANDBY COMP(CP-A07) GB OIL PUMP(AUXILIARY), PU-A07D, RUNNING	DI	NO-Dry	2 WIRE	MCC		RIO-MCC-CORE2	NA
PDIT-A29.1	152	9-D	Standby Compressor (CP-A07), DIFF PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER	AI	4..20mA	2 WIRE	COMP JB		RIO-CB02	Loop Power

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۶۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/ق

۷- پیوست دو، شرح کار و
مشخصات فنی

نقشه loop diagram مربوط به نحوه کانکشن از تجهیزات به سیستم کنترل در فایل پیوست به نام Loop diagram آورده شده است.

۴۳- کابل‌های MV بایستی از برنده ابهر یا البرز تامین گردد، کابل‌های LV و ابزار دقیق و کنترل از برندهای زر کابل، ابهر، البرز، یزد یا سیمکو تامین گردد.

با توجه به شرح خدمات فوق که سعی شده است دیتیل تجهیزات مهم آن جهت همسنگ سازی پیشنهاد قیمت‌ها به تفکیک آورده شود، مقتضی است پیمانکار تمامی هزینه‌های جانبی مانند جوشکاری، کابل کشی، خرید پیچ و مهره، فلنچ، فلکسیبل، لوله کاندویت و... که سایت‌ران بوده و نیاز به دیتیل نویسی ندارد را نیز در آیتم‌های آورده شده در شرح خدمات فوق ببیند.

به جهت اینکه بررسی جدول پیشنهادی قیمت در مناقصه راحت‌تر شود آیتم‌های ارائه شده در شرح خدمات به صورت کلی در جدول پیشنهاد قیمت تأمین و اجرا در بخش پیشنهاد قیمت آورده شده است و پیمانکار بایستی تمامی قیمت‌های برآورده خود را از شرح خدمات فوق به صورت خلاصه در جدول پیشنهاد قیمتی ذیل ببیند. لازم به توضیح است پیمانکاری که در مناقصه برنده می‌شود بایستی یک هفته پس از ابلاغ قرارداد CBS پروژه بر اساس قیمت‌های کلی که در جدول ذیل ارائه می‌نماید بر روی جدول‌های دیتیل شرح خدمات شکسته و با برنامه زمانبندی تامین واجرا به کارفرما ارائه نماید. قیمت شکسته شده CBS که از طرف پیمانکار پس از برنده شدن ارائه می‌گردد نبایستی از تفکیک قیمت ارائه شده در جدول پیشنهاد قیمتی کلی برای هر بخش بالاتر رود.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۲ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

- پیوست سه، نقشه ها و مدارک
فنی

پیوست سه، نقشه ها و مدارک فنی

تمامی نقشه ها و مدارک پرداختی در بخش های مختلف در صورت لزوم در پیوست مستندات فنی اسناد مناقصه موجود بوده که **تهیه پرینت، مهر و امضای تمامی اسناد موجود در پیوست (در صورت ارائه) الزامی می باشد.** عدم ارسال و یا ارسال ناقص نقشه ها ضمن خدشه به صلاحیت فنی مناقصه گر، نافی تعهد مناقصه گر بر تایید نقشه ها و مدارک نبوده و مهر و امضای این صفحه به معنی تایید تمامی نقشه ها و مدارک پیوست اسناد مناقصه می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش
برنامه ریزی و مدیریت پروژه

صفحه ۱۶۳ از ۱۶۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

پیوست چهار، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۱- پیمانکار می‌بایست نمودار چارت سازمانی خود به همراه ماتریس مسئولیت در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای کار تهیه و قبل از پایان تجهیز کارگاه به تایید دستگاه نظارت برساند.

تبصره ۱- با توجه به شرایط و ویژگی‌های پروژه، نیروهای انسانی پیمانکار که در اجرای مفاد قرارداد بکار گرفته می‌شوند می‌بایست از تجربه و تخصص کافی در زمینه طراحی، نصب و اجرا باشند.

تبصره ۲- دفتر فنی کارگاه که یکی از واحدهای مهم پیمانکار در زمان اجرا محسوب می‌گردد، به محض شروع عملیات اجرایی می‌بایست در کارگاه استقرار یافته و قادر به انجام خدمات فنی (برنامه ریزی، کنترل پروژه، دفتر مهندسی، کنترل کیفی وغیره) باشند.

۲- کلیه عوامل کلیدی پیمانکار می‌بایست قبل از شروع به کار، به دستگاه نظارت به صورت کتبی به همراه مدارک و سوابق کاری معرفی گردیده و مورد تایید مکتوب دستگاه نظارت واقع گردد.

۳- با توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، پیمانکار موظف است در پایان هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات پرسنلی با فرمت تعیینی توسط دستگاه نظارت اقدام نماید و همچنین هر زمانی که دستگاه نظارت اعلام نماید، اطلاعات پرسنلی خود را به نحو مورد نیاز ناظر در اختیار قرار دهد.

۴- پیمانکار موظف است، در هنگام ارائه صورت وضعیت‌های خود، لیست بیمه پرداخت شده کارگران خود در دو ماه قبل به همراه تائیدیه آخرین لیست پرداخت حقوق پرسنل را که به تایید دستگاه نظارت رسیده است تحويل نماید. در صورت عدم ارائه مدارک مذکور صورت وضعیت وی پرداخت نخواهد شد و پیمانکار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است در صورت تأخیر پرداخت حقوق پرسنل بیش از یک ماه کارفرما راً طبق لیست مطالبات ارائه شده توسط پیمانکار اقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هزینه بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

۵- پیمانکار موظف است حداکثر ۷ روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه هیستوگرام منابع، احجام مطابق با رویه‌های مصوب مورد تایید کارفرما MCI و PMS، لیست مدارک مهندسی، CBS) کاری و ساختار شکست هزینه اقدام و همچنین حداکثر ۷ روز پس از آن نسبت به رفع کامنت‌های احتمالی و اخذ تایید نهایی کارفرما و دستگاه نظارت اقدام نماید.

۶- پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین موارد تضمین کیفیت مطابق با روال ذیل اقدام نماید.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش
برنامه ریزی و مدیریت پروژه

صفحه ۱۶۴ از ۱۶۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

- a. ارائه گزارشات مطابق دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه از طریق نرم افزار PMIS
- b. کلیه مراحل کار با استی مطابق با برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت به نحوی که تاخیر در برنامه زمانبندی ایجاد نگردد صورت پذیرد.
- c. پیمانکار موظف است مدارک مهندسی تحويلی به مرکز اسناد کارفرما بر اساس دستورالعمل شماره گذاری کارفرما شماره گذاری نموده و همچنین نسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طریق نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی درسا اقدام نماید.
- d. پیمانکار موظف است نسبت به انجام تست های سرد و گرم، تهیه و تکمیل چک لیستهای پیش راه اندازی و تست با نرم افزار ICAPS ، مستند سازی اثبات ظرفیت، صدور گواهی های لازم از طریق متدولوژی OPERCOM در مراحل مختلف راه اندازی و اخذ تاییدیه کارفرما و دستگاه نظارت اقدام نماید و در این راستا پیمانکار موظف است تیم پیاده سازی متدولوژی OPERCOM را در زمان مقتضی طبق اعلام نیاز دستگاه نظارت در سایت مستقر نماید.
- e. پیمانکار موظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و دیتابیس های برنامه ریزی، کنترل کیفی، پیش راه اندازی و راه اندازی مرتبط، در موقع تعیین شده در هر دوره زمانی با نظر دستگاه نظارت اقدام نماید.
- f. پیمانکار موظف است نسبت به ارائه Final Book شامل As Built ، دستورالعمل ها، مدارک مهندسی، قراردادها، الحاقیه ها، مکاتبات اصلی ، Order Number ، مدارک کنترل کیفی، مدارک خرید بالاخص درس آموخته های پروژه مطابق با رویه های مصوب مورد تایید کارفرما اقدام نماید.
- g. در صورت عدم ارائه خدمات مدیریت پروژه شامل: موارد برنامه ریزی، کنترل پروژه، منابع انسانی و ماشین آلات، موارد کنترل کیفی و تضمین کیفیت و راه اندازی توسط پیمانکار ، مطابق با قوانین موجود و تا سقف ۵ درصد از مبلغ هر صورت وضعیت ارسال شده توسط پیمانکار، جریمه در نظر گرفته خواهد شد.
- h. پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت ها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تایید کارفرما که به وی ابلاغ میشود، استفاده نماید.
- ۷- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فنی، تهیه مدل سه بعدی، نقشه های اولیه و تفصیلی قسمتهای مختلف اقدام و به تایید کارفرما و دستگاه نظارت رسانده و سپس نسبت به تامین، ساخت، نصب، تست و راه اندازی اقدام نماید.
- ۸- رعایت کلیه الزامات کنترل کمی و کیفی کالا و تجهیزات و خدمات مربوطه که در شرح وظایف قید شده و یا در استانداردهای عمومی طراحی، ساخت و بازرگانی تجهیزات ذکر گردیده و یا در مشخصات فنی خصوصی سفارش خرید کالا موجود می باشد بر عهده پیمانکار است.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گهر <small>GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.</small>		
صفحه ۱۹۵ از ۱۶۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴	۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

۹- با توجه به اینکه نظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت پیمانکار از طرف کارفرما به دستگاه نظارت واگذار گردیده است، کارفرما و دستگاه نظارت جهت کنترل کیفی و کمی کار حق دارد از کلیه مراحل کار شامل انتخاب فروشنده/سازنده، تامین کالا و متریال، ساخت تجهیزات پروژه، نظارت بر نصب، تست و راه اندازی توسط بازرگانی و ناظرین مقیم و یا موردنی نظارت دقیق به عمل آورد. در این راستا همکاری و هماهنگی های مربوطه از وظایف پیمانکار می باشد.

۱۰- اخذ تاییدیه از کارفرما و دستگاه نظارت در تمامی مراحل کار از مرحله انتخاب فروشنده، تامین مواد، کالا و ساخت تجهیزات پروژه تا قبل از صدور برنامه، حمل و نقل، تخلیه و جابجایی، نحوه نگهداری و انبار، واکنش های فیزیکی و شیمیایی، عملیات قبل از نصب و پس از نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تا پایان تحويل موقت از وظایف پیمانکار می باشد و می بایست گزارشات کاملی از روند انجام آن در چارچوب فرمتهای، جداول و ... به کارفرما و دستگاه نظارت ارائه نماید و همچنین لازم به ذکر است با توجه به شرایط عمومی پیمان هیچ کدام از این تائیدیه ها رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد.

۱۱- پیمانکار نقشه های کارگاهی را که Native نقشه های جزئیات ساخت قطعات و قسمت هایی از کار است، در صورت نیاز ضمن اجرای کار، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تهیه می کند و در سه نسخه، که یک نسخه آن فایل دیجیتال می باشد توسط Hard Disk/Flash memory /DVD تسلیم دستگاه نظارت می نماید.

۱۲- پیاده سازی و راهبری نظام یکپارچه تضمین کیفیت شامل صدور QCP و ITP، SQ، NCR، TQ و تهیه دیتابیس های مربوطه جهت جمع بندی موضوع در تعهد پیمانکار می باشد.

۱۳- پیمانکار موظف است هر گونه مغایرت در مراحل اجرای کار را مطابق با استانداردها، استناد و مدارک فنی، نقشه های NCR-Nonconformity Report تایید شده جهت اخذ تصمیم نهایی به کارفرما و دستگاه نظارت اعلام نماید

۱۴- هیچ قسمت از کارها بدون تصویب نماینده کارفرما و تنظیم صورتمجلس و صدور QC form آنها، نباید دفن یا پوشانیده گردد و می باید فرصت کافی جهت اندازه گیریهای لازم به نماینده کارفرما داده شود.

۱۵- پیمانکار موظف است کلیه تغییرات پروژه CR-CP مطابق با دستورالعمل ابلاغی به همراه مستندات مربوطه جهت تصمیم نهایی به کارفرما و دستگاه نظارت اعلام نماید.

۱۶- ارائه دستورالعمل های تهیه متریال / تجهیزات، ساخت، نصب و نیز دستورالعمل های کنترل کیفی به همراه چک لیستهای مربوطه جهت تایید کارفرما و دستگاه نظارت در کلیه بخش‌های پروژه اعم از تامین متریال، ساخت، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات، جوش، آزمونهای غیر مخرب، کنترل HSE، انبارداری و نگهداری تجهیزات reservation و سایر دستورالعمل ها بر عهده و هزینه پیمانکار است. این دستورالعمل ها می بایست حداقل ۲ هفته قبل از شروع هر بخش از کار و یا در صورت لزوم بنا به تشخیص دستگاه نظارت در هر بازه زمانی مطابق با استانداردهای مربوطه و نیز مشخصات فنی پروژه به تائید رسانیده و می بایست کلیه فعالیتهای خود را بر اساس دستورالعمل های

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش
برنامه ریزی و مدیریت پروژه

صفحه ۱۶۶ از ۱۶۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

مصوب (مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت) ارائه نماید و همچنین لازم به ذکر است برای انجام آزمون های مخرب و غیر مخرب و برخی تست ها بنا به تشخیص دستگاه نظارت پیمانکار موظف به بکارگیری شرکت ثالث مورد تائید دستگاه نظارت می باشد و کلیه هزینه های مربوطه در تعهد پیمانکار می باشد.

۱۷- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه روشهای هماهنگی مکاتبات، HSE Plan، دستورالعمل های ایمنی مرتبط با موضوع قرارداد، اسناد و مدارک کیفی شامل ITP، WPS، PQR و ... و اخذ تاییدیه از کارفرما و دستگاه نظارت طرف مدت تعیین شده از جانب دستگاه نظارت اقدام نماید.

۱۸- پیمانکار موظف است گزارش ماهیانه را بر اساس فرمت مصوب که اهم موارد آن به شرح ذیل می باشد تهیه نماید:
a. اعلام شرح جزئیات عملیات اجرایی - احجام دقیق و درصد فعالیتهای انجام شده براساس برنامه زمانبندی

تفصیلی (شامل مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت تجهیزات و ابینیه).

b. گزارش وضعیت تامین تجهیزات و مدارک مهندسی PSR-MCI-MDR

c. گزارش وضعیت مصالح (وارده و پای کار).

d. تعداد و نوع ماشین الات مورد نیاز (برنامه ریزی شده، موجود، فعال، تحت تعمیر و آماده به کار).

e. آمار نیروی انسانی با ذکر مهارتهای مختلف (برنامه ریزی شده و فعال).

f. تعیین و گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تاخیرات حادث احتمالی و مقایسه با برنامه زمانبندی مصوب قرارداد و میزان تاثیر بر مسیر بحرانی با ذکر علتها و پیشنهادات برای اصلاح روند کارها در انتطاق با برنامه از طریق Reschedule نمودن برنامه زمانبندی اقدام نماید.

g. بروز رسانی ماهانه مسیر/مسیرهای بحرانی پروژه

h. اعلام آخرین وضعیت قرارداد و مالی پروژه شامل (الحاقیه های زمانی و مالی، استهلاک پیش پرداخت و یا مبلغ علی الحساب، صورت وضعیت ها و مطالبات)

i. مشکلات و موانع اجرایی کلی و طی ماه

j. تصاویر ابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پیشرفت کار.

k. اعلام اهم مکاتبات مهم پروژه

l. اعلام وضعیت بندهای صورتجلسات در قالب دیتابیس مربوطه

۱۹- پیمانکار موظف است نسبت به تبادل نظر و شرکت در جلسات با کارفرما و دستگاه نظارت به منظور بررسی و اخذ تصمیمات لازم برای حل و فصل مسائل فنی، کیفی و اجرایی پروژه و ایجاد هماهنگی های لازم جهت تسريع در انجام فعالیت های پروژه طبق برنامه اعلامی دستگاه نظارت اقدام نماید.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۶۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۹/۱۰۰۹ ق

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قرارداد ها

پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها

دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها به پیوست استناد ارائه شده مهر و امضای آن الزامی بوده و بایستی به همراه استناد مناقصه ارائه گردد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۶۸ از ۱۶۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵ ق

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قراردادها

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش	سطح محترمانگی: عادی	

عنوان مستند : دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	..		تدوین اولیه سند

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهییه، بازنگری	کمیسیون معاملات
۲	تایید	مدیریت سیستم ها، برنامه و بودجه مدیریت قراردادها معاون بازرگانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	دستگاه نظارت قرارداد
۵	اطلاع	

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۹ از ۱۶۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قراردادها

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل تحقق موارد زیر می باشد:

- ایجاد وحدت رویه در تنظیم و نحوه بررسی لایحه تأخیرات

- کاهش ابهام و افزایش شفافیت در روش بررسی تأخیرات

- تبیین جایگاه و مسؤولیت ذیفعان

- حذف فرآیندهای اضافه و کاهش هزینه های ناشی از روند طولانی بررسی تأخیرات

- استقرار فرهنگ ثبت و بررسی تأخیرات در زمان وقوع

از طریق تشرییح روش بررسی تأخیرات، مقاطع زمانی ارائه لایحه تأخیرات، نحوه گردآوری و مستندسازی و نیز مسؤولیت های عامل ذیربطة در رسیدگی به تأخیرات در پیمان ها مشخص گردیده است.

۲- دامنه کاربرد

کلیه پیمان ها و قراردادهای شرکت

تصریه ۱: این دستورالعمل در پیمان هایی که تعهدات قراردادی طرف پیمان منطبق یا زودتر از زمان پیش بینی شده در برنامه زمانبندی مصوب اولیه یا قرارداد تکمیل گردد، کاربرد ندارد.

۳- تعاریف

مدت اولیه پیمان: مدت اولیه انجام تعهدات قراردادی مندرج در موافقت نامه پیمان

مدت پیمان: مجموع مدت اولیه پیمان و تأخیرات مجاز که توسط کارفرما مصوب و ابلاغ گردیده باشد.

دوره انجام کار: دوره زمانی که از تاریخ شروع کار آغاز و در تاریخ تکمیل کل تعهدات طرف پیمان پایان می یابد.

برنامه زمانبندی مصوب اولیه: برنامه زمانبندی که پس از انعقاد پیمان و ابلاغ کار توسط طرف پیمان تهیه و توسط دستگاه نظارت کارفرما تصویب می گردد.

برنامه زمانبندی مبنا: برنامه زمانبندی است که به منظور بررسی تأخیرات (مطابق با جدول ۱) مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره ۲: به طور کلی در این دستورالعمل برنامه زمانبندی مصوب اولیه معادل برنامه زمانبندی مبنا (Baseline) چهت بررسی تأخیرات پیمان میباشد، لیکن در صورتیکه برنامه زمانبندی مصوب اولیه به هر دلیل قابلیت مدل سازی تأخیرات را نداشته باشد، پیمانکار می باشد. براساس زمانبندی کلی قرارداد نسبت به تهیه و تنظیم لایحه تأخیرات اقدام و پس از تائیدیه ارکان پیمان، لایحه تنظیمی پس از تایید کمیسیون معاملات و اخذ مصوبه هیات مدیره شرکت (جهت معاملات کلان)، مبنای بررسی تأخیرات پیمان قرار خواهد گرفت.

برنامه ریزی مجدد (Recovery Plan): بازبینی برنامه زمانبندی به منظور تبیه برنامه زمانبندی جدید برای فعالیت های در دست اجرا و آتی که شامل زمانبندی مجدد Replan و فشرده سازی Catch Up Plan به شرح زیر می باشد:

- زمانبندی مجدد (Replan): ورود اطلاعات واقعی در برنامه زمانبندی مبنا (Baseline) مشتمل بر تاریخ شروع و پایان فعالیت ها همراه با درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها و مدت زمان باقی مانده برای انجام فعالیت ها و متناسب با انتقال کارهای باقی مانده به بعد از تاریخ گزارش گیری و برآورد زمان اتمام کار.

- فشرده سازی (Catch Up Plan): کوتاه کردن زمان برآورد اتمام کار با مقایسه نتایج بدست آمده از بروزرسانی برنامه زمانبندی (Baseline) با برنامه زمانبندی مبنا (Reschedule).

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (نکرار مرتبه اول)



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۷۰ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۳	۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها
-----------------	--------------	---------------------------	---

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تاخیرات قراردادها (سطح محرمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

تبصره ۳: در شرایط خاص، در صورت درخواست مجری طرح / معافون دستگاه نفلارت کارفرما و ارائه گزارش توجیهی جهت بررسی تاخیرات بر اساس برنامه ریزی مجدد (Replan Plan)، این موضوع پس از تایید کمیسیون معاملات و اخذ مجوز مطابق آئین نامه معاملات با عنوان

تاخیس: مدت دیگر انجام کار و با فعالیت دسته از نامه سیاه، شده در بنامه مانند، مصوب.

کل تاخیرات حادث شده: عبارت است از تفاضل زمان اتمام انجام کار / پروژه و مدت زمان اولیه پیمان. (ملاک عمل در بررسی تاخیرات پنهان یا لاین اخراج فعال است. تغییر شده به عنوان باشد).

تاخیرات مجاز: آن پخش از تاخیرات حادث شده که خارج از قصور طرف پیمان تشخیص داده باشد و مطابق با شیوه مندرج در بند

تمدید مدت پیمان: تمدید مدت پیمان به معنی افزودن مدت تا خیرات مجاز مورد تایید کارفرما به مدت اولیه پیمان می باشد. این مدت

کمیته رسیدگی به تا خبرات: کمیته ای مشتمل از دبیر کمیسیون معاملات به عنوان رئیس و اعضای تعیین شده به تشخیص رئیس کمیته بر اساس مسئولیت ها و وظایف.

صور تجلیسه رسیدگی به تاخیرات: صور تجلیسه ای است که در مقاطع رسیدگی به تاخیرات پیمان - جدول مقاطع زمانی رسیدگی به تاخیرات ذیل بند ۶-۲ دستور العمل - و مطابق با فرم صور تجلیسه رسیدگی به تاخیرات یا کد FO2226 تهیه می گردد.

٤ - مراجع و مأخذ

(Society of Construction Law) انجمن حقوق احداث انگلستان، تاریخ و تصدیع

٥ - مسئولیت و اختیار

مسئلہ تغییر و یہ وہ سانے نے کمٹھے سدگر یہ تاخذات

مسئول احیا: کمیته رسیدگی به تاخیرات یا همکاری نماینده دستگاه نظارت کارفرما در قرارداد

٦- نحوه اجرا

فرانلند رسیدگی به تأخیرات با تهیه لایحه تأخیرات توسعه پیمانکار و بررسی آن توسعه مشاور و دستگاه نظارت آغاز می گردد و از طریق مکاتبه دستگاه نظارت با پیس، کمیته به همه ارسلان، مستندات و فرم های مورد تیاز شاما، فرم های مورد تیاز اسلام، میباشد.

- کنترل کفایت مدارک پیمان ها با کد FO2222
 - تاریخچه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2231
 - شناسنامه تأخیرات با کد FO2221
 - نمودار هموشانی تاخیرات با کد FO2230

۱-۶- اعضای کمیته و کارگروه رسیدگی به تاخیرات

اعضای کمیته و کارگروه که دارای حق رای و مسئول امضاء می‌باشند، به شرح ذیل است:

١) رئيس كمبيته: دير كميسيون معاملات

^{۲)} دبیر کمیته: انتصابی، توسط رئیس کمیته که شخص مور نظر مرتبه با حوزه دستور العمل می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۹۵ از ۱۷۱

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱



۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها	شماره محرمانگی: عادی
WI2229	کد مدرک

۳) اعضای کمیته: مدیر مالی، مدیر تامین و تدارکات، مدیر امور مهندسی، مدیر امور حقوقی، مدیر امور قراردادها، مدیر دستگاه

نظرارت کارفرما، سرپرست دفتر مدیریت پروژه و هر شخص ذی ربط دیگر بر حسب نوع قرارداد و به تشخیص رئیس کمیته به

عنوان مدعو

تبصره ۴: مدیر کمیته پس از اخذ نظرات نهایی اعضای کمیته نسبت به تنظیم صورت جلسه کمیته اقدام می نماید.

تبصره ۵: رئیس کمیته می تواند بنا به ماهیت پیمان از سایر افراد مطلع برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

تبصره ۶: در صورت بروز اختلاف در رابطه با نحوه اجرای این دستورالعمل، مسئول تفسیر موضوع و حل اختلاف رئیس کمیته می باشد.

۶-۲- الزامات و شرایط طرح موضوع تأخیرات پیمان ها

مقاطع رسیدگی به تأخیرات پیمان ها به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱ (جدول مقاطع زمانی رسیدگی به تأخیرات)

ردیف	مقاطع زمانی رسیدگی به تأخیرات
۱	به صورت ماهانه به همراه گزارش پیش‌رفت پروژه / پایان مدت اولیه / پایان مدت تمدید / پایان مدت تطویل
۲	اتمام عملیات / تکمیل تعهدات موضوع پیمان یا تحويل موقت
۳	خاتمه یا فسخ پیش از پایان مدت پیمان
۴	تحویل هر یک از گستره ها (Scope) / بخش ها (Area) / واحدها (Unit) در قراردادهایی که امکان تفکیک و تحویل (راه اندازی) موضوع قرارداد به صورت بخشی (مرحله ای) در آن پیش بینی شده باشد.

در صورتیکه پیمان دارای بخش های مستقل قابل تحويل باشد، به طوریکه قابلیت بررسی تأخیرات هر بخش مستقل از یکدیگر وجود داشته باشد، در این صورت تأخیرات هر یک از بخش های مستقلابررسی و نتیجه گیری خواهد گردید.

۶-۳- تحلیل تأخیرات

۱-۳-۶- تحلیل تأخیرات پیمان های فاقد برنامه زمانبندی مدون

در پیمان های که فاقد برنامه زمانبندی مدونی هستند از قبیل مدیریت طرح (MC)، نظرارت عالیه و کارگاهی، بازرگانی شخص ثالث و... تحلیل تأخیرات به روش ذیل انجام خواهد شد:

- رسیدگی به تأخیرات تا مقطع تحويل موقت پس از رسیدگی به تأخیرات مشاور / پیمانکار اجرایی در هر یک از مقاطع مطابق جدول ۱ انجام شده و نتایج آن برای تشخیص و تحلیل تأخیرات ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

- رسیدگی به تأخیرات پس از مقطع تحويل موقت و انجام کامل تعهدات قراردادی (از جمله رسیدگی نهایی به تأخیرات مشاور / پیمانکار اجرایی و تسویه حساب با پیمانکار) بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد صورت خواهد پذیرفت.

۶-۳-۲- تحلیل تأخیرات پیمان های دارای برنامه زمانبندی مدون

برنامه زمان بندی مورد نیاز برای مدل سازی تأخیرات، حداقل باید دارای ویزگی های زیر باشد:

۱- مایلستون های شروع و پایان برنامه مطابق با تاریخ های تعیین شده در پیمان باشند.

۲- مدت زمان برنامه مطابق با مدت زمان مندرج در پیمان باشد.

۳- فعالیت مغلق (Open the End) (به غیر از مایلستون های شروع و پایان) در برنامه وجود نداشته باشد.

۴- تمامی فعالیت ها شبکه برنامه زمانبندی دارای قید ASAP / None باشند و از قیدهای دیگری استفاده نشده باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۷۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قراردادها

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش	سطح محترمانگی: عادی	

تأخیرات پروژه می باشد با فعالیت های مندرج در شبکه برنامه زمانبندی مبنای (Baseline/Recovery Plan) مرتبط شده باشند و ارائه علل تأخیر به تنها ی و بدون برقرار کردن آن ها با فعالیت های مندرج در برنامه زمانبندی مصوب، در رسیدگی به تأخیرات پیمانکار لحاظ نخواهند شد. همچنین تأخیراتی که شناسایی می شوند باید با قضاوت عرفی و منطق مهندسی سازگار باشند.

تحلیل تأخیرات مبتنی بر انجام مراحل به شرح زیر می باشد:

۱-۳-۲-۶- شناسایی تأخیرات ناشی از قصور و خارج از قصور طرف قرارداد.

به منظور شناسایی تأخیرات خارج از قصور پیمانکار و تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار از دو رویکرد زیر می توان استفاده کرد:

۱-۱-۳-۲-۶- رویکرد اول: رویکرد علت - معلولی در این رویکرد مدت تأخیر و علل بروز تأخیرات خارج از قصور پیمانکار شناسایی شده و با لحاظ نمودن در شبکه برنامه زمانبندی مصوب میزان مدت زمان موثر تأخیرات تعیین می شوند.

به این منظور پیمانکار اجرایی می باشد از طریق دستگاه نظارت مربوطه به صورت ماهانه مدت تأخیر و علل بروز تأخیرات را به همراه اسناد مشبته و گزارش پیشرفت پروژه مطابق با فرم ثبت پیشرفت پروژه و تأخیرات با کد FO2221 دستورالعمل به دفتر مدیریت پروژه (PMO) ارسال نماید تا در مقطع رسیدگی به تأخیرات، شناسایی علل تأخیرات سریع تر و با دقت پیشتری صورت پذیرد.

۱-۱-۳-۲-۶- رویکرد دوم: رویکرد معلول - علت

در این رویکرد تاریخ شروع و پایان فعالیت های مسیر بحرانی بر اساس گزارشات روزانه پروژه استخراج شده و تفاضل این تاریخ ها با برنامه مصوب به عنوان میزان تأخیرات رخ داده در نظر گرفته می شوند، سپس علل تأخیرات مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه استناد مشبته قابل قبول از سوی پیمانکار برای هر یک از موارد شناسایی شده ارائه شوند، آن تأخیر به عنوان تأخیر خارج از قصور پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.

از این رویکرد در صورتی می توان استفاده کرد که مشاور/دستگاه نظارت و یا تیم مدیریت پروژه طرح (محتری طرح، مدیر پروژه و غیره) به دلیل عدم مستندسازی در طول پروژه، قادر به شناسایی تأخیرات خارج از قصور و تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار نمی باشند.

۱-۳-۲-۶- تعیین مدت زمان موثر تأخیرات.

مدت تأخیرات شناسایی شده در مرحله قبل باید با توجه به تاثیر همپوشانی هر یک از تأخیرات در شبکه برنامه زمانبندی مصوب، مورد بررسی و بازنگری قرار داده شود.

تبصره ۷: چنانچه تغییرات شامل اضافه کار / کسر کار در پیمانی ابلاغ شده باشد باید تأثیرات تغییرات در برنامه زمانبندی مصوب اعمال شود و نتیجه کار به عنوان برنامه زمانبندی مجدد در نظر گرفته شود.

در خصوص نحوه مدل سازی تأخیرات، موارد زیر می باشد مدت تأخیرات شوند:

- در صورتیکه تأخیر، مرتبط با کار اضافی / کار جدید باشد، مدل سازی مدت تأثیر زمانی کار اضافه شده می باشد از طریق افزودن زمان متناسب با کار اضافی در قالب یک فعالیت جدید در برنامه زمانبندی به روزرسانی شده با تعریف پیش نیازها و پس نیازهای مرتبط انجام شود و نتیجه در فرم درخواست تغییرات اعلام گردد.

تبصره ۸: با ابلاغ دستور تغییر کار و پیش بینی میزان تأثیر آن در برنامه زمانبندی مصوب، امكان ابلاغ تمدید زمانی در طول اجرای پروژه و پیرو آن تهیه و تصویب برنامه زمانبندی مجدد وجود دارد.

مدل سازی تأخیرات می باشد به صورت یک به یک و به ترتیب وقوع زمانی در برنامه زمانبندی مصوب انجام و گزارش گردد.

تبصره ۹: با توجه به اینکه مالکیت شناوری به صورت پیش فرض در پیمان متعلق به پروژه در نظر گرفته شده است، مدت زمان موثر تأخیر معادل میزان تأثیر هر تأخیر بر تاریخ پیمان پروژه می باشد و در صورتی که در پیمان مالکیت شناوری با کارفرما در نظر گرفته شود می باشد دلایل و مدت تأخیرات برای همه فعالیت ها در نظر گرفته شود.

پس از مدل سازی تأخیرات در برنامه زمانبندی مصوب باید نتیجه بدست آمده در ستون مدت زمان موثر تأخیر در فرم نمودار همپوشانی تاخیرات FO2230 فرم همپوشانی تاخیرات و با توجه به تأثیر آن ها بر شناوری کل پروژه وارد شوند.

تجدید مناخصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۷۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قراردادها

دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها	شمرک توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
کد مدرک WI2229 .. شماره ویرایش	سطح محترمانگی: عادی

پس از وارد کردن نتایج مدل سازی در فرم همپوشانی تأخیرات باید جمع تأخیرات خارج از قصور با در نظر گرفتن همپوشانی ها و جمع تأخیرات ناشی از قصور با در نظر گرفتن همپوشانی ها محاسبه شوند.

تأخیرات همزمان

در صورتیکه تاخیر ناشی از قصور پیمانکار با تاخیر خارج از قصور پیمانکار همپوشانی داشته باشد، تأثیر میزان همپوشانی دو تاخیر، تابع آن است که کدام یک زودتر شروع شده باشند به عبارت دیگر:

- چنانچه تاخیر ناشی از قصور پیمانکار زودتر از تاخیر خارج از قصور پیمانکار شروع شده باشد، میزان همپوشانی دو تاخیر، ناشی از قصور در نظر گرفته می شود.

- چنانچه تاخیر خارج از قصور پیمانکار زودتر یا همزمان با تاخیر ناشی از قصور پیمانکار شروع شده باشد، میزان همپوشانی دو تاخیر، خارج از قصور در نظر گرفته می شود.

۶-۲-۳-۲-۳-۱- تمدید مدت پیمان

در صورتیکه در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تطویل مدت پیمان به تأخیرات پیمانکار رسیدگی شود، به میزان جمع تأخیرات خارج از قصور با در نظر گرفتن همپوشانی ها تمدید مدت پیمان انجام می شود.

تبصره ۱۰: در پیمان هایی که تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیرات کارفرما در انجام تعهدات مالی خود (پرداخت صورت وضعیت ها، پیش پرداخت ها و غیره) پیش بینی شده باشد، تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیرات مالی مطابق با شرایط ذکر شده در قرارداد رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۱۱: در هر مقطعی که تمدید مدت پیمان انجام می شود، دلایل رسیدگی به تأخیرات، قطعی در نظر گرفته می شوند و در تمدیدهای بعدی دلایل جدیدی مربوط به دوره زمانی رسیدگی شده قبلی پذیرفته نمی شود.

۶-۲-۳-۲-۳-۱- تطویل مدت پیمان

در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تطویل مدت پیمان یا هر زمان دیگر، با تایید کارفرما ضروری است تطویل مدت پیمان صورت پذیرد. برای این منظور برنامه ریزی مجدد انجام شده و اختلاف تاریخ پایان به دست آمده با آخرين تاریخ مصوب پایان پیمان به عنوان مدت تطویل پیمان در نظر گرفته می شود.

تبصره ۱۲: در پایان هر تطویل مدت پیمان، محاسبه تمدید مدت پیمان مطابق رویه تشرییح شده مجدد تکرار می شود.

۳-۲-۳-۶- تأخیرات مجاز و غیر مجاز

رسیدگی نهایی به تأخیرات پس از تکمیل تعهدات موضوع قرارداد که از مقایسه میزان کل تاخیر حادث شده با تأخیرات خارج از قصور پیمانکار با در نظر گرفتن همپوشانی ها به شرح ذیل صورت می گیرد.

- ۱- در صورتیکه مدت زمان تأخیرات خارج از قصور به دست آمده بیشتر از میزان کل تاخیر حادث شده باشند، تأخیرات پیمان مجاز در نظر گرفته می شود.

- ۲- در صورتیکه مدت زمان تأخیرات خارج از قصور به دست آمده کمتر از میزان کل تاخیر حادث شده باشد، تأخیرات موثر خارج از قصور معادل میزان تاخیر مجاز در نظر گرفته شده و مابه التفاوت آن با میزان کل تاخیر حادث شده معادل تاخیر غیرمجاز در نظر گرفته می شود.

تبصره ۱۳: در صورتیکه پیمان پیش از پایان مدت اولیه، خاتمه یا فسخ شده باشد، تحلیل تأخیرات موضوعیت داشته و باید مطابق این دستورالعمل به تأخیرات پیمانکار رسیدگی شود. در این حالت نحوه محاسبه میزان کل تأخیرات حادث شده به این صورت است که ابتدا بر اساس اطلاعات واقعی بروژه شامل تاریخ شروع و پایان واقعی فعالیت ها، درصد پیشرفت واقعی فعالیت ها، زمانبندی مجدد صورت گرفته و اختلاف بین تاریخ پایان بدست آمده از زمانبندی مجدد و تاریخ پایان مدت اولیه به عنوان میزان کل تاخیر حادث شده در نظر گرفته می شود.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۹۵ از ۱۷۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۱۱

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قراردادها

کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
WI2229	سطح محترمانگی: عادی	.. شماره ویرایش

تبصره ۱۴: پس از تهیه صورت جلسه کمیته و کارگروه رسیدگی به تأخیرات مراتب جهت تایید و اخذ مجوزات به کمیسیون معاملات ارسال می گردد.

۶-۴- بررسی قابلیت جبران مالی تأخیرات خارج از قصور در صورتیکه تاخیر خارج از قصور پیمانکار همزمان با تاخیر ناشی از قصور پیمانکار شروع شده باشد یا به عبارت دیگر تأخیرات همپوشان هم‌زمان اتفاق افتاده باشد، آن تاخیر به صورت تاخیر خارج از قصور غیرقابل جبران در نظر گرفته می شود و در این صورت:

- الف- پیمانکار مشمول خسارت تاخیر غیرمجاز نمی شود.
- ب- تعديل پیمانکار مطابق با روش تعديل برای انجام کارهای انجام شده در مدت های تمدید شده پیمان محاسبه می شود.
- ج- در مورد سایر هزینه های وابسته به مدت پیمان مطابق رویه های مندرج در هر قرارداد عمل خواهد شد.

۶-۵- روش شماره گذاری صورتجلیسات

۶-۵-۱- شماره گذاری صورتجلیسات تأخیرات میان مدت

در بررسی تأخیرات میان مدت پیمان ترکیبی از شماره قرارداد، نوبت بررسی و حرف DEL به عنوان شماره صورتجلیسه رسیدگی به تأخیرات ملاک عمل قرار می گیرد، به عنوان مثال DEL-MOM-03-1497-02 به این معنی است که دو میان بررسی تأخیرات میان مدت قرارداد 03-1497 انجام شده است.

تبصره ۱۵: در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، سوال و ابهام در رابطه با هر بخش از این دستورالعمل، مسئول تفسیر موضوع و حل اختلاف، رئیس کمیته می باشد.

۷- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای کار توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند به عهده رئیس کمیته می باشد.

۸- مستندات مربوطه

آینین نامه معاملات

۹- پیوست ها

فرم شناسنامه تأخیرات با کد FO2221

فرم کنترل کفایت مدارک پیمان ها با کد FO2222

فرم صورتجلیسه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2226

فرم نمودار همپوشانی تأخیرات با کد FO2230

فرم تاریخچه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2231

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۷۵ از ۱۷۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵-ق

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قراردادها

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

معنون:
نام بروزه

Contractor logo



کنترل کفایت مدارک پیمانها

Consultant logo

توضیحات	وضعیت	جزئیات	موضوع	شماره پیوست
		عوامل عمده تاخیر و دلایل آن.	۱.۱	
		سهم هر یک از عوامل در تاخیر به تفصیل.	۱.۲	
		سهم تاخیر هر یک از طرفین پیمان	۱.۳	
		فرم نمودار همپوشانی تأخیرات (فرم FO2230-00)	۱.۴	
		مستدات مرتبط با شرح کار پیمان شامل: موافقنامه پیمان <input checked="" type="checkbox"/> ، مشخصات شرح کار <input type="checkbox"/> ، احجام عملیات اجرایی <input type="checkbox"/> ، حجم عملیات ساخت <input type="checkbox"/> و خرید کالا <input type="checkbox"/> . برنامه زمانبندی های زمانبندی مصوب پیمان شامل: برنامه زمانبندی تفصیلی اولیه و برنامه زمانبندی هر یک از تمدیدها (مرتبه اول <input type="checkbox"/> ، مرتبه دوم <input type="checkbox"/> و مرتبه سوم <input type="checkbox"/>)	۲.۱	
		اطلاعات مالی پیمان شامل: مبلغ اولیه ، تحوه پرداخت و مستدات پرداخت های الجام شده	۲.۲	
		نمودار وضعیت پیشرفت موزی (Banana Curve) برنامه های مصوب	۲.۳	
		فرم شناسنامه تأخیرات	۲.۴	
		مستدات مرتبط با علل تأخیرات	۲.۵	
		رائه گزارش عملکرد پیمانکار در مقاطع زمئی (شامل برنامه زمانبندی بروزرسانی شده و گزارش های ماهنه مصوب و دلیل تاخیر از برنامه)	۲.۶	
		گواهی تحويل موقع پروژه / اتمام عملیات موضوع پیمان (گواهی پایان کار)	۲.۷	
		مصطفویات مربوط به / تغییر کار (کسر کار / اضاله کار) به همراه مستدات	۲.۸	
		برنامه زمانبندی تفصیلی به روز شده پیمان با لحاظ کردن ادغام	۳.۱	
		کلیه مستدات مربوط به هر یک از ادعاهای طرف پیمان درخصوص تأخیرات از جمله	۳.۲	
		مستدات تأخیرات در فاز های مهندسی، تامین و اجرا	۳.۳	
		مستدات مربوط به وقوع حوادث قهقری	۳.۳.۱	
		عدم تحویل قسمتی از پروژه یا عدم گشایش جیهه های کلی	۳.۳.۲	
		مسائل و مشکلات تحصیل اراضی	۳.۳.۳	
		مستدات مرتبط با گمرکات و مبادی ورودی کالاهای ساخته شده یا مواد اولیه خام بد کش	۳.۳.۴	
		مستدات دیگر مرتبط با تأخیرات و ادعاهای طرف پیمان	۳.۳.۵	
		مستدات مربوط به تعلیق و توقفات پیمان	۳.۴	
		نمودار و جدول جزیئی پیمان (برنامه ای و واقعی)	۴.۱	
		صورتحساب و مستدات پرداخت	۴.۲	

دبیر کمیته رسیدگی

نایابنده دستگاه نظارت کارفرما

مسئول نکمل فرم:

نایابنده مساعر

وضعیت: دارد، ندارد و موضوعیت ندارد

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۹۵ از ۱۷۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵ ق



۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه
بررسی تأخیرات قرارداد ها

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تعاونی:
نام پرورزه

Consultant logo

Contractor logo



صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات

شماره صورتجلسه:

تاریخ جلسه:

نهایی میان مدت

نوع جلسه:

موضوع جلسه:

صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات:

اعضاء حاضر در جلسه:

ارائه دلایل وقوع تأخیرات (مبتنی بر مستندات تایید شده و مطرح شده در جلسه/جلسات کارگروه تأخیرات هر یک از عوامل تأخیرات به تفصیل بررسی و سهم هر یک از کارفرما و طرف بیمان در آن مشخص گردد):

مدارک و مستندات و گزارشات توجیهی:

نظرات و تصمیمات کمیته:

نام و اسامی اعضاء حاضر در کمیته

مسئول تکمیل فرم: دبیر کمیته

کد مدرک: FO2226-00

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (نکرار مرتبه اول)



گهر فولاد آهن توسعه شرکت

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۷۷ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۴/۱۱۵۵-ق	۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها
-----------------	--------------	-------------------------	---

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



گل‌گهر توسعه آهن و فولاد

صفحه ۱۷۸ از ۱۹۵

۱۴۰۴ تاسیستان

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر


شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها

صفحه ۱۷۹ از ۱۹۵

۱۴۰۴ تاسیتا

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۴

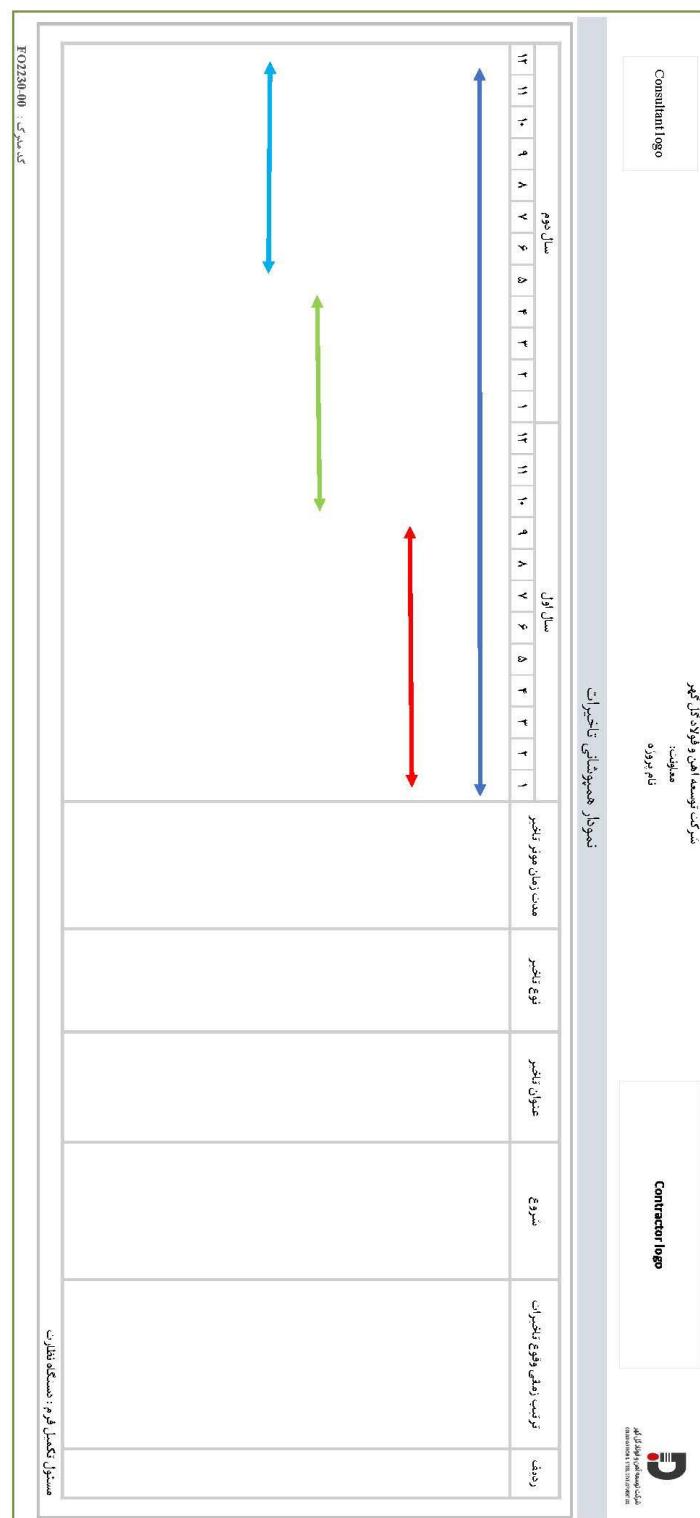

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۰ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/ق



۱۱- پیوست شش، FINAL BOOK

پیوست شش، FINAL BOOK

پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهیه مدارک نهایی منظم به استناد مناقصه به طور کامل انجام شده و مطابق با دستورالعمل تحويل گردد.

پرینت، مهر و امضای استناد موجود در فایل مذکور الزامی است،

مهر و امضای این صفحه به معنی تایید تمامی مدارک پیوست استناد مناقصه می باشد.

تجدد مناقصه تامين، نصب و اجرای تجهيزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۱۸۱ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۱۲- پیوست هفت، چک لیست
صورت وضعیت قطعی

پیوست هفت، چک لیست صورت وضعیت قطعی

شماره صفحه ۱ از ۲ پیوست: برگ	چک لیست مدارک لازم برای صورت وضعیت قطعی	شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co.
محری پروژه:	دستگاه نظارت:	نام پیمانکار:
	موضوع قرارداد:	شماره قرارداد:
تاریخ اتمام کار بر اساس آخرین تمدید:	تاریخ اتمام اولیه:	تاریخ ابلاغ:

ردیف	شرح	وضعیت		توضیحات
		انجام شده است	انجام نشده است	
۱	کلیه استناد و مدارک پروژه از قبیل نقشه های چون ساخت، کاتالوگها، مدارک بازرگانی و آزمایش تجهیزات، دستورالعملهای راه اندازی و بهره برداری و کلیه مدارک موضوع پیمان بصورت فیزیکی و الکترونیکی مطابق دستورالعمل تهیه فاینانس بوک ها تحويل واحد PMO شده است.			
۲	اصل کلیه بیمه نامه های لازم برای مصنوع نگهداشتن کارفرما از ادعاهای اشخاص ثالث و ... مطابق قرارداد تهیه و تحويل کارفرما شده است.			
۳	مدارک لازم دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان تحويل کارفرما شده است.			
۴	اصل اقرارنامه از طرف پیمانکار که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدھی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، خرید دانش فنی، مصالح، تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاهای و پرداخت بدھیهای خود، مهندسان طراح، پیمانکاران دسته دوم و فروشنده‌گان، توافق های لازم را با طرفهای ذیفعه به عمل آورده است، امضاء و تحويل کارفرما شده است.			
۵	با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان صرف نظر می کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت وضعیت			

مهر و امضاء کارفرما	مهر و امضاء مشاور	مهر و امضاء پیمانکار

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۹۵ از ۱۱۸۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴



۱۲- پیوست هفت ، چک لیست
صورت وضعیت قطعی

شماره صفحه ۲ از ۲ پیوست: برگ	چک لیست مدارک لازم برای صورت وضعیت قطعی	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
مجوی پروژه:	دستگاه نظارت:	نام پیمانکار:
	موضوع قرارداد:	شماره قرارداد:
	تاریخ انعام کار بر اساس آخرین تمدید:	تاریخ ابلاغ:

ردیف	شرح	وضعیت		توضیحات
		انجام شده است	انجام نشده است	
۶	قطعی مطرح شده است، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمانهای بعد مؤکول شده باشد.			
۷	پیمانکار تمام تعهدات قرارداد خود را مطابق با استناد پیمان انجام داده است.			
۸	ارائه گواهی رفع نقص کلیه فعالیت‌ها، تجهیزات و ...			
۹	تعیین تکلیف بر جیدن کارگاه و خارج نمودن ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به پیمانکار			
۱۰	لوازم بدکی و مواد مصرفی تعهد شده در قرارداد به کارفرما تحویل شده است.			
۱۱	لایحه تاخیرات و جرائم پیمانکار تعیین تکلیف شده است.			
۱۲	اصل گارانتی تجهیزات خریداری شده از فروشندهان / ساخته شده توسط سازندگان دست دوم، به کارفرما تحویل شده است.			
	رعایت تمامی الزامات مطروحة در مفاد صورت وضعیت قطعی مناسب با نوع قرارداد که شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور پیروی می کند.			

مهر و امضاء کارفرما	مهر و امضاء مشاور	مهر و امضاء پیمانکار
---------------------	-------------------	----------------------

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۳ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶

۱۳- پیوست هشت، فرم ضمانت نامه

پیوست هشت، فرم ضمانت نامه

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)

بسمه تعالی

ضمانتنامه شرکت در مناقصه

نظر به این که * به نشانی: مایل است در مناقصه *** شرکت نماید، این*** از * در مقابل *** برای مبلغ ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه*** به این *** اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان ریال هر مبلغی را که *** مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی *** بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجازی قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد *** بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز..... معتبر می باشد این مدت بنابه درخواست کتبی *** برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه *** نتواند یا نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و *** را موافق با تمدید ننماید *** متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا به حواله کرد *** پرداخت کند .

* عنوان فروشنده (شناسه ملی (حقوقی))

** عنوان بانک یا شرکت بیمه

*** عنوان دستگاه اجرایی یا خریدار (شناسه ملی (حقوقی))

**** عنوان مناقصه به همراه شماره مناقصه

- ✓ لازم بذکر است، ضمانتنامه های صندوق های قرض الحسن مورد تایید شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر نمی باشد.
- ✓ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شرکتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنامه در قالب شرکتهای دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناقصه می باشد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸۴ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار
مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

شماره مناقصه : ۱۱۵۵/۰۴

تابستان ۱۴۰۴



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵۰۴

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

امضاء‌کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت‌نامه شرکت در مناقصه شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی، نقشه‌های کلی فهرست مقادیر و قیمت‌های برآورده کار تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شرح درج شده در موافقنامه و پیوست یک منضم به پیمان پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می‌نمایم که

۱- عملیات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ:

.....(به عدد)

.....(به حروف)(به حروف) ریال انجام دهم.

مهم: پیمانکار بایستی هزینه حمل، نصب و تست و راه اندازی و تمامی هزینه‌های مرتبط با موضوع مناقصه را در نظر گرفته و تحويل به تأیید کارفرما برسرد لذا هیچ گونه اضافه پرداختی بابت خدمات ادعایی بعدی از سوی پیمانکار مورد قبول نمی‌باشد.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که:

الف- اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداقل ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب- ظرف مدت مقرر در پیمان، تجهیزات لازم را تامین و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳- تأیید می‌نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شود.

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه‌گذار الزامی برای واگذاری کار به هیچ یک از پیشنهاد دهنده‌گان را ندارد.

یادآوری: "مالیات ارزش افزوده" با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده کارفرما خواهد بود.

تاریخ: / /

نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

امضاء کارفرما (در پیمان):

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸۶ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵۰۴

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

جدول پیشنهاد قیمت تامین و اجرا

ردیف	تجهیز	شماره آیتم متناظر در شرح خدمات و توضیحات مربوطه و جدول مربوطه در آیتم ذکر شده	قیمت برآورده (ریال)
۱	تامین و اجرای قسمت پایانی فونداسیون	آیتم شماره ۳	
۲	تامین و نصب یونیت های روغن بلور و گیربکس	آیتم شماره ۴	
۳	تامین و اجرا باقیمانده لاین کشی خطوط پروسس	آیتم شماره ۵	
۴	تامین و نصب سایلنسر	آیتم شماره ۶	
۵	تامین و نصب رک ابزار دقیق به همراه سنسورها و کانکشن آنها به خطوط	آیتم شماره ۸	
۶	تامین کابل و کابل کشی ابزار دقیق و JB های مربوطه	آیتم شماره ۹ ، ۱۰ و ردیف های شماره ۱۷، ۱۸، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ (۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲) در جدول کابلهای ذیل آیتم ۲۶	
۷	تامین کلبل و کلبل کشی پاور موتورها به همراه RTD سیم پیچ و بیرینگ، هیتر و CT ها	آیتم ۱۲ و ردیفهای شماره (۱، ۴، ۷، ۱۹، ۲۱) در جدول کابلهای ذیل آیتم ۲۶	
۸	تامین و اجرای پوش باتن امر جنسی تریپ موتور و کابل کشی آن	آیتم ۱۱ و ردیفهای شماره (۸ و ۲۰) در جدول کابلهای ذیل آیتم ۲۶	
۹	تامین کلبل و کلبل کشی پاور موتورهای یونیت روغن و هیتر آنها	آیتم ۹ (بخش مربوط به پاور و هیتر)، آیتم ۱۳ و ردیفهای شماره (۲۰، ۲۲، ۲۳) در جدول کابلهای ذیل آیتم ۲۶	
۱۰	تامین و نصب تجهیزات آب اینجکشن و فلاشینگ کمپرسور	آیتم ۱۵	

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

صفحه ۱۸۷ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵۰۴/ق

		آیتم ۱۶ و ۱۷	تامین و اجرای پایپیگ و تجهیزات وروودی و خروجی کمپرسور و گیربکس	۱۱
		آیتم ۱۸ و ۲۳	تامین و اجرای پایپینگ غیر پروسسی	۱۲
		آیتم ۱۹	تامین و اجرای تجهیزات و کارتها سیستم کنترل	۱۳
		آیتم ۲۰	تامین و نصب فیدر ۱۱ کیلوولت موتور	۱۴
		آیتم ۲۱	تامین و نصب فیدرهای مربوط به موتور پمپهای یونیت های روغن	۱۵
		آیتم ۲۲	تامین و نصب کوپلینگهای اتصال گیربکس به موتور و کمپرسور و حفاظ کوپلینگ ها	۱۶
		آیتم ۲۷	تامین و نصب راه دسترسی (استراکچر) ولو بای پس	۱۷
	آیتم ۴۲ و جداول ذیل این آیتم	جهت نحوه کانکشن	کانکشن کابل به سیستم کنترل و دیوایس ها و لاجیک نویسی و سیگنال چک و لوپ چک	۱۸
		-	تست و راه اندازی تهیه ازبیلت و سایر مواردی که در شرح خدمات توضیح داده شده است و در بازدید سایت توسط پیمانکار دید شده ولی در شرح خدمات نیامده است.	۱۹
		جمع کل (ریال)		



تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

صفحه ۱۸۸ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵۰۴

درخصوص ارائه قیمت توسط مناقصه گران مفاد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت و کلیه مناقصه گران در ارائه پیشنهاد قیمت ملزم به رعایت آنها خواهند بود:

الف_ اطلاعات کامل و کافی در مورد شرایط و روش‌های دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش‌بینی عملیاتی مورد نظر کارفرما، تسهیلات و تمام موضوعاتی که به نحوی بر انجام موضوع این مناقصه تأثیرگذار است، از جمله شرایط نوسانات ارزی و مدت زمان تحويل تجهیزات را حاصل نموده ایم.

ب_ به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاری که باید طبق قرارداد برای انجام این پروژه مدنظر گیرد آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و لازم در این خصوص داریم.

ج_ آگاهی کامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای موضوع این مناقصه و کارهای مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد می‌دانیم و امکان هر نوع ادعای احتمالی نسبت به موارد ذیل را از خود سلب می‌نماییم:

■ اقامه هر نوع دعوى علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد

■ هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای کار موضوع این مناقصه که ناشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهای مربوطه بری و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی برای درخواست اضافه پرداخت نخواهیم داشت.
تایید می‌کنیم که کارفرما مقید به پذیرش پایین ترین قیمت نمی‌باشد و موظف به اعلام علت رد هر یک از پیشنهادات نیست.

■ در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه‌های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و تایید می‌کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً استناد به نآگاهی نماییم.

■ در صورتی که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعلام گردد، متعهدیم در تاریخ اعلام شده کارفرما اقدام به امضای قرارداد کنیم و ضمانت‌نامه بانکی مورد تأیید کارفرما جهت انجام تعهدات، معادل ۵٪ (پنج درصد) کل مبلغ قرارداد را ارائه نماییم.

■ ما نمایندگان تمام اختیار و مجاز شرکت هستیم و دارای حق امضا از طرف و برای شرکت می‌باشیم و به ما اختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیم.

نکته: تمام هزینه‌های موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می‌باشد و بایستی در پیشنهاد مالی در نظر گرفته شود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه هزینه ادعایی نخواهد داشت.

۵- کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت می‌گردد. مبلغ پیشنهادی مناقصه گر می‌بایست به صورت ریالی اعلام گردد. مبلغ قرارداد ثابت و تعدیل ناپذیر بوده و مناقصه گر کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های خرید اقلام خارجی (با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه‌های انتقال و ...) و سایر هزینه‌ها را در آن منظور نموده و هیچ نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایی صورت گیرد.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۱۸۹ از ۱۸۹	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/ق	۱۵- پیوست د، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

پیوست ۵، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

این پیمان با عنایت به مفاد بند (۴) قانون مجازات افسای اسناد محترمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک (بخشنامه شماره ۱۳۸۷/۲۵/۷/۸۷/خ به تاریخ ۱۱۰/۴/۲۷) و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۷؛ بین شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به نشانی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل گهر و با نمایندگی آقایان حجت نجمی نیا به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و محمدحسین بنی اسد زاده بافتی عضو هیئت مدیره، به عنوان طرف اول (خریدار) که در این پیمان «صاحب اطلاعات» نامیده می شود و آقای فرزند با شماره ملی به نشانی: ، به عنوان طرف دوم، که در این پیمان «گیرنده اطلاعات» نامیده و با توجه به:

- اینکه صاحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد که محترمانه و مختص به این شرکت است و منبعد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می شود.
- اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان، اطلاعات طبقه بندی شده ای را به منظور انجام تعهدات خود در قبال شرکت دریافت می نماید، با توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می گردد.

ماده (۱): موضوع پیمان:

عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه، که از جانب صاحب اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود.

* تبصره: کلیه اطلاعات و موضوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می باشد محترمانه محسوب می گردد.

ماده (۲): تعاریف:

محترمانگی: منظور از اطلاعات محترمانه در این سند، اطلاعاتی است که افشای آنها امنیت و اعتبار خریدار را از لحاظ داخلی و بیرون از شرکت به خطرو می اندازد و یا ممکن است ضرر مالی وارد سازد. این اطلاعات بدون مجوز نمی توانند در دسترس افراد غیرمجاز قرار گیرند. اطلاعات محترمانه می تواند شامل اطلاعات داخلی شرکت، اطلاعات مشتریان و نوع پژوهه ها، برنامه ها و طرح های فنی، دانش فنی و بومی شرکت در انجام پژوهه ها، حق امتیاز یا لاینس نرم افزارهای اصلی Crackly در اختیار شرکت، فرآیند انجام کارها، اهداف و سیاست های شرکت و یا اطلاعات در مورد نقاط ضعف آن، سرمایه گذاری ها و پیش بینی های تجاری، اطلاعات بازاریابی و فروش، اطلاعات استعلامات و مناقصات باشد.

* تبصره: اطلاعات محترمانه یا به صورت نوشتاری (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) و یا به صورت لفظی اعلام می شوند.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۱۹۰ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۶	۱۵- پیوست د، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

عدم افشای اطلاعات: افشای اطلاعات در این سند به معنای استفاده غیرمجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیرمجاز است. همچنین بایستی محافظت لازم در قبال جلوگیری از عدم افشای اطلاعات صورت گیرد تا از دستری افراد غیرمجاز محفوظ باشد. استفاده غیرمجاز به معنای استفاده در اموری غیر از اهداف شرکت و بدون اطلاع ایشان می‌باشد. هر فردی که این سند را امضاء نکرده است و یا نماینده تام-اختیار امضاء کنندگان نیست به عنوان فرد غیرمجاز شناخته می‌شود.

ماده (۳): زمان شروع و خاتمه:

این پیمان از تاریخ تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می‌باشد نافذ و موثر می‌باشد. این تعهدات تا مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می‌باشد معتبر می‌باشد. زوال وصف اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی اسناد و اطلاعات و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می‌گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعلام و پاسخ صریح صاحب حساب دائر بر زوال وصف مذبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان می‌باشد.

* تبصره: در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می‌باشند، به شرکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر می‌باشد.

ماده (۴): شرایط و تعهدات طرفین:

۱-۴- صاحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند.

۲-۴- صاحب اطلاعات (نگهدارنده اطلاعات) می‌تولند اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را تنها جهت استفاده‌به منظور انجام امور بژوهشی، فنی و اداری شرکت توسعه با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواست کننده (گیرنده اطلاعات) قرار دهد.

۳-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نمودتا این اطلاعات دارای طبقه بندی را تنها در موارد ذکر شده در این ماده و یا سایر مواردی که براساس مفاد این پیمان مجاز می‌باشد ، مطالعه ، آزمایش و بررسی نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد.

۴-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صاحب اطلاعات در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد.

۵-۴- اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی نباید در مسیری غیر از اهداف این پیمان بازسازی یا تغییر شکل داده شود. بلاfacسله پس از درخواست صاحب اطلاعات، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً (اصل) نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۱۹۱ از ۱۹۵	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴	۱۵- پیوست د، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

حافظتی دریافتی اعم از نوشترار یا هر نوع رسانه دیگر، به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را مدت ۱۰ روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.

۴-۶- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده ۳) با هیچ یک از شرکتهای رقیب تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. درصورت احراز تخلف از جانب گیرنده اطلاعات، مفاد ماده ۱۰ پیمان حاکم خواهد بود.

۴-۷- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطلاعات محرومانه در اختیار به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.

۴-۸- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که از اطلاعات محرومله و مستندات فنی و غیر فنی که از صاحب اطلاعات دریافت نموده است در برابر تهدیدات احتمالی زیر حفظ و حراست گردد:

- عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات موضوع ماده ۵ این تعهدنامه.
- عدم آسیب رساندن به صحت اطلاعات دریافت شده.
- محافظت از صحت، محترمانگی و در دسترسی بودن اطلاعات.

۴-۹- حفظ کلیه حقوق معنوی صاحب اطلاعات در خصوص اطلاعات و اسناد کسب شده مربوط به نرم افزارها، طرحها، سخت افزارها و شبکه ها.

* تبصره ۱: درصورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلًا تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتبع باقی خواهد ماند.

* تبصره ۲: گیرنده اطلاعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد.

* تبصره ۳: در صورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتبع باقی خواهد ماند.

* تبصره ۴: در صورتی که گیرنده اطلاعات به هر نحوی اطلاعات صاحب اطلاعات را افشاء نماید و به تعهدات خود در این تعهدنامه عمل ننماید، صاحب اطلاعات حق برخورد قانونی را برای خود مجاز می شمارد.

ماده (۵): جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:

۱-۵- کلیه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و اسناد مربوط به صاحب اطلاعات که جهت قرارداد مذکور بین طرفین مبادله می شود، محرومانه تلقی می شوند. همچنین دسترسی به این اطلاعات تحت هر یک از شرایط زیر ممکن است صورت پذیرد:

- دسترسی مستقیم یا با واسطه
- ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیررسمی

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۱۹۵ از ۱۹۲	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴	۱۵- پیوست ده، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

- استفاده از ارتباطات راه دور و نزدیک که توسط صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و یا اینکه گیرنده اطلاعات با توجه به شناختی که از سیستم کارفرما دارد امکان ایجاد این ارتباط را پیدا می کند.
 - به صورت اتفاقی یا عمدى
- ۲-۵- اسناد و مدارک فوق می توانند شامل یکی از انواع زیر باشند:
- هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، سخت افزار و یا نرم افزار، اسناد فرمت شده و / یا فرمت نشده بطور كامل یا جزئی.
 - استناد SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFP، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فنی تجهیزات.
 - مشخصات اطلاعاتی پرسنل، Marketing Business Plan ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از (موجود در) هر نوع رسانه.
 - اسناد مكتوب به صورت فرم، دستنویس، چاپ شده ویاالكترونيکی (شامل محتوای پست الکترونيک، فایل، و سایر موارد الکترونيکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه های ذخیره سازی مانند دیسکت، DVD، CD، حافظه های Flash).
 - اطلاعات شفاهی که در جلسات حضوری داخلی سازمان صاحب اطلاعات و یا با مشتریان بیرونی رد و بدل گردیده است.
 - اطلاعات محترمانه ای که به صورت غیر رسمی از راه مشاهده مکان ها و تجهیزات بدست آمده است.
 - اطلاعات محترمانه ای که در حین اجرای فرآيندهای کاری در حوزه های مختلف سازمان صاحب اطلاعات اعم از مالی، اداری، بازرگانی، امور مشتریان، آموزش و ... به دست می آید.
 - اطلاعاتی که در حین اجرای فرآيندهای مربوط به پروژه و یا به صورت تصادفی در حوزه های زیر بدست می آید:
 - آدرس و اطلاعات مربوط به سیستم ها.
 - آدرس و اطلاعات مربوط به مکانها.
 - اطلاعات مرتبط با پرسنل و اشخاص.
 - معماری زیرساختار.
 - وضعیت سیستم های عامل.
 - وضعیت مراکز داده سازمان.
 - اطلاعات مربوط به ساختارهای امنیتی و حراستی سازمان.
 - اطلاعات مرتبط با سیاستهای عبور و راههای دسترسی به اطلاعات.
 - وضعیت سرویس های عملیاتی و حساس.
 - اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده.
 - اطلاعات نشان دهنده ضعف های امنیتی و راههای نفوذ.
 - و سایر اطلاعاتی از هر نوع که افشای آن به هر گونه در روند عملیاتی سازمان کارفرما اخلال ایجاد نماید.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.		
صفحه ۱۹۵ از ۱۹۳	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴	۱۵- پیوست د، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

ماده (۶): دارای طبقه بندی حفاظتی بودن (محرمانه، خیالی محرمانه، سری، بکلی سری):

۱- عدم استفاده از : گیرنده اطلاعات تعهد نمود، به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است.

۲- عدم افشای : گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی تلاش خود را جهت منع افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و یا هر بخشی از آن به اشخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راستای استفاده های مجاز (براساس این پیمان) نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.

۳- اصل رازداری: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی لقدمات لازم جهت حفاظت از اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را به عمل آورده و از افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.

ماده (۷): حدود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:

در موارد زیر اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی، اختصاصی تلقی نشده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود:

۱- اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.

۲- نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.

* تبصره: کلیه اطلاعات موضوع ماده ۵ که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توسط گیرنده اطلاعات حاصل و کسب می گردد، متعلق و مختص به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود.

ماده (۸): حدود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاحب اطلاعات باقی مانده، و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید. از بندهای این پیمان نبایستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت های معنوی درخصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود.

ماده (۹): اعتبار حقوق و محدودیت ها:

حقوق و تعهدات این قرارداد درخصوص الف) صاحب اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او و ب) گیرنده اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد.

ماده (۱۰): جبران خسارت:



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۹۵ از ۱۹۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۵۵/۰۴/۰۴

۱۵- پیوست د، پیمان منع افشای
اطلاعات (NDA)

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقسیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان متوجه صاحب اطلاعات می‌گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآورده صاحب اطلاعات گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود. همچنین تعهد گیرنده در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشنامه‌های صدرالذکر قابل تعقیب کیفری (علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود. لازم به ذکر است در صورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مذبور با گیرنده اطلاعات رفتار می‌نماید.

بدیهی است این قرارداد از حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و چنانچه بین طرفین اختلافی پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود موضوع اختلاف در مراجع قضائی کشور مطرح و رأی مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

ملاحظات:

این پیمان در ۱۰ ماده و ۷ تبصره و ۱۶ بند در تاریخ تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر پیمان قید شده است، لازم الاجرا می‌باشد.

نماینده صاحب اطلاعات:

امضاء و تاریخ:

گیرنده اطلاعات:

امضاء، تاریخ و اثر انگشت:

تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی
(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۹۵ از ۱۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۵۵

۱۶- فرم بازدید از سایت

صورت جلسه بازدید از سایت

با توجه به الزام بازدید از سایت محل پروژه، لازم است بازدید از سایت توسط نماینده دارای معرفی نامه از سمت مناقصه گر انجام پذیرفته و فرم زیر توسط ایشان تکمیل به و به مناقصه تحويل گردد. عدم بازدید از سایت و متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند مناقصه خواهد شد.

اینجانب به شماره ملی به نمایندگی از شرکت در تاریخ در محل سایت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر برای بازدید از شرایط اجرایی "تجدید مناقصه تامین، نصب و اجرای تجهیزات جانبی کمپرسور هفتم طوبی (تکرار مرتبه اول)" حاضر بوده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی اجرای پروژه مذکور را از نزدیک مشاهده نمودم.
لذا مناقصه گر اعلام می نماید که در چارچوب قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه و در حدود خدمات و الزامات تعریف شده آن از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی نظیر الزامت ایمنی، انتظارات امنیتی و غیره را در اخذ تصمیم شرکت در مناقصه لحاظ نموده است و حق اقامه هر گونه ادعا و دعوى را در خصوص این موضوع را از خود سلب و ساقط می نماید.

دستگاه نظارت	ایمنی	حراست	مناقصه گر	مناقصه گذار	نام و نام خانوادگی
					امضا
